



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

- CENTRO

CNPJ: 18.137.597/0001-86 - CEP: - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 187-2024

EMPENHO: 263 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 545 Data do Sub-Empenho: 05/06/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 6507 - ECKO CONSTRUTORA LTDA Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEIREDO, 75 Complemento: SALA 06
Bairro: CENTRO Cidade: Estado:
CNPJ: 19.846.470/0001-07 Insc. Estadual: CPF: RG:
Conta Corrente: 29052-1 Agência: 1047-2 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo PIX: Nº PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2057.4451.1708 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 05/06/2025
Unidade: 905 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Função: 08 - Assistência Social
Sub-Função: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 006 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
Ação: 2.057 - Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Modalidade: Concorrência para obras e serviços de engenharia	Nº Lic.: 002-2024CE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 413-2025	172.000,00	171.573,54	426,46
Patrimônio:				

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 413-2025 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002-2024. OBRA Nº 008/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO 02, PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/05/2025 À 26/05/2025. NFS-e 675.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
171.573,54	171.573,54	0,00

Data do Empenho: 05/06/2025

Data da Liquidação: 05/06/2025

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.070	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1708	9.436,54
2.1.8.8.1.01.04.00.00.072	IRRF - Fonte 1708	2.573,60
2.1.8.8.1.01.08.00.00.071	ISS - Fonte 1708	69,68
## Cento e cinquenta e nove mil e quatrocentos e noventa e três reais e setenta e dois centavos		Valor Retido 12.079,82
##		Valor Líquido 159.493,72

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	03/06/2025	675	U			171.573,54
Quantidade: 1						Total: 171.573,54

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	171.573,54

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 05/06/2025.

MARIANE DE SOUSA BARBOSA
Secretário(a) de Assist. Social
CPF: 880.456.415-68

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 05/06/2025, podendo efetuar o pagamento.

NAIARÁ DA CUNHA CARMO
Contador(a)
Matrícula: 6408

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

- CENTRO

CNPJ: 18.137.597/0001-86 - CEP: . . - - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 187-2024

EMPENHO: 263 / 2025

Nº SUB-EMPENHO: 545

Data do Sub-Empenho: 05/06/2025

TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: **6507 - ECKO CONSTRUTORA LTDA**
Endereço: **RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEIREDO, 75**
Bairro: **CENTRO**
CNPJ: **19.846.470/0001-07** **Insc. Estadual:**
Conta Corrente: **29052-1** **Agência: 1047-2**
Tipo PIX: **Nº PIX:**

Tipo Pessoa: Jurídica
Complemento: SALA 06
Cidade: **Estado:**
CPF: **RG:**
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA -

Reduzido: 2057.4451.1708 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data do Empenho: 05/06/2025

Unidade:	905 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Função:	08 - Assistência Social
Sub-Função:	244 - Assistência Comunitária
Programa:	006 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
Ação:	2.057 - Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte:	1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
Sub-Elemento:	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Modalidade: Concorrência para obras e serviços de engenharia. Nº Lic.: 002-2024/CE
Convênio: Contrato: 413-2025
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
172.000,00	171.573,54	426,46

HISTÓRICO

IMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA
RENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº413-2025
CONCURRENCIA ELETRÔNICA Nº002-2024.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
171.573,54	171.573,54	0,00

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	171.573,54	171.573,54

Cento e setenta e um mil e quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos

171.573.54

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 05/06/2025.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 05/06/2025

MARIANE DE SOUSA BARBOSA
Secretário(a) de Assist. Social
CPF: 880.456.415-68

NAIARA DA CUNHA CARMO
Contador(a)
Matrícula: 6408

368101C



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - ESTADO DA BAHIA**

RUA DR. ALVARO COVA, 217 - CENTRO

CNPJ: 14.043.269/0001-60 | e-mail:tributos@riachaodojacuipe.ba.gov.br TEL:7532641638

Número da nota:

675

Data e hora de Emissão:

03/06/2025 16:52:07

Código de Verificação:

536a4cc04f**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

19846470000107

Inscrição Municipal:

003.121/001-16

Nome/Razão Social:

ECKO CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO 75 SALA 06, - CENTRO - CEP: 44640000 - RIACHAO DO JACUIPE - BA

E-mail:

eckoconstrutora@hotmail.com**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

CPF/CNPJ:

13807870000119

Inscrição Municipal:

00000000000000

Endereço:

PRAÇA CORONEL JOSE LEITÃO 05, - CENTRO - CEP: 48880000 - SANTALUZ - BA

E-mail:

PMS@HOTMAIL.COM

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	
☒	O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
☐	O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
☐	A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
FM 04.06.25	Assinatura

Franklin de J. Sena
Engenheiro
Crea 356.008/945-7

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZ-BA - MEDIÇÃO Nº 01- CONFORME CONTRATO Nº 413/2025 - CONCORRENCIA PÚBLICA Nº

002/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 187/2024 - PERÍODO DA MEDIÇÃO 01/05/2025 A 26/05/2025

SERVIÇO (50%) R\$ = 85.786,77 MATERIAIS (50%) R\$ = 85.786,77

INSS- RETIDO (11%) R\$ = (9.436,54) IR (1,5%) R\$ 2.573,60

AGENCIA 10.47-2 CONTA CORRENTE 29.052-1 BANCO 001- BANCO DO BRASIL

LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**SANTALUZ - BA****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$171.573,54**

CNAE:

4120400 - Construção de edifícios

Item da lista de serviços:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

Valor total das deduções (R\$):

R\$ 786,77

Base de cálculo (R\$):

R\$ 786,77

Alíquota (%):

5,00

Valor do ISS (R\$):

4.289,34

Crédito (R\$):

0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$): 9.436,54	Valor PIS (R\$): 0,00	Valor COFINS (R\$): 0,00	Valor IR (R\$): 2.573,60	Valor CSLL (R\$): 0,00	Outras retenções (R\$): 0,00	Valor líquido (R\$): 155.274,06
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--	---

- O ISS desta Nota será RETIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.

- COMPETÊNCIA: 06/2025 (mês/ano)

- Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse: <https://www.nfservico.com.br/riachadojacuipe>



Santaluz-BA, 04 de junho de 2025

EMPRESA: ECKO CONSTRUTORA LTDA**CNPJ:** 19.846.470/0001-07**ENDEREÇO:** RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEIREDO, RIACHÃO DO JACUÍPE – BA

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO – ECKO CONSTRUTORA LTDA
FONTE DE PAGAMENTO: 1500
UNIDADE: Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
AÇÃO: Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
ELEMENTO DE DESPESA: Obras e Instalações
HISTÓRICO: Contratação de empresa de engenharia para execução de construção de 30 unidades habitacionais para famílias de baixa renda da município de Santaluz-BA
Concorrência Eletrônica: 002/2024
Período de medição: 01/05/2025 a 26/05/2025
Nº da obra: 008/2025
Contrato: 413/2025
Nº da Nota Fiscal: 675
Valor: R\$ 171.573,54
CONTA: 42227-4
Recurso Próprio

Atenciosamente,



Ludmila Santos Oliveira
Assessora de Assuntos Especiais
Portaria Municipal Nº 064/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA
RENDA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA. - 2ª MEDIÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002-2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 187/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO:

01/05/2025 a 26/05/2025

OBJETO:

CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NO MUNICÍPIO DE
SANTALUZ/BAHIA.

EMPRESA:

ECKO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ:

19.846.470/0001-07

MEDIÇÃO 02:

R\$ 171.573,54

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	MEDIÇÃO 01		MEDIÇÃO 02		ACUMULADO		SALDO R\$	%
			SERVIÇOS PRELIMINARES					QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1															
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	6,00	R\$ 360,73	R\$ 2.164,38	6	R\$ 2.164,38	0	R\$ -	6,00	R\$ 2.164,38	R\$ -	0%
1.2	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M²	3465,13	R\$ 0,61	R\$ 2.113,73	3465,13	R\$ 2.113,73	0	R\$ -	3465,13	R\$ 2.113,73	R\$ -	0%
1.3	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	450,00	R\$ 67,63	R\$ 30.523,50	450,00	R\$ 30.523,50	0	R\$ -	450,00	R\$ 30.523,50	R\$ -	0%
1.4	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M²	844,20	R\$ 85,36	R\$ 72.060,91	844,2	R\$ 72.060,91	0	R\$ -	844,20	R\$ 72.060,91	R\$ -	0%
1.5	93214	SINAPI	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA	UN	1,00	R\$ 5.869,27	R\$ 5.869,27	1	R\$ 5.869,27	0	R\$ -	1,00	R\$ 5.869,27	R\$ -	0%
1.6	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M²	20,00	R\$ 911,56	R\$ 18.231,20	20	R\$ 18.231,20	0	R\$ -	20,00	R\$ 18.231,20	R\$ -	0%
1.7	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M²	20,00	R\$ 689,35	R\$ 13.767,00	20	R\$ 13.767,00	0	R\$ -	20,00	R\$ 13.767,00	R\$ -	0%
1.9	12031	SBC	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA/LUZ/FORÇA/ESGOTOS	UN	2,00	R\$ 6.431,72	R\$ 12.863,44	2	R\$ 12.863,44	0	R\$ -	2,00	R\$ 12.863,44	R\$ -	0%
1.10	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M²	2,52	R\$ 863,53	R\$ 2.176,10	2,52	R\$ 2.176,10	0	R\$ -	2,52	R\$ 2.176,10	R\$ -	0%
2			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA												
2.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	260,00	R\$ 140,68	R\$ 36.576,80	22	R\$ 3.094,96	22	R\$ 3.094,96	44,00	R\$ 6.189,92	R\$ 30.386,88	83%
2.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1056,00	R\$ 43,23	R\$ 45.650,88	88	R\$ 3.804,24	88	R\$ 3.804,24	176,00	R\$ 7.608,48	R\$ 38.042,40	83%
3			MOVIMENTO DE TERRA												
3.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_08/2023	M³	1617,00	R\$ 72,13	R\$ 116.634,21	0	R\$ -	210	R\$ 15.147,30	210,00	R\$ 15.147,30	R\$ 101.486,91	87%
3.2	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M³	3465,17	R\$ 1,18	R\$ 4.088,90	0	R\$ -	415	R\$ 489,70	415,00	R\$ 489,70	R\$ 3.599,20	88%
3.3	100938	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1617,00	R\$ 5,95	R\$ 9.621,15	0	R\$ -	210	R\$ 1.249,50	210,00	R\$ 1.249,50	R\$ 8.371,65	87%


Marcelo Vicente da Silva
Engº. Civil
CREA/BA Nº. 43.505-D
Registro nº 0500878889

Franklin de J. Sera
Engenheiro



4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	5	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	6	6.1	6.2	6.3	6.4
	93358	104818	94865	10166	104817	92759	92265	96557	94874		92762	92761	92760	92759	92759	94865	92265		10332	105024	105030	105024
	SINAPI	SINAPI	SINAPI	SINAPI	SINAPI	SINAPI	SINAPI	SINAPI	SINAPI		SINAPI	SINAPI	SINAPI	SINAPI	SINAPI	SINAPI	SINAPI		SINAPI	SINAPI	SINAPI	SINAPI
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	ARMADAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2:3,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	ALVENARIA DE EMBRASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_05/2020	ARMADAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_05/2022	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_09/2020	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO, AF_09/2023	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL, AF_05/2021	SUPERESTRUTURA	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_05/2022	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_05/2022	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_05/2022	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_05/2022	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_05/2022	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2:3,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_09/2020	ALVENARIA	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	VERGA MOLDADEIRA EM LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 10" CM, AF_03/2024	CONTRAVERGA MOLDADEIRA EM LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 10" CM, AF_03/2024	VERGA MOLDADEIRA EM LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 10" CM, AF_03/2024
	M²	KG	M³	M³	KG	KG	M³	M³	M³		KG	KG	KG	KG	KG	M³	M³		M³	M	M	M
	140,70	4278,30	105,60	167,79	176,10	1062,00	360,00	900,00	27,97		3107,10	1562,40	176,10	1307,20	1489,20	105,00	189,00		3488,100	159,000	159,000	102,000
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$
	102,22	12,76	483,70	671,29	14,40	13,18	106,72	43,07	423,18		8,98	10,35	11,61	13,18	13,18	463,70	106,72		133,32	51,65	35,68	51,65
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$
	14,382,35	54,591,11	48,966,72	112,635,75	2,535,84	13,987,16	38,419,20	38,763,00	11,839,34		27,901,76	16,170,84	2,044,52	18,263,30	19,746,28	48,688,50	20,170,08		465,033,48	8,212,35	6,150,12	5,268,30
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$
	42,21	1283,48	31,68	0	52,83	318,6	108	0	8,391		0	0	0	0	0	0	0		465,08	0	42,40	0
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$
	35,175	1089,575	26,4	27,83	44,025	265,5	90	270	6,09		155,36	78,12	8,81	69,36	74,91	5,25	9,45		465,08	0	42,40	0
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$
	77,39	2353,07	58,08	27,83	96,86	584,10	188,00	270	15,38		1,395,09	808,54	102,23	914,16	987,31	2,434,43	1,008,50		62,004,47	0	1,640,03	0
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$
	7,910,29	30,025,11	26,931,70	18,882,00	1,384,71	7,698,44	21,130,56	11,628,90	6,509,89		1,395,09	808,54	102,23	914,16	987,31	2,434,43	1,008,50		62,004,47	0	1,640,03	0
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$
	6,472,06	24,566,00	22,035,02	93,963,75	1,141,13	6,288,72	17,288,84	27,134,10	5,328,36		26,506,67	15,362,30	1,942,28	17,369,13	18,758,96	46,254,08	19,161,58		403,029,03	8,212,35	4,510,09	5,268,30
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$
	45%	45%	45%	45%	83%	45%	45%	45%	70%		45%	95%	95%	95%	95%	95%	95%		87%	100%	73%	100%



 Marcelo Mendes da Silva
 Eng. Civil
 CREA / BA Nº 43.505-D
 Matrícula nº 0500878889


 Franklin dos Santos
 Eng. Civil



10			ESQUADRIAS														
10.1	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, AF 11/2020	M	150,00	R\$ 93,49	R\$ 14.864,91	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	R\$ 14.864,91			100%
10.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	M²	144,00	R\$ 190,68	R\$ 27.467,92	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	R\$ 27.467,92			100%
10.3	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	M²	7,50	R\$ 390,64	R\$ 2.929,80	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	R\$ 2.929,80			100%
10.4	90789	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	LN	60,00	R\$ 600,35	R\$ 36.021,00	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	R\$ 36.021,00			100%
10.5	90788	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	LN	30,00	R\$ 598,08	R\$ 17.942,40	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	R\$ 17.942,40			100%
10.7	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	LN	150,00	R\$ 142,23	R\$ 21.334,50	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	R\$ 21.334,50			100%
10.8	91299	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	LN	60,00	R\$ 1.461,92	R\$ 87.715,20	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	R\$ 87.715,20			100%



 Marcelo Meente da Silva
 Engº. Civil
 CREA / BA Nº. 43.505-D
 Registro nº 0500878889


 Franklin de J. S. Figueiredo
 CREA / BA Nº. 43.505-D
 Registro nº 0500878889



12.10	4880	ORSE	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM MÁRMORE SINTÉTICO, DIM 1.20X0.50, COM 01 CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA TODOS DE PLÁSTICO, ASSENTADA.	UN	30,00	R\$	274,55	R\$	8.236,50	0	R\$	-	0	R\$	-	R\$	8.236,50	100%
12.11	88930	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSÃO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	30,00	R\$	276,76	R\$	8.302,80	0	R\$	-	0	R\$	-	R\$	8.302,80	100%
12.12	88938	SINAPI	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM. PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGAITE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020.	UN	30,00	R\$	354,95	R\$	10.648,50	0	R\$	-	0	R\$	-	R\$	10.648,50	100%
12.13	88931	SINAPI	VASO SANITÁRIO BIFONADO COM CAIXA ACOPIADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGAITE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	30,00	R\$	403,03	R\$	12.117,90	0	R\$	-	0	R\$	-	R\$	12.117,90	100%
12.14	88985	SINAPI	ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021	UN	30,00	R\$	75,92	R\$	2.277,60	0	R\$	-	0	R\$	-	R\$	2.277,60	100%
12.15	94648	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 04/2024	M	1650,00	R\$	5,53	R\$	9.124,50	0	R\$	-	0	R\$	-	R\$	9.124,50	100%
12.16	88711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	M	240,00	R\$	22,21	R\$	5.330,40	0	R\$	-	0	R\$	-	R\$	5.330,40	100%
12.17	102264	SINAPI	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 01/2021	M	210,00	R\$	14,78	R\$	3.103,80	0	R\$	-	0	R\$	-	R\$	3.103,80	100%
12.18	103947	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAVAL DE ÁGUA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	150,00	R\$	6,80	R\$	1.020,00	0	R\$	-	0	R\$	-	R\$	1.020,00	100%
12.19	88810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 08/2022	UN	60,00	R\$	25,48	R\$	1.568,80	0	R\$	-	0	R\$	-	R\$	1.568,80	100%
12.20	88724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	120,00	R\$	10,34	R\$	1.240,80	0	R\$	-	0	R\$	-	R\$	1.240,80	100%
12.21	88744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	60,00	R\$	24,48	R\$	1.468,80	0	R\$	-	0	R\$	-	R\$	1.468,80	100%
12.22	88866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2022	UN	150,00	R\$	7,94	R\$	1.191,00	0	R\$	-	0	R\$	-	R\$	1.191,00	100%
12.23	88821	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 08/2022	UN	60,00	R\$	16,23	R\$	973,80	0	R\$	-	0	R\$	-	R\$	973,80	100%
12.24	103955	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	150,00	R\$	10,10	R\$	1.515,00	0	R\$	-	0	R\$	-	R\$	1.515,00	100%
12.25	88669	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2022	UN	120,00	R\$	10,87	R\$	1.304,40	0	R\$	-	0	R\$	-	R\$	1.304,40	100%
12.26	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM	UN	30,00	R\$	2.175,29	R\$	65.258,70	0	R\$	-	0	R\$	-	R\$	65.258,70	100%
12.27	98034	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M. ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF. 12/2020	UN	30,00	R\$	2.487,60	R\$	74.628,00	0	R\$	-	0	R\$	-	R\$	74.628,00	100%
12.28	4428	ORSE	CAIXA DE INSPEÇÃO, 0,36 X 0,30 X 0,40M	UN	60,00	R\$	179,03	R\$	10.741,80	0	R\$	-	0	R\$	-	R\$	10.741,80	100%
12.29	103042	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021	UN	60,00	R\$	26,74	R\$	1.604,40	0	R\$	-	0	R\$	-	R\$	1.604,40	100%
12.30	88814	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	60,00	R\$	82,90	R\$	4.974,00	0	R\$	-	0	R\$	-	R\$	4.974,00	100%
12.31	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	30,00	R\$	86,76	R\$	2.602,80	0	R\$	-	0	R\$	-	R\$	2.602,80	100%
12.32	88883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	30,00	R\$	9,58	R\$	287,40	0	R\$	-	0	R\$	-	R\$	287,40	100%


 Marcello Mendes da Silva
 Engº Civil
 CREA / BA Nº 13.505-D
 Registro nº 0500678899


 Franklin de Jesus
 Engº Civil
 CREA / BA Nº 13.505-D
 Registro nº 0500678899



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE**

RIACHÃO DO JACUIPE - BAHIA

COORDENADORIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Nº: 00000029

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Contribuinte:	ECKO CONSTRUTORA LTDA
Endereço:	RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO, 75 CENTRO
Complemento:	SALA 06
Cidade/UF:	RIACHÃO DO JACUIPE - BA
CPF/CNPJ:	19846470000107
Inscrição Estadual/RG:	
Inscrição Municipal:	00312100116

Reservado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e inscrições em dívida ativa do Município, administrados pela Fazenda Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Fazenda Municipal.

GERADA EM: 02/04/2025 09:49:28 horário de Brasília

EMITIDA EM: 23/05/2025 10:41:42 horário de Brasília

VÁLIDA ATÉ: 01/07/2025

CHAVE DE VALIDAÇÃO: zKUTwBck

Verifique a autenticidade dessa certidão acessando o portal: <http://www.keepinformatica.com.br/portal/web/riachadojacuipe.autentica-cnd>

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20252746964**

RAZÃO SOCIAL ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ 19.846.470/0001-07

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 23/05/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ECKO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 19.846.470/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:47:28 do dia 28/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/06/2025.

Código de controle da certidão: **F2F3.2D1D.5FC9.20EF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ECKO CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.846.470/0001-07

Certidão nº: 28461846/2025

Expedição: 23/05/2025, às 10:40:58

Validade: 19/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ECKO CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.846.470/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.846.470/0001-07
Razão Social: ECKO CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEIREDO 75 SALA 06 / CENTRO /
RIACHÃO DO JACUIPE / BA / 44640-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/05/2025 a 19/06/2025

Certificação Número: 2025052104092143916050

Informação obtida em 23/05/2025 10:39:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

CNPJ/MF Nº 13.807.870/0001-19

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.

Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



TERMO DE APOSTILAMENTO

Termo de Apostilamento ao contrato nº. 413/2025
Concorrência Eletrônica no 002/2024 que entre si
celebram o **Município de Santaluz – BA** e a pessoa
jurídica **ECKO CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ/MF Nº
19.846.470/0001-07.

O **Municipal de Santaluz – BA**, com sede na Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo, CEP: 48.880-000 - Santaluz-BA, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº 13.807.870/0001-19, representada pelo Prefeito, Sr. **ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR**, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob o nº 016.549.665-76 e portador do RG nº 1148395733, acompanhado da Secretária Municipal de Assistência Social, Sra. **MARIANE DE SOUSA BARBOSA NUNES**, inscrita no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob o nº 880.456.415-68, doravante denominado **CONTRATANTE** e a pessoa jurídica **ECKO CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 19.846.470/0001-07, com sede na Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, nº 75, sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe/BA, CEP: 44.640-000, doravante designada **CONTRATADA**, acordam e ajustam firmar o presente **TERMO DE APOSTILAMENTO** ao contrato acima mencionado, nos termos da Lei 14.133/21, suas alterações e legislações pertinentes e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

É objeto do presente apostilamento a alteração da cláusula catorze do presente contrato, acrescentando à dotação orçamentária, como descrito a seguir:

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - A Dotação orçamentária que será inserida em tal despesa é:

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Assistência Social

UNIDADE: 0905

PROJETO ATIVIDADE: 2.057

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51

FONTE DE RECURSOS: 1708





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

CNPJ/MF Nº 13.807.870/0001-19

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.

Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



CLÁUSULA TERCEIRA – DA FINALIDADE

Este termo de apostilamento tem por finalidade acrescentar dotação orçamentária ao presente contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

O presente Termo de Apostilamento reger-se-á em conformidade com o art. art. 136, Inciso IV, da Lei 14.133/21.

Santaluz – BA, 05 de junho de 2025.

ARISMÁRIO BARBOSA JÚNIOR

Prefeito Municipal

MARIANE DE SOUSA BARBOSA

Secretária Municipal de Assistência Social



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ECKO CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	19.846.470/0001-07
Período apuração	04/2025	Número do Recibo	50000344795195
Data/Hora da Transmissão	19/05/2025 15:07:30	Identificação da Apuração de Débitos	108635914 / Reinf CP 32526311183 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEIREDO	Número	75
Complemento	SALA 06	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	RIACHAO DO JACUIPE	UF	BA
CEP	44640000	Telefone	7532641426
Correio Eletrônico	ECKOCONSTRUTORA2016@HOTMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	JACQUELINE DE OLIVEIRA LIMA	CPF	81476124515
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	ANDREA DE OLIVEIRA LIMA		
CPF	01550937545	CRC	-
UF	-	Telefone	4834611000
Correio Eletrônico	eckoconstrutora@gmail.com		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.015.46171/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	175,45		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 175,45		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.015.46171/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	70,18		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 70,18		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.015.46171/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	105,27		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 105,27		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.015.46171/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	14,03		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 14,03		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.015.46171/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	42,10		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 42,10		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.015.46171/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	210,54		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 210,54		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.015.46171/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	1.403,60		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.403,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	584,48		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 584,48		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	58,84		
Saldo a Pagar	58,84		





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 19.846.470 Nome Empregador: ECKO CONSTRUTORA LTDA Qtd. Traba
Vencimento da Guia: 20/05/2025 Total Parcelado: 0,00
Número da Guia: 0125051971017803-0 Data Emissão: 19/05/2025 15:08:14 (Brasília) Emitida por: 19.846.470/0001-07 - ECKO CON

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.015.46171/71		Tomador: Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Val
04/2025		JOAO VITOR SOARES DA SILVA	1000000068	077.317.655-12	101	20/05/2025	Mensal	3.500,00	
04/2025		MICHELLE RIOS ARAUJO	1000000066	020.946.275-27	101	20/05/2025	Mensal	2.000,00	
04/2025		RONEI SOUZA DE SANTANA	1.1	045.969.095-71	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	
Total do Tomador							Sem Tomador	7.018,00	
Total do Estabelecimento							90.015.46171/71	7.018,00	
							Total FGTS	7.018,00	





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 19.846.470 **Nome Empregador:** ECKO CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Traba**
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00
Número da Guia: 0125051971017803-0 **Data Emissão:** 19/05/2025 15:08:14 (Brasília) **Emitida por:** 19.846.470/0001-07 - ECKO CON

Relação de Categorias

Estabelecimento: 90.015.46171/71

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros
04/2025	101	3	7.018,00	561,44	0,00	0,00	0,00
		Total FGTS	7.018,00	561,44	0,00	0,00	0,00

Descrição das categorias:

191 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
192 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
193 - Empregado - Aprendiz
194 - Empregado - Doméstico
195 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.061/1996
196 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 8.019/1974
197 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
198 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo ceelsonário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
732 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
733 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
734 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
735 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
736 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em 19/05/2025





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 19.846.470 **Nome Empregador:** ECKO CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Traba**
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00
Número da Guia: 0125051971017803-0 **Data Emissão:** 19/05/2025 15:08:14 (Brasília) **Emitida por:** 19.846.470/0001-07 - ECKO CON

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros
04/2025	90.015.46171/71	3	7.018,00	561,44	0,00	0,00	0,00
		Total FGTS	7.018,00	561,44	0,00	0,00	0,00





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 19.846.470 **Nome Empregador:** ECKO CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Traba**
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00
Número da Guia: 0125051971017803-0 **Data Emissão:** 19/05/2025 15:08:14 (Brasília) **Emitida por:** 19.846.470/0001-07 - ECKO CON

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 90.015.46171/71

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatório na Guia
04/2025	11 - FGTS mensal	3	7.018,00	561,44	0,00	0,00
		Total FGTS	7.018,00	561,44	0,00	0,00





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 19.846.470 **Nome Empregador:** ECKO CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Traba**
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00
Número da Guia: 0125051971017803-0 **Data Emissão:** 19/05/2025 15:08:14 (Brasília) **Emitida por:** 19.846.470/0001-07 - ECKO CON

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros
04/2025	3	7.018,00	561,44	0,00	0,00	0,00
	Total FGTS	7.018,00	561,44	0,00	0,00	0,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	19.846.470/0001-07
Nome	ECKO CONSTRUTORA LTDA
Período de apuração	04/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	108635914 / Reinf CP 32526311183 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 584,48	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.614,14	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 407,03	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 58,84	R\$ 58,84
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.664,49	R\$ 58,84

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome JACQUELINE DE OLIVEIRA LIMA
CPF 814.761.245-15
Telefone -

Recibo de Entrega da DCTFWeb





Pagar este documento até

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

561,44

CPF/CNPJ do Empregador

19.846.470

Nome/Razão Social do Empregador

ECKO CONSTRUTORA LTDA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125051971017803-0

Tag

19846470 04/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	3	561,44	0,00	0,00	0,00	561,44
Total FGTS:		561,44	0,00	0,00	0,00	561,44

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 561,44

Observações

Data de geração da Guia: 19/05/2025 às 15:08:14 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.br:pix-grande-caixa.gov.br/api/v2/cobv/e2e902b550b047aa89026d36317b17775204000053039865802885923CATXA ECONOMICA PROPRAT:6008RvAn11a62070503***6304500R

Payload Location:

pix-grande-caixa.gov.br/api/v2/cobv/e2e902b550b047aa89026d36317b1777



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.56
1047201047 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA
AGENCIA: 1047-2 CONTA: 29.052-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250519190640873637388
CNPJ DO PAGADOR: 19.846.470/0001-07
VALOR: R\$561,44
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/05/2025 - 16:06:48
COD PRODUTO: d777a0b973d747059c5331c8123c63ec
DEVEDOR: ECKO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 19.***.***/*-07

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/05/2025 - 16:06:49

DOCUMENTO: 051903
AUTENTICACAO SISBB: 4.2E6.1D4.CAD.94B.F3E

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 19.846.470/0001-07	Razão Social ECKO CONSTRUTORA LTDA		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25139.8198194-6	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000344795195			Valor Total do Documento 58,84

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	58,84		
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS			
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025			
	Totais	58,84		
				58,84

SEDA (Versão:5.2.3)Página: 1 / 119/05/2025 15:08:54

85830000000 9 58840385251 5 40071625139 1 81981946809 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9	58840385251 5	40071625139 1	81981946809 8	CNPJ:	19.846.470/0001-07	
				Número:	07.16.25139.8198194-6	
				Pagar até:	20/05/2025	
				Valor:	58,84	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.50
1047201047 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA
AGENCIA: 1047-2 CONTA: 29.052-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250519190735353118764
CNPJ DO PAGADOR: 19.846.470/0001-07
VALOR: R\$58,84
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/05/2025 - 16:07:42
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162513981981946046325497
DEVEDOR: ECKO CONSTRUTORA ESERVICOS
CNPJ DO DEVEDOR: 19.***.***/*-07

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/05/2025 - 16:07:42

=====

DOCUMENTO: 051904
AUTENTICACAO SISBB: 6.3C9.DC7.C64.096.B06

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.


SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



EXECUTANTE	ECKO CONSTRUTORA	DATA	23/04/2025
LOCAL DA OBRA	MUNICÍPIO DE SANTALUZ	NÚMERO DO DIÁRIO	30
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	366
		DIAS CORRIDOS	30
		SALDO DO PRAZO	336
DIA DA SEMANA	D ☐ S ☐ T ☐ Q ☒ Q ☐ S ☐ S ☐		



CONSTRUÇÃO DE 30 CASAS POPULARES PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187/2024

[illegible]

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL		NUBLADO	CHUVA	Pluviometria (mm)
Manhã	PRATICÁVEL	Manhã	Manhã	
Tarde	PRATICÁVEL	Tarde	Tarde	
Noite		Noite	Noite	

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA SAPATAS E VIGAS

ARMACÃO DE SAPATAS

CONCRETAGEM DE SAPATAS

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Assinatura Fiscalização de Campo/Supervisão

~~Franklin de J. Sen.~~



EXECUTANTE	ECKO CONSTRUTORA	DATA	24/04/2025
LOCAL DA OBRA	MUNICIPIO DE SANTALUZ	NUMERO DO DIARIO	31
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	365
		DIAS CORRIDOS	31
		SALDO DO PRAZO	335
DIA DA SEMANA	D ☐ S ☐ T ☐ Q ☐ Q ☒ S ☐ S ☐		



CONSTRUÇÃO DE 30 CASAS POPULARES PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187/2024

MÃO DE OBRA				EQUIPAMENTOS	
INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Gerente de Contrato		Ajudante	8	Caminhão Pipa	
Engenheiro de Produção		Armador	1	Retro Escavadeira	
Engenheiro Planejamento		Carpinteiro	2	Caminhão Basculante	
Técnico de segurança		Pedreiro	3	Caminhão Munck	
Auxiliar Administrativo		Encarregado	1	Caçamba	
Comprador		Vigilante		Compactador	
Topógrafo		Operador retro			
		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS					
SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	PRATICÁVEL	Manhã	Manhã	Pluviometria (mm)	
Tarde	PRATICÁVEL	Tarde	Tarde		
Noite		Noite	Noite		

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA SAPATAS E VIGAS

ARMACÃO DE SAPATAS

CONCRETAGEM DE SAPATAS

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Assinatura Fiscalização de Campo/Supervisão

~~Assinatura Fiscalização de Defesa Superior~~
~~Franklin de J. Sena~~

Engenharia Civil
Código 15400892-7



EXECUTANTE	ECKO CONSTRUTORA	DATA:	25/04/2025
LOCAL DA OBRA	MUNICIPIO DE SANTALUZ	NÚMERO DO DIÁRIO	32
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	365
		DIAS CORRIDOS	32
		SALDO DO PRAZO	334
DIA DA SEMANA	D S T Q O S S S		



CONSTRUÇÃO DE 30 CASAS POPULARES PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187/2024

[illegible]

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA SAPATAS E VIGAS

ARMACÃO DE SAPATAS

CONCRETAGEM DE SAPATAS

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Assinatura Fiscalização do Cl. Servis.

Franklin de J. A. Silva
Juizheiro CI

003912



EXECUTANTE	ECKO CONSTRUTORA	DATA:	26/04/2025
LOCAL DA OBRA	MUNICIPIO DE SANTALUZ	NUMERO DO DIARIO	33
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	366
		DIAS CORRIDOS	33
		SALDO DO PRAZO	333
DIA DA SEMANA	D ☐ S ☐ T ☐ Q ☐ Q ☐ S ☐ S ☒		



MÃO DE OBRA

[illegible]

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL		NUBLADO	CHUVA	Pluviometria (mm)
Manhã	PRATICÁVEL	Manhã	Manhã	
Tarde	PRATICÁVEL	Tarde	Tarde	
Noite		Noite	Noite	

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS

NÃO HOUVE EXPEDIENTE

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Assinatura Fiscalização de Campo/Supervisão

Fracklin de J. Sen



EXECUTANTE	ECKO CONSTRUTORA	DATA	27/04/2025
LOCAL DA OBRA	MUNICÍPIO DE SANTALUZ	NÚMERO DO DIÁRIO	34
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	365
		DIAS CORRIDOS	34
		SALDO DO PRAZO	332
DIA DA SEMANA	D S T Q Q S S		



MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Gerente de Contrato		Ajudante		Caminhão Pipa	
Engenheiro de Produção		Armador		Retro Escavadeira	
Engenheiro Planejamento		Carpinteiro		Caminhão Basculante	
Técnico de segurança		Pedreiro		Caminhão Munck	
Auxiliar Administrativo		Encarregado		Caçamba	
Comprador		Vigilante		Compactador	
Topógrafo		Operador retro			
		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA		Pluviometria (mm)
Manhã	PRATICÁVEL	Manhã		Manhã		
Tarde	PRATICÁVEL	Tarde		Tarde		
Noite		Noite		Noite		

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS

NÃO HOUVE EXPEDIENTE

COMENTÁRIOS

Assinatura Controlada

Asamblea Ejecutiva del Consejo Superior

Franklin de J. Sena







EXECUTANTE	ECKO CONSTRUTORA	DATA	01/05/2025
LOCAL DA OBRA	MUNICIPIO DE SANTALUZ	NÚMERO DO DIÁRIO	38
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	365
		DIAS CORRIDOS	38
		SALDO DO PRAZO	328
DIA DA SEMANA	D S T Q G S S		

[illegible]

MÃO DE OBRA

[illegible]

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL		NUBLADO	CHUVA	Pluviometria (mm)
Manhã	PRATICÁVEL	Manhã	Manhã	
Tarde	PRATICÁVEL	Tarde	Tarde	
Noite		Noite	Noite	

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS

NÃO HOUVE EXPEDIENTE

COMENTÁRIOS

Assinatura Controlada

Assinatura Fiscalização de Campo/Supervisão

Franklin de J. Sena

Case JS-108919-1



EXECUTANTE	ECKO CONSTRUTORA	DATA	02/05/2025
LOCAL DA OBRA	MUNICIPIO DE SANTALUZ	NUMERO DO DIÁRIO	39
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	365
		DIAS CORRIDOS	39
		SALDO DO PRAZO	327
DIA DA SEMANA	D ☐ S ☐ T ☐ Q ☐ Q ☐ S ☒ S ☐		



MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Gerente de Contrato		Ajudante	9	Caminhão Pipa	
Engenheiro de Produção		Armador	2	Retro Escavadeira	
Engenheiro Planejamento		Carpinteiro	2	Caminhão Basculante	
Técnico de segurança		Pedreiro	4	Caminhão Munck	
Auxiliar Administrativo		Encarregado	1	Caçamba	
Comprador		Vigilante		Compactador	
Topógrafo		Operador retro			
		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

CONDICÕES METEOROLÓGICAS

SOL		NUBLADO	CHUVA		Pluviometria (mm)
Manhã		Manhã	Manhã	PRATICÁVEL	
Tarde		Tarde	Tarde	PRATICÁVEL	
Noite		Noite	Noite		

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA SAPATAS E VIGAS

ARMAÇÃO DE SAPATAS

ASSENTAMENTO DA ALVENARIA DE EMBASAMENTO

COMENTÁRIOS



Assinatura Contratada

Assinatura Fiscalização de Campo/Supervisão

Franklin de J. Sena

106913-1

EXECUTANTE	ECKO CONSTRUTORA	DATA	03/05/2025
LOCAL DA OBRA	MUNICIPIO DE SANTALUZ	NUMERO DO DIÁRIO	40
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	396
		DIAS CORRIDOS	40
		SALDO DO PRAZO	326
DIA DA SEMANA	D S T Q Q S S		

Weather Condition	Frequency
Sunny	1
Partly Cloudy	2
Rainy	3
Stormy	1

MÃO DE OBRA

MÃO DE OBRA				EQUIPAMENTOS	
INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Gerente de Contrato		Ajudante		Caminhão Pipa	
Engenheiro de Produção		Armador		Retro Escavadeira	
Engenheiro Planejamento		Carpinteiro		Caminhão Basculante	
Técnico de segurança		Pedreiro		Caminhão Munck	
Auxiliar Administrativo		Encarregado		Caçamba	
Comprador		Vigilante		Compactador	
Topógrafo		Operador retro			
		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL		NUBLADO	CHUVA		Pluviometria (mm)
Manhã		Manhã	Manhã	PRATICÁVEL	
Tarde		Tarde	Tarde	PRATICÁVEL	
Noite		Noite	Noite		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NÃO HOUVE EXPEDIENTE

COMENTÁRIOS



Assinatura Contratada

Assinatura Fiscalização de Campo/Supervisão

Franklin de J. Sena

EXECUTANTE	ECKO CONSTRUTORA	DATA	04/05/2025
LOCAL DA OBRA	MUNICIPIO DE SANTALUZ	NUMERO DO DIÁRIO	41
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	366
		DIAS CORRIDOS	41
		SALDO DO PRAZO	325
DIA DA SEMANA	D ☒ S ☐ T ☐ Q ☐ Q ☐ S ☐ S ☐		

MÃO DE OBRA

[illegible]

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL		NUBLADO	CHUVA		Pluviometria (mm)
Manhã		Manhã	Manhã	PRATICÁVEL	
Tarde		Tarde	Tarde	PRATICÁVEL	
Noite		Noite	Noite		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NÃO HOUVE EXPEDIENTE

COMENTÁRIOS

Asignatura Contratada

Assinatura Fiscalização de Campo/Supervisão

Franklin de J. Sena





					
---	---	---	---	---	---

MÃO DE OBRA				EQUIPAMENTOS	
INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Gerente de Contrato		Ajudante	9	Caminhão Pipa	
Engenheiro de Produção		Armador	2	Retro Escavadeira	
Engenheiro Planejamento		Carpinteiro	2	Caminhão Basculante	
Técnico de segurança		Pedreiro	4	Caminhão Munck	
Auxiliar Administrativo		Encarregado	1	Caçamba	
Comprador		Vigilante		Compactador	
Topógrafo		Operador retro			
		SUBEMPREENTEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENTEIROS - Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT

SOL		NUBLADO		CHUVA		Pluviometria (mm)
Manhã		Manhã		Manhã	IMPRATICÁVEL	
Tarde		Tarde		Tarde	IMPRATICÁVEL	
Noite		Noite		Noite		

ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA SAPATAS E VIGAS ARMAÇÃO DE SAPATAS ASSENTAMENTO DA ALVENARIA DE EMBASAMENTO
--

COMENTÁRIOS

Assinatura Fiscalização de Campo/Superior

Franklin de J. ...
...beiro ...



EXECUTANTE	ECKO CONSTRUTORA	DATA	07/05/2025
LOCAL DA OBRA	MUNICIPIO DE SANTALUZ	NÚMERO DO DIÁRIO	44
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	306
		DIAS CORRIDOS	44
		SALDO DO PRAZO	322
DIA DA SEMANA	D S T Q Q S S		

					
---	---	---	---	---	---

MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Gerente de Contrato		Ajudante	9	Caminhão Pipa	
Engenheiro de Produção		Armador	2	Retro Escavadeira	
Engenheiro Planejamento		Carpinteiro	2	Caminhão Basculante	
Técnico de segurança		Pedreiro	4	Caminhão Munck	
Auxiliar Administrativo		Encarregado	1	Caçamba	
Comprador		Vigilante		Compactador	
Topógrafo		Operador retro			
		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT.	EMPRESA	QUANT.

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA		Pluviometria (mm)
Manhã		Manhã	PRATICAVEL	Manhã		
Tarde		Tarde	PRATICAVEL	Tarde		
Noite		Noite		Noite		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPERMEABILIZAÇÃO DA BALDRAME

COMENTÁRIOS



Assinatura Contratada

Assinatura Fiscalização de Campo/Supervisão

Franklin de la Pena

EXECUTANTE	ECKO CONSTRUTORA	DATA	08/05/2025
LOCAL DA OBRA	MUNICÍPIO DE SANTALUZ	NÚMERO DO DIÁRIO	45
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	366
		DIAS CORRIDOS	45
		SALDO DO PRAZO	321
DIA DA SEMANA	D S T Q Q S S S		



MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO		EQUIPAMENTOS		
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	
Gerente de Contrato		Ajudante	9	Caminhão Pipa		
Engenheiro de Produção		Armador	2	Retro Escavadeira		
Engenheiro Planejamento		Carpinteiro	2	Caminhão Basculante		
Técnico de segurança		Pedreiro	4	Caminhão Munck		
Auxiliar Administrativo		Encarregado	1	Caçamba		
Comprador		Vigilante		Compactador		
Topógrafo		Operador retro				
		SUBEMPREITEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREITEIROS - Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT.	EMPRESA	QUANT.	
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA						
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS						
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS						
SOL		NUBLADO		CHUVA		Pluviometria (mm)
Manhã		Manhã		Manhã	PRATICÁVEL	
Tarde		Tarde		Tarde	PRATICÁVEL	
Noite		Noite		Noite		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSENTAMENTO DA ALVENARIA DE EMBASAMENTO
CONCRETAGEM DE VIGAS E SAPATAS
IMPERMEABILIZAÇÃO DA BALDRAME

COMENTÁRIOS



Assinatura Contratada

Assinatura Fiscalização de Campo/Supervisão

Franklin de J. Sena

EXECUTANTE	ECKO CONSTRUTORA	DATA	09/05/2025
LOCAL DA OBRA	MUNICÍPIO DE SANTALUZ	NÚMERO DO DIÁRIO	46
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	366
		DIAS CORRIDOS	46
		SALDO DO PRAZO	320
DIA DA SEMANA	D S T Q Q S S		

																																																																																																																										
---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MÃO DE OBRA

MÃO DE OBRA				EQUIPAMENTOS	
INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Gerente de Contrato		Ajudante	9	Caminhão Pipa	
Engenheiro de Produção		Armador	2	Retro Escavadeira	
Engenheiro Planejamento		Carpinteiro	2	Caminhão Basculante	
Técnico de segurança		Pedreiro	4	Caminhão Munck	
Auxiliar Administrativo		Encarregado	1	Caçamba	
Comprador		Vigilante		Compactador	
Topógrafo		Operador retro			
		SUBEMPREENHEITORES - Mão de Obra		SUBEMPREENHEITORES - Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

CONDICÕES METEOROLÓGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA		Pluviometria (mm)
Manhã		Manhã	PRATICAVEL	Manhã		
Tarde		Tarde	PRATICAVEL	Tarde		
Noite		Noite		Noite		

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSENTAMENTO DA ALVENARIA DE EMBASAMENTO

CONCRETAGEM DE VIGAS E SAPATAS

IMPERMEABILIZAÇÃO DA BALDRAME

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Assinatura Fiscalização de Campo/Supervisão

~~Franklin de J. Sena~~



DIÁRIO DE OBRAS



EXECUTANTE	ECKO CONSTRUTORA	DATA	10/05/2025
LOCAL DA OBRA	MUNICÍPIO DE SANTALUZ	NÚMERO DO DIÁRIO	47
		PRazo CONTRATUAL (DIAS)	366
		DIAS CORRIDOS	47
		SALDO DO PRAZO	319
DIA DA SEMANA	D ☐ S ☐ T ☐ Q ☐ Q ☐ S ☐ S ☐		



CONSTRUÇÃO DE 30 CASAS POPULARES PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187/2024

MÃO DE OBRA				EQUIPAMENTOS	
INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Gerente de Contrato		Ajudante		Caminhão Pipa	
Engenheiro de Produção		Armador		Retro Escavadeira	
Engenheiro Planejamento		Carpinteiro		Caminhão Basculante	
Técnico de segurança		Pedreiro		Caminhão Munck	
Auxiliar Administrativo		Encarregado		Caçamba	
Comprador		Vigilante		Compactador	
Topógrafo		Operador retro			
		SUBEMPREITEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREITEIROS - Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT.	EMPRESA	QUANT.
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS					
SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã		Manhã	PRATICÁVEL	Manhã	
Tarde		Tarde	PRATICÁVEL	Tarde	
Noite		Noite		Noite	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NÃO HOUVE EXPEDIENTE

COMENTÁRIOS



Assinatura Contratada

Assinatura Fiscalização de Campo/Supervisão

Franklin de

EXECUTANTE	ECKO CONSTRUTORA	DATA	11/05/2025
LOCAL DA OBRA	MUNICÍPIO DE SANTALUZ	NÚMERO DO DIÁRIO	48
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	366
		DIAS CORRIDOS	48
		SALDO DO PRAZO	318
DIA DA SEMANA	D S T Q Q S S		



MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Gerente de Contrato		Ajudante		Caminhão Pipa	
Engenheiro de Produção		Armador		Retro Escavadeira	
Engenheiro Planejamento		Carpinteiro		Caminhão Basculante	
Técnico de segurança		Pedreiro		Caminhão Munck	
Auxiliar Administrativo		Encarregado		Caçamba	
Comprador		Vigilante		Compactador	
Topógrafo		Operador retro			
		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT.	EMPRESA	QUANT.

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA		Pluviometria (mm)
Manhã		Manhã	PRATICÁVEL	Manhã		
Tarde		Tarde	PRATICÁVEL	Tarde		
Noite		Noite		Noite		

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS

NÃO HOUVE EXPEDIENTE

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Assinatura Fiscalização de Campo Supervisora

Franklin de J. Sena



EXECUTANTE	ECKO CONSTRUTORA	DATA	12/05/2025
LOCAL DA OBRA	MUNICÍPIO DE SANTALUZ	NÚMERO DO DIÁRIO	49
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	366
		DIAS CORRIDOS	49
		SALDO DO PRAZO	317
DIA DA SEMANA	D S T Q Q S S		

--	--	--	--	--

MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Gerente de Contrato		Ajudante	9	Caminhão Pipa	
Engenheiro de Produção		Armador	2	Retro Escavadeira	
Engenheiro Planejamento		Carpinteiro	2	Caminhão Basculante	
Técnico de segurança		Pedreiro	4	Caminhão Munk	
Auxiliar Administrativo		Encarregado	1	Caçamba	
Comprador		Vigilante		Compactador	
Topógrafo		Operador retro			
		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA		Pluviometria (mm)
Manhã		Manhã	PRATICAVEL	Manhã		
Tarde		Tarde	PRATICAVEL	Tarde		
Noite		Noite		Noite		

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS

ATERRO MANUAL E COMPACTAÇÃO

COMENTÁRIOS

Assinatura Fiscalização de Campo/Supervisão

Franklin de L. Sena



EXECUTANTE	ECKO CONSTRUTORA	DATA	13/05/2025
LOCAL DA OBRA	MUNICÍPIO DE SANTALUZ	NÚMERO DO DIÁRIO	50
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	366
		DIAS CORRIDOS	50
		SALDO DO PRAZO	316
DIA DA SEMANA	D ☐ S ☐ T ☒ Q ☐ Q ☐ S ☐ S ☐		



MÃO DE OBRA

[illegible]

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA		Pluviometria (mm)
Manhã		Manhã	PRATICAVEL	Manhã		
Tarde		Tarde	PRATICAVEL	Tarde		
Noite		Noite		Noite		

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSENTAMENTO DA ALVENARIA DE VEDACÃO

ATERRO MANUAL E COMPACTAÇÃO

ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA SAPATAS E VIGAS

ARMACÃO DE SAPATAS

COMENTÁRIOS



Assinatura Contratada

Assinatura Fiscalização de Campo/Supervisão

Franklin de J. Sena

05-03891-1

EXECUTANTE	ECKO CONSTRUTORA	DATA	14/05/2025
LOCAL DA OBRA	MUNICÍPIO DE SANTALUZ	NÚMERO DO DIÁRIO	51
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	366
		DIAS CORRIDOS	51
		SALDO DO PRAZO	315
DIA DA SEMANA	D S T Q Q S S		

					
---	---	---	---	---	---

MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Gerente de Contrato		Ajudante	9	Caminhão Pipa	
Engenheiro de Produção		Armador	2	Retro Escavadeira	
Engenheiro Planejamento		Carpinteiro	2	Caminhão Basculante	
Técnico de segurança		Pedreiro	4	Caminhão Munck	
Auxiliar Administrativo		Encarregado	1	Caçamba	
Comprador		Vigilante		Compactador	
Topógrafo		Operador retro			
		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT.	EMPRESA	QUANT.

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA		Pluviometria (mm)
Manhã		Manhã	PRATICÁVEL	Manhã		
Tarde		Tarde	PRATICÁVEL	Tarde		
Noite		Noite		Noite		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ARMACÃO DE SAPATAS

COMENTÁRIOS

Assinatura Fiscale: Franklin de

Franklin de J. Sena



DIA DA SEMANA		D	S	T	Q	Q	S	S
---------------	--	---	---	---	---	---	---	---

CONSTRUÇÃO DE 30 CASAS POPULARES PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187/2024

Case 02-11891-7



EXECUTANTE	ECKO CONSTRUTORA	DATA	16/05/2025
LOCAL DA OBRA	MUNICÍPIO DE SANTALUZ	NÚMERO DO DIÁRIO	53
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	366
		DIAS CORRIDOS	53
		SALDO DO PRAZO	313

DIA DA SEMANA	D	S	T	Q	Q	S	S
---------------	---	---	---	---	---	---	---



MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Gerente de Contrato		Ajudante	9	Caminhão Pipa	
Engenheiro de Produção		Armador	2	Retro Escavadeira	
Engenheiro Planejamento		Carpinteiro	2	Caminhão Basculante	
Técnico de segurança		Pedreiro	4	Caminhão Munck	
Auxiliar Administrativo		Encarregado	1	Caçamba	
Comprador		Vigilante		Compactador	
Topógrafo		Operador retro			
		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA		Pluviometria (mm)
Manhã		Manhã	PRATICÁVEL	Manhã		
Tarde		Tarde	PRATICÁVEL	Tarde		
Noite		Noite		Noite		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ATERRO MANUAL E COMPACTAÇÃO

ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA SAPATAS E VIGAS

ARMAÇÃO DE SAPATAS

COMENTÁRIOS



Assinatura Contratada

~~Assinatura Fiscalização de Campo/Supervisão~~

~~Franklin de J. Sena~~

EXECUTANTE	ECKO CONSTRUTORA	DATA	17/05/2025
LOCAL DA OBRA	MUNICIPIO DE SANTALUZ	NUMERO DO DIÁRIO	54
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	366
		DIAS CORRIDOS	54
		SALDO DO PRAZO	312
DIA DA SEMANA	D S T Q Q S S		



CONSTRUÇÃO DE 30 CASAS POPULARES PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187/2024

[illegible]

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NÃO HOUVE EXPEDIENTE

COMENTÁRIOS

Asignatura Contratada

Assinatura Fiscalização de Campo/Supervisão

Franklin de J. Sena



EXECUTANTE	ECKO CONSTRUTORA	DATA	18/05/2025
LOCAL DA OBRA	MUNICÍPIO DE SANTALUZ	NÚMERO DO DIÁRIO	55
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	306
		DIAS CORRIDOS	55
		SALDO DO PRAZO	311

DIA DA SEMANA	D	S	T	Q	Q	S	S
---------------	---	---	---	---	---	---	---



CONSTRUÇÃO DE 30 CASAS POPULARES PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187/2024

[illegible]

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA		Pluviometria (mm)
Manhã		Manhã		Manhã	IMPRATICÁVEL	
Tarde		Tarde		Tarde	IMPRATICÁVEL	
Noite		Noite		Noite		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NÃO HOUVE EXPEDIENTE

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Assinatura Fiscalização de Campo Supervisão

Franklin de J. Sena



EXECUTANTE	ECKO CONSTRUTORA	DATA	19/05/2025
LOCAL DA OBRA	MUNICIPIO DE SANTALUZ	NUMERO DO DIÁRIO	56
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	386
		DIAS CORRIDOS	56
		SALDO DO PRAZO	310
DIA DA SEMANA	D S T Q Q S S		

MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Gerente de Contrato		Ajudante	9	Caminhão Pipa	
Engenheiro de Produção		Armador	2	Retro Escavadeira	
Engenheiro Planejamento		Carpinteiro	2	Caminhão Basculante	
Técnico de segurança		Pedreiro	4	Caminhão Munck	
Auxiliar Administrativo		Encarregado	1	Caçamba	
Comprador		Vigilante		Compactador	
Topógrafo		Operador retro			
		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

CONDICÕES METEOROLÓGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA		Pluviometria (mm)
Manhã		Manhã	PRATICÁVEL	Manhã		
Tarde		Tarde	PRATICÁVEL	Tarde		
Noite		Noite		Noite		

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS

ATERRO MANUAL E COMPACTAÇÃO

ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA SAPATAS E VIGAS

ARMACÃO DE SAPATAS

ASSENTAMENTO DA ALVENARIA DE VEDAÇÃO

COMENTÁRIOS

Assinatura Controlada

Assinatura Fiscalização de Campo/Supervisão

Franklin de J. Sena



EXECUTANTE	ECKO CONSTRUTORA	DATA	20/05/2025
LOCAL DA OBRA	MUNICIPIO DE SANTALUZ	NUMERO DO DIÁRIO	57
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	398
		DIAS CORRIDOS	57
		SALDO DO PRAZO	309
DIA DA SEMANA	DI SI T Q Q S S		

DIA DA SEMANA		D	S	T	Q	Q	S	S	
---------------	--	---	---	---	---	---	---	---	--



MÃO DE OBRA

[illegible]

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

CONDICÕES METEOROLÓGICAS

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS						Pluviometria (mm)
SOL		NUBLADO		CHUVA		
Manhã		Manhã	PRATICAVEL	Manhã		
Tarde		Tarde	PRATICAVEL	Tarde		
Noite		Noite		Noite		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ATERRO MANUAL E COMPACTAÇÃO

ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA SAPATAS E VIGAS

ARMACÃO DE SAPATAS

ASSENTAMENTO DA ALVENARIA DE VEDACÃO

COMENTÁRIOS


Asignatura Contratada

Assinatura Fiscalização de Campo/Supervisão

Franklin de J. Sosa



EXECUTANTE	ECKO CONSTRUTORA	DATA	21/05/2025
LOCAL DA OBRA	MUNICIPIO DE SANTALUZ	NUMERO DO DIÁRIO	58
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	356
		DIAS CORRIDOS	58
		SALDO DO PRAZO	308
DIA DA SEMANA	D S T Q Q S S		



MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Gerente de Contrato		Ajudante	9	Caminhão Pipa	
Engenheiro de Produção		Armador	2	Retro Escavadeira	
Engenheiro Planejamento		Carpinteiro	2	Caminhão Basculante	
Técnico de segurança		Pedreiro	4	Caminhão Munck	
Auxiliar Administrativo		Encarregado	1	Caçamba	
Comprador		Vigilante		Compactador	
Topógrafo		Operador retro			
		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT.	EMPRESA	QUANT.

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA		Pluviometria (mm)
Manhã	PRATICÁVEL	Manhã		Manhã		
Tarde	PRATICÁVEL	Tarde		Tarde		
Noite		Noite		Noite		

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS

ATERRO MANUAL E COMPACTAÇÃO

ASSENTAMENTO DA ALVENARIA DE VEDACÃO

ASSENTAMENTO DE CONTRAVERGA

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Assinatura Fiscalização 13/5/2018



DIA DA SEMANA		D	S	T	Q	Q	S	S
---------------	--	---	---	---	---	---	---	---



MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Gerente de Contrato		Ajudante	9	Caminhão Pipa	
Engenheiro de Produção		Armador	2	Retro Escavadeira	
Engenheiro Planejamento		Carpinteiro	2	Caminhão Basculante	
Técnico de segurança		Pedreiro	4	Caminhão Munck	
Auxiliar Administrativo		Encarregado	1	Caçamba	
Comprador		Vigilante		Compactador	
Topógrafo		Operador retro			

[illegible][illegible]

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

CONDICÕES METEOROLÓGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA		Pluviometria (mm)
Manhã	PRATICÁVEL	Manhã		Manhã		
Tarde	PRATICÁVEL	Tarde		Tarde		
Noite		Noite		Noite		

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCRETAGEM DE VIGAS E PILARES

ASSENTAMENTO DA ALVENARIA DE VEDACÃO

ASSENTAMENTO DE CONTRAVERGA

COMENTÁRIOS



Assimilació Contralada

Assinatura Fiscalização do Contrato Supervisada

EXECUTANTE	ECKO CONSTRUTORA	DATA	23/05/2025
LOCAL DA OBRA	MUNICIPIO DE SANTALUZ	NÚMERO DO DIÁRIO	60
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	366
		DIAS CORRIDOS	80
		SALDO DO PRAZO	306
DIA DA SEMANA	D S T Q Q S S		

									
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CONSTRUÇÃO DE 30 CASAS POPULARES PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187/2024

[illegible]

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA		Pluviometria (mm)
Manhã		Manhã	PRATICÁVEL	Manhã		
Tarde		Tarde	PRATICÁVEL	Tarde		
Noite		Noite		Noite		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCRETAGEM DE VIGAS E PILARES

ASSENTAMENTO DA ALVENARIA DE VEDAÇÃO

ASSENTAMENTO DE CONTRAVERGA

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Assinatura Fiscalização de Campo/Supervisão

Francisco de
Campeiro C

[illegible]



Assinatura Fiscalização de Campo/Supervisão:

Franklin de Lencina

EXECUTANTE	ECKO CONSTRUTORA	DATA:	25/05/2025
LOCAL DA OBRA	MUNICÍPIO DE SANTALUZ	NÚMERO DO DIÁRIO	62
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	366
		DIAS CORRIDOS	62
		SALDO DO PRAZO	304
DIA DA SEMANA	D S T Q Q S S		

					
---	---	---	---	---	---

MÃO DE OBRA

[illegible]

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA		Pluviometria (mm)
Manhã		Manhã	PRATICÁVEL	Manhã		
Tarde		Tarde	PRATICÁVEL	Tarde		
Noite		Noite		Noite		

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS

NÃO HOUVE EXPEDIENTE

COMENTÁRIOS

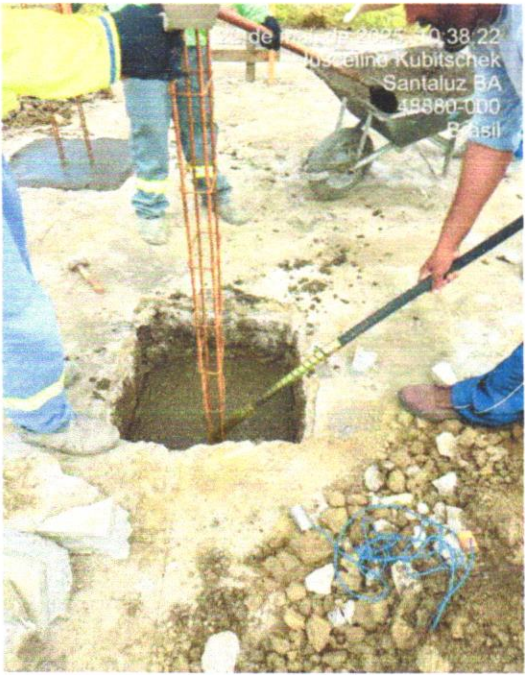
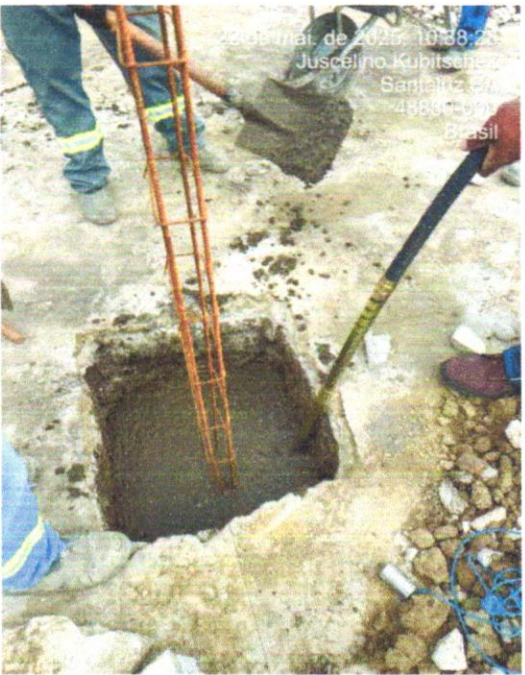
Assinatura Contratada

Assinatura Fiscalização de Campo/Supervisão

Franklin de J. Sosa
Arheiro Ct
Crown Pt, OGDEN, N.J.



[illegible]

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA.		
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187/2024		
	PERÍODO: 01/05/2025 À 26/05/2025		
	ECKO CONSTRUTORA		
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 02			
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA		ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA	
			
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA		ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA	
			

Franklin de J. Sena

Marcelo Almeida da Silva
Eng. Civil
CREA - BA Nº 43.505-D
Inscrição nº 0500875889



	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA.		
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187/2024		
	PERÍODO: 01/05/2025 À 26/05/2025 ECKO CONSTRUTORA		

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 02

ALVENARIA DE EMBASAMENTO



ALVENARIA DE EMBASAMENTO



ALVENARIA DE EMBASAMENTO



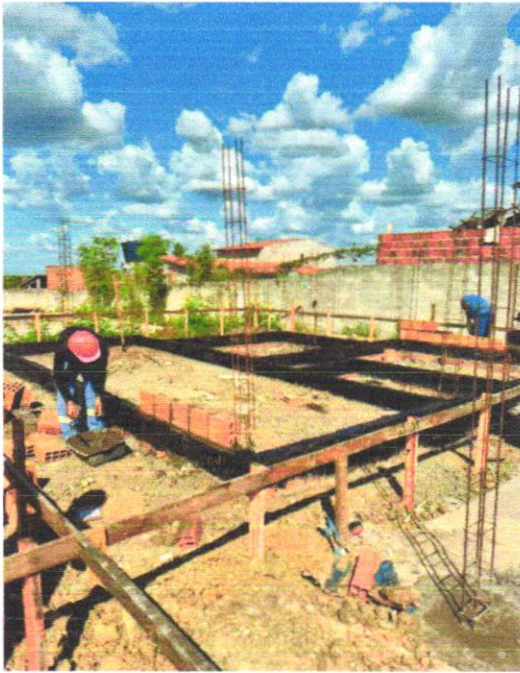
ALVENARIA DE EMBASAMENTO





Franklin de J. Silva
 Eng. Civil
 CREA/BA Nº 43.505-D
 Inscrição nº 0500878899

Marcelo Vilela da Silva
 Eng. Civil
 CREA/BA Nº 43.505-D
 Inscrição nº 0500878899



	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA.		
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187/2024		
	PERÍODO: 01/05/2025 À 26/05/2025 ECKO CONSTRUTORA		
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 02			
IMPERMEABILIZAÇÃO DA BALDRAME		IMPERMEABILIZAÇÃO DA BALDRAME	
			
IMPERMEABILIZAÇÃO DA BALDRAME		IMPERMEABILIZAÇÃO DA BALDRAME	
			

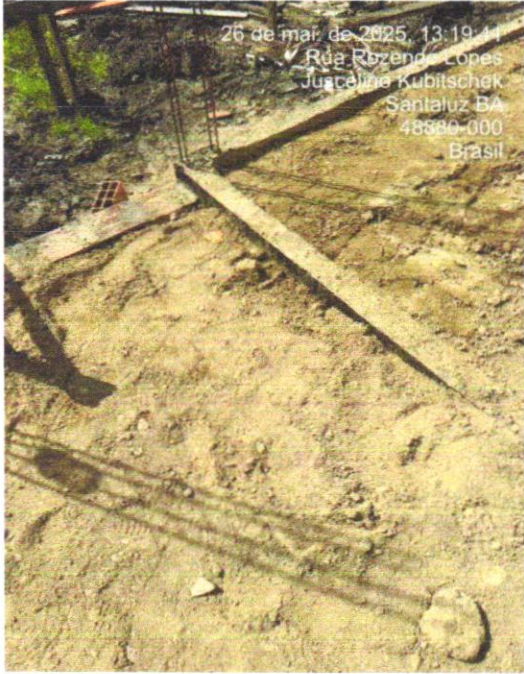
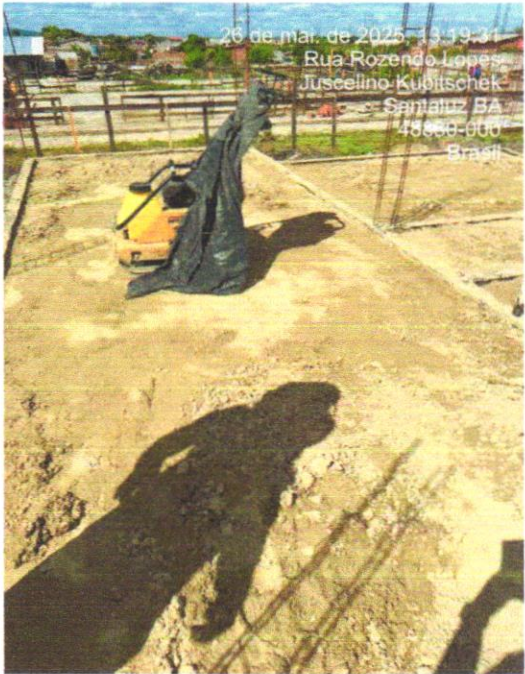
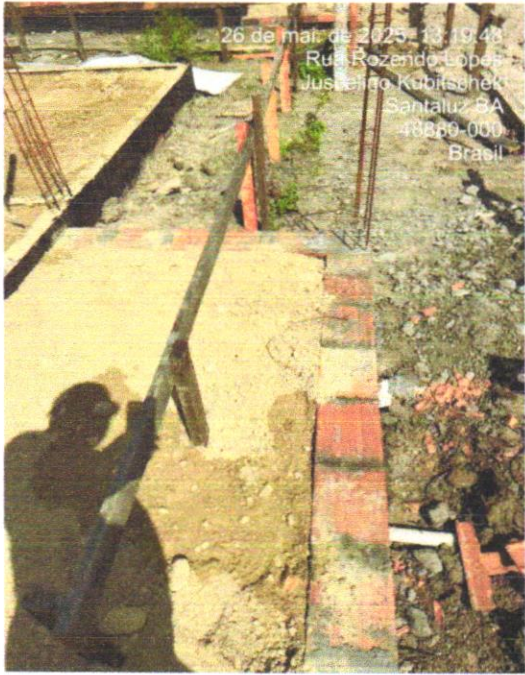

Franklin de Jesus
 Engº Civil
 CREA/BA Nº 43.505-D
 Registro nº 0500878889


Marcelo Vicente da Silva
 Engº Civil
 CREA/BA Nº 43.505-D
 Registro nº 0500878889



	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA.		
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187/2024		
	PERÍODO: 01/05/2025 À 26/05/2025		
	ECKO CONSTRUTORA		

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 02

ATERRO MANUAL E COMPACTAÇÃO  26 de mar. de 2025, 13:19:41 Rua Rozendo Lopes Juscelino Kubitschek Santaluz BA 48880-000 Brasil	ATERRO MANUAL E COMPACTAÇÃO  26 de mar. de 2025, 13:19:31 Rua Rozendo Lopes Juscelino Kubitschek Santaluz BA 48880-000 Brasil
ATERRO MANUAL E COMPACTAÇÃO  26 de mar. de 2025, 13:19:48 Rua Rozendo Lopes Juscelino Kubitschek Santaluz BA 48880-000 Brasil	ATERRO MANUAL E COMPACTAÇÃO  26 de mar. de 2025, 13:20:37 Rua Rozendo Lopes Juscelino Kubitschek Santaluz BA 48880-000 Brasil



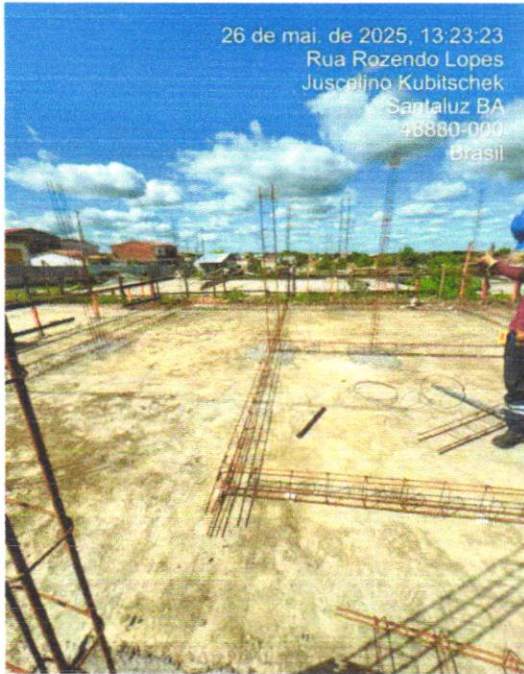
Franklin de J. Pena

Marcelo Vicente da Silva
Eng. Civil
CREA - BA Nº 43.505-D
Inscrição Nº 0500878889

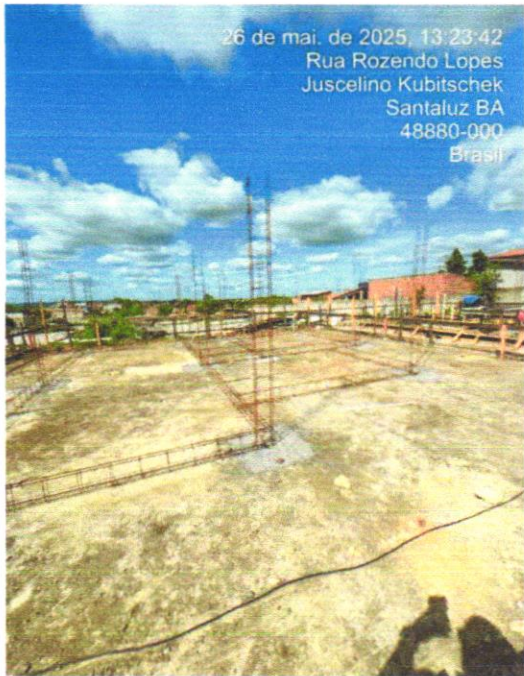
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA.		
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187/2024		
	PERÍODO: 01/05/2025 À 26/05/2025		
	ECKO CONSTRUTORA		

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 02

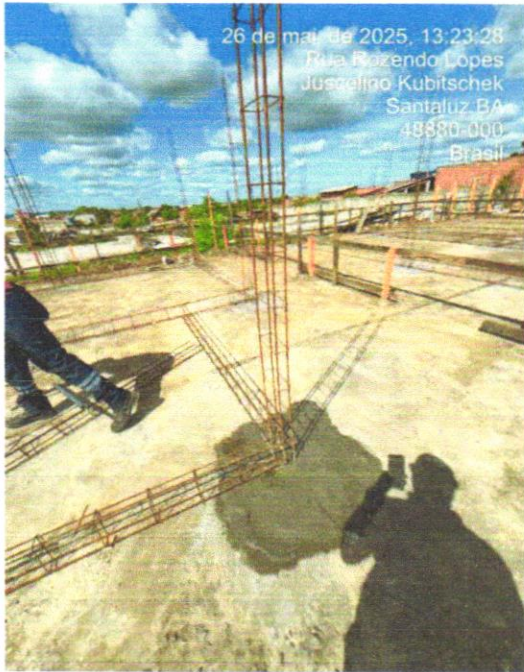
AMARRAÇÃO DE VIGAS E PILARES



AMARRAÇÃO DE VIGAS E PILARES



AMARRAÇÃO DE VIGAS E PILARES



AMARRAÇÃO DE VIGAS E PILARES

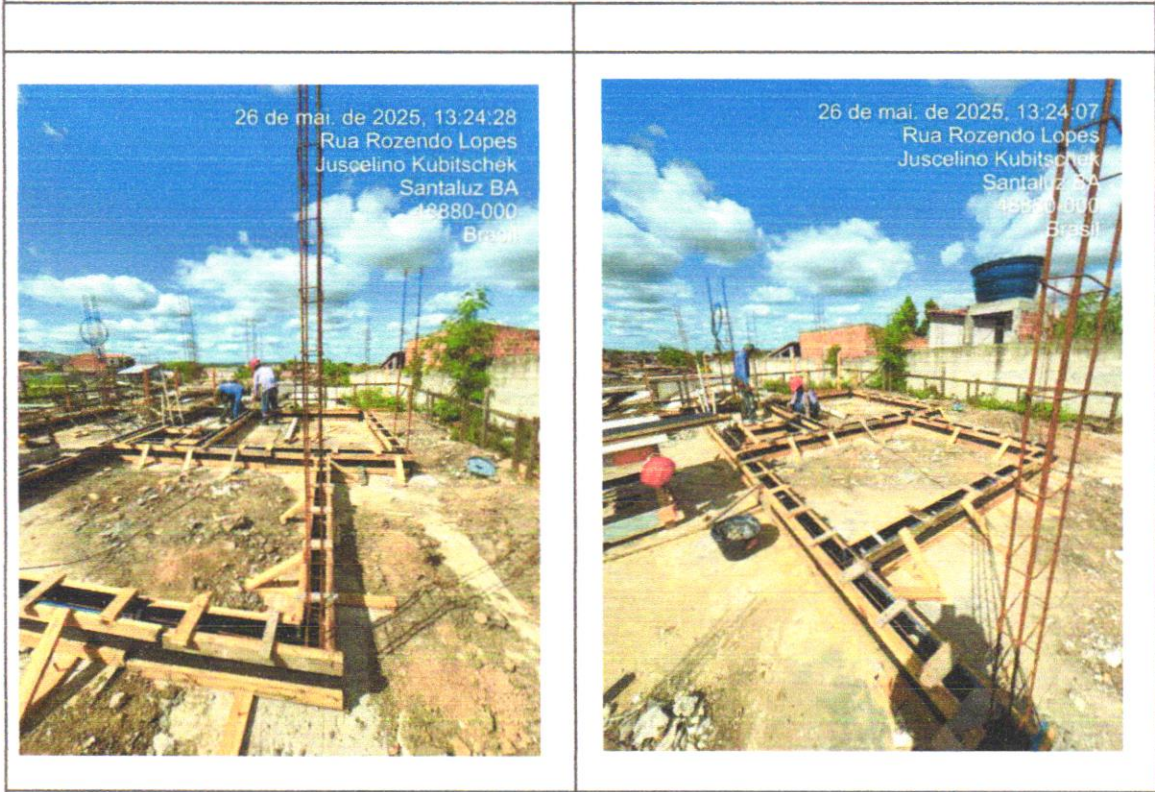


Franklin de J. Silva
 Engº Civil
 CREA / BA Nº 43.505-D
 Registro nº 0500878889

Marcelo Vicente da Silva
 Engº Civil
 CREA / BA Nº 43.505-D
 Registro nº 0500878889

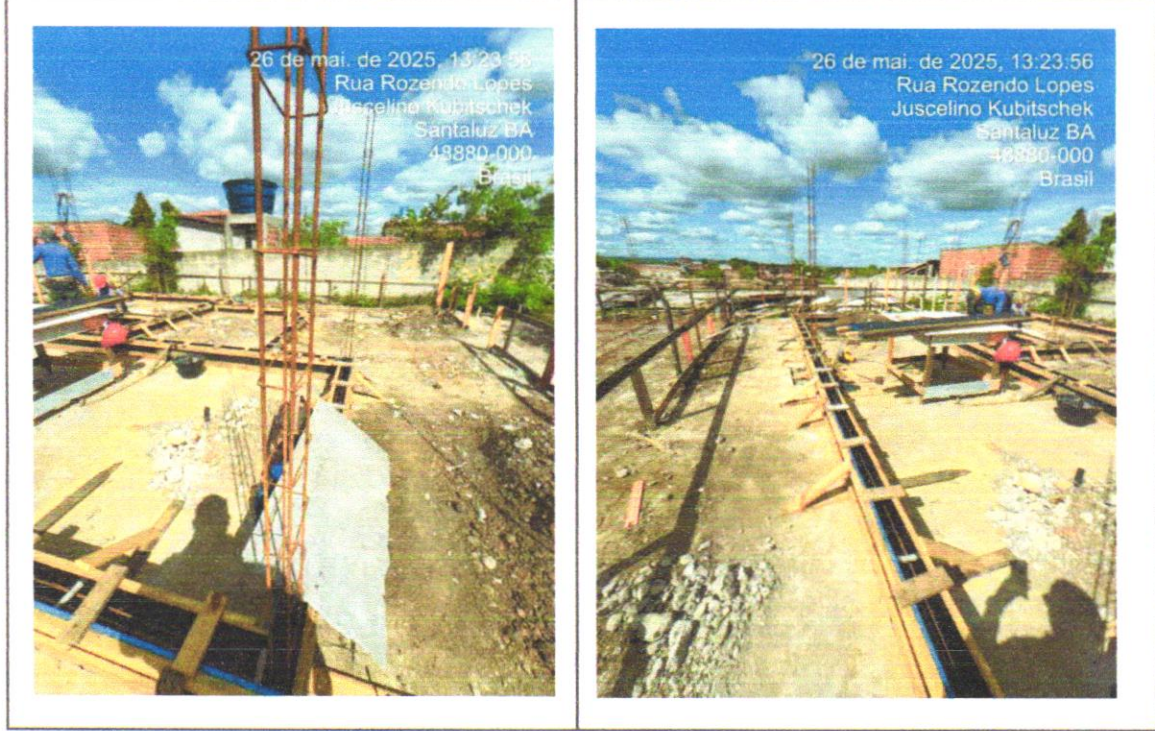
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	
	OBJETO:CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA.	
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187/2024	
	PERÍODO: 01/05/2025 À 26/05/2025 ECKO CONSTRUTORA	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 02



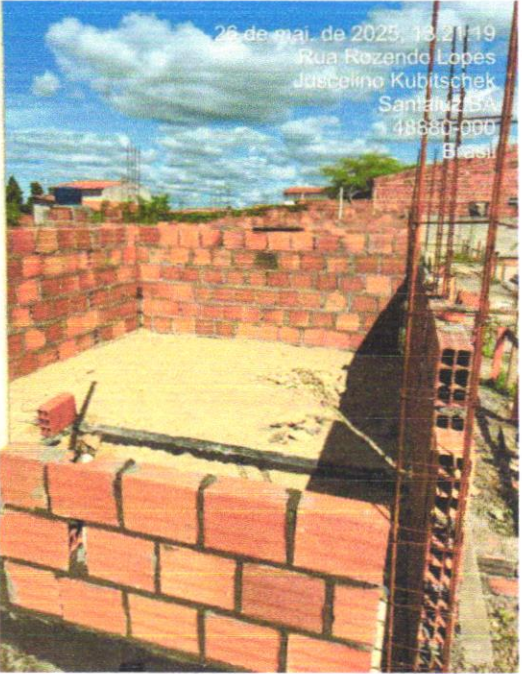
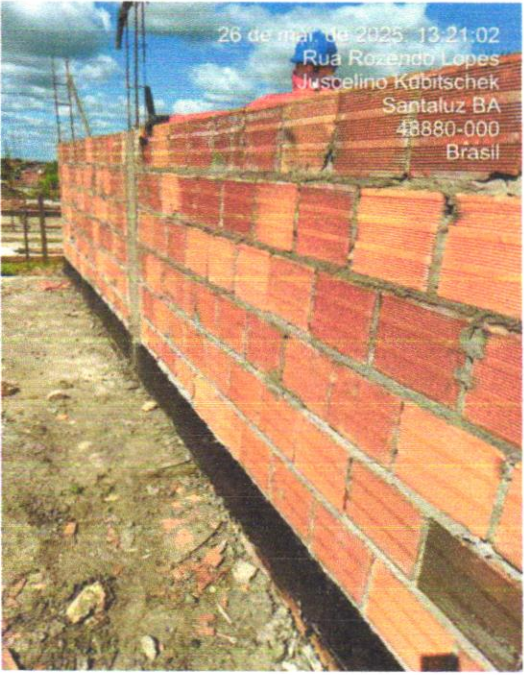
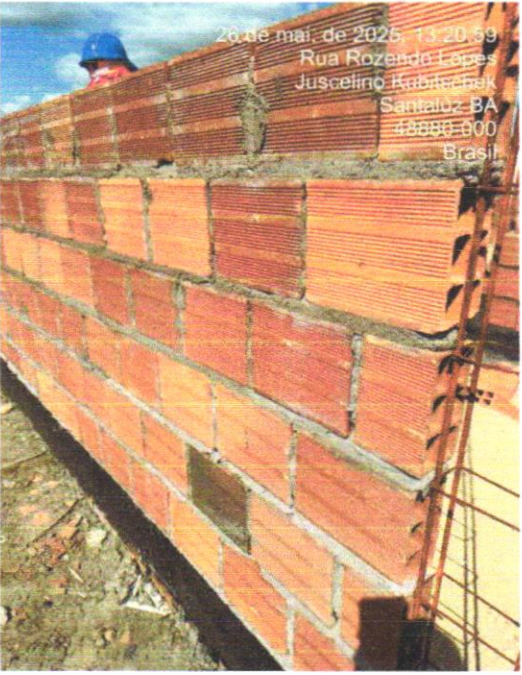
AMARRAÇÃO DE VIGAS E PILARES

AMARRAÇÃO DE VIGAS E PILARES



Franklin de J. Silva
[Signature]

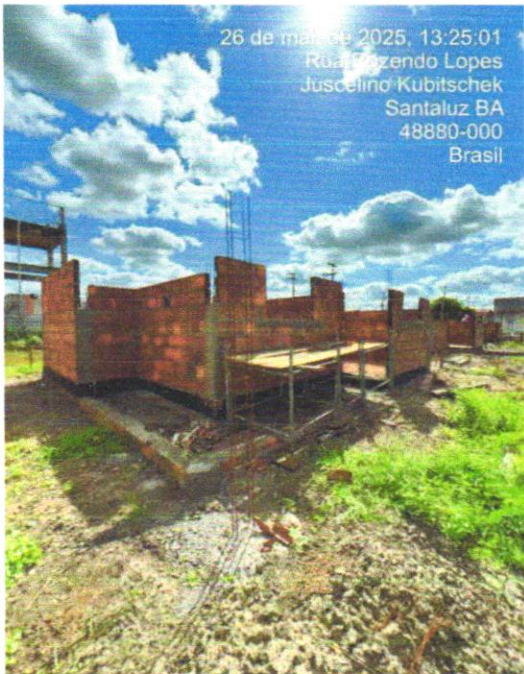
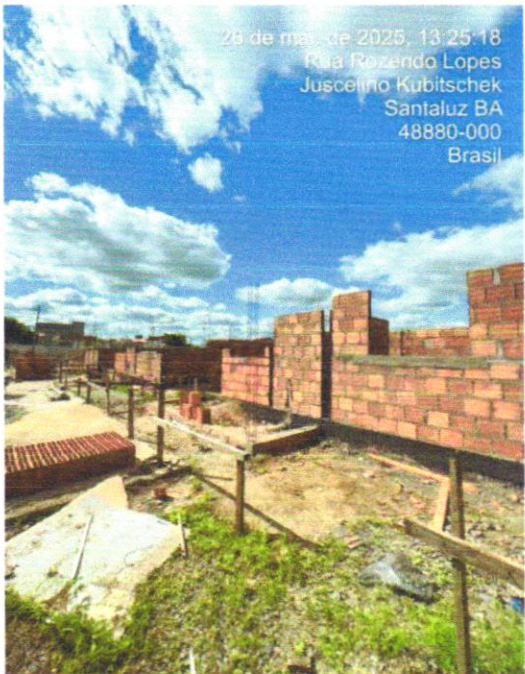
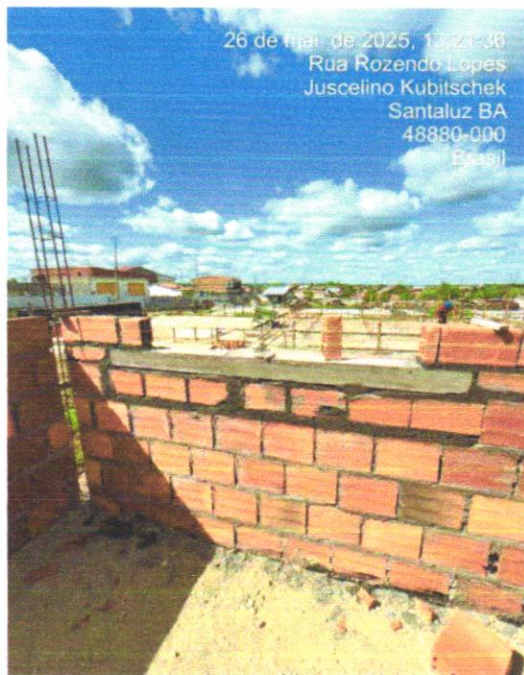
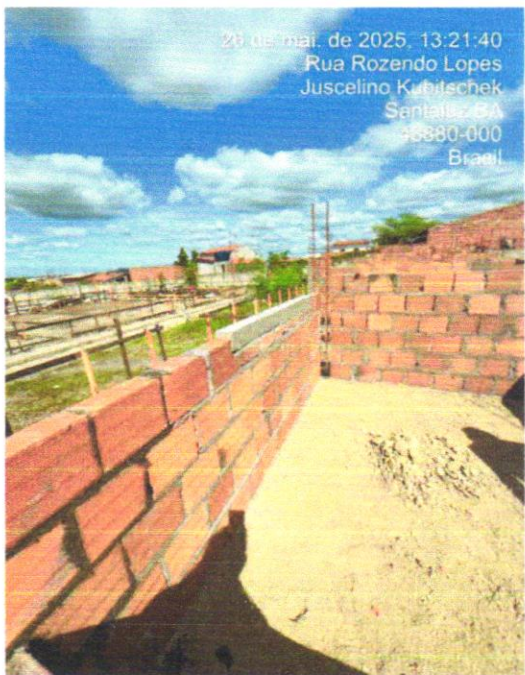
Marcelo Vicente da Silva
Eng. Civil
CREA/BA Nº 43.505-D
Inscrição nº 0500878899

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA.		
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187/2024		
	PERÍODO: 01/05/2025 À 26/05/2025		
	ECKO CONSTRUTORA		
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 02			
ALVERNARIA DE VEDAÇÃO		ALVERNARIA DE VEDAÇÃO	
		 26 de mai. de 2025, 13:21:19 Rua Rozendo Lopes Juscelino Kubitschek Santaluz BA 48880-000 Brasil	
ALVERNARIA DE VEDAÇÃO		ALVERNARIA DE VEDAÇÃO	
 26 de mai. de 2025, 13:21:02 Rua Rozendo Lopes Juscelino Kubitschek Santaluz BA 48880-000 Brasil		 26 de mai. de 2025, 13:20:59 Rua Rozendo Lopes Juscelino Kubitschek Santaluz BA 48880-000 Brasil	



Franklin de J. Sena

Marcelo Almeida da Silva
Eng. Civil
CREA - BA Nº 43.505-D
Inscrição nº 0500878889

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA.		
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187/2024		
	PERÍODO: 01/05/2025 À 26/05/2025		
	ECKO CONSTRUTORA		
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 02			
ALVERNARIA DE VEDAÇÃO		ALVERNARIA DE VEDAÇÃO	
			
INSTALAÇÃO DE CONTRAVERGA		INSTALAÇÃO DE CONTRAVERGA	
			



Franklin de J. Soga
 Engenheiro Civil

Marcelo Vinícius da Silva
 Engº Civil
 CREA/BA Nº 43.505-D
 Matrícula nº 0500678899
