



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: - - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 077/2025

EMPENHO: 83 / 2026

Nº SUB-EMPENHO: 111

Data do Sub-Empenho: 10/02/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 6641 - PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereço: RUA MARQUES DE CARAVELAS, 000527
Bairro: BARRA
CNPJ: 46.288.407/0001-67 Insc. Estadual:
Conta Corrente: 0405500-4 Agência: 3231
Tipo PIX: Nº PIX:

Tipo Pessoa: Jurídica
Complemento: EDIF LEINAD LOJA 04
Estado:
Cidade:
CPF:
RG:
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1002.4451.1542 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data do Empenho: 10/02/2026

Unidade: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 004 - EDUCALUZ
Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: (Lei 14133/21) Concorrência	Nº Lic.: 002-2025CE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 1035-2025	956.017,81	100.500,00	855.517,81
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PEDRO DO VALE IRMÃO, COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA. CONFORME CONTRATO Nº1035/2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº002/2025. OBRA Nº 054/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 15/01/2026 À 31/01/2026. NFS-e: 104.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
100.500,00	100.446,94	53,06

Data do Empenho: 10/02/2026

Data do Liquidação: 10/02/2026

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.009	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1542 INSS	1.757,82
2.1.8.8.1.01.08.00.00.009	ISS - Fonte 1542	2.511,17
Valor Retido		4.268,99
## Noventa e seis mil e cento e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos ##		Valor Líquido 96.177,95

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	10/02/2026	104	U			100.446,94
Quantidade: 1					Total:	100.446,94

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	100.446,94

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 10/02/2026.

MARLI NUNES LIMA
Secretária de Educação
CPF: 930.248.435-15

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 10/02/2026, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408

4164141

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 11/02/2026
CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FILHO
CONTROLADOR INTERNO
PORTARIA 012/2026

SAPIC-





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.

Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 10/02/2026

A empresa:

PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA; CNPJ: 46.288.407/0001-67.

Endereço:

Rua Marquês de caravelas 000527, EDIF: LEINAD; LOJA: 04 – BARRA – Salvador - CEP 40140-241 - BA

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO	
FONTE DE PAGAMENTO:	
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	
AÇÃO:	
FUNDEB	
HISTÓRICO:	
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PEDRO DO VALE IRMÃO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA.	
Processo Licitatório: Concorrência eletrônica 002/2025	
Contrato: 1035/2025	
Processo administrativo: 077-2025	
Nº da obra: 054/2025	
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 00000104	
VALOR DA NOTA: R\$ 100.446,94	
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 15/01/2026 a 31/01/2026	
DOCUMENTOS EM ANEXO.	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM 04, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 12, DCTFWEB CP 12.	
CONTA: AGÊNCIA 3231 C/C: 0405500-4 BANCO BRADESCO	
Recurso - FUNDEB	

Atenciosamente,


Fiscal de contratos





PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador
Substitui a Nota Salvador emitida em 09/02/2026

Número da Nota:
00000104

Data e Hora de Emissão:
10/02/2026 10:43:19

Código de Verificação:
XILW-QHYJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
46.288.407/0001-67
Nome/Razão Social:
PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Endereço:
Rua Marquês de Caravelas 000627, EDIF:LEINAD;LOJA:04 - BARRA - Salvador - CEP: 40140-241 - BA
E-mail:

Inscrição Municipal:
00.876.697/001-05

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
MUNICÍPIO DE SANTALUZ
CPF/CNPJ:
13.807.870/0001-19
Endereço:
PRA CORONEL JOSE LEITAO 06, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 48880-000/BA
E-mail:

Inscrição Municipal

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PEDRO DO VALE IRMÃO NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA.
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2025
CONTRATO N. 1035/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 04 - PERÍODO 15/01/2026 A 31/01/2026

VALOR TOTAL: R\$100.446,94

VL MÃO DE OBRA 50%: R\$50.223,47
VALOR DE MATERIAL 50%: R\$50.223,47
BASE DE CALCULO DE INSS: R\$50.223,47 x 3,5% : R\$1.757,82
BASE DE CALCULO DE ISS: R\$50.223,47 x 2,50% : R\$1.255,59

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$100.446,94

CNAE						
4120400 - Construção de edifícios						
Item da Lista de Serviços:						
00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...						
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Nota Salvador (R\$)	
50.223,47	50.223,47		2,50%	1.255,59	0,00	
Valor INSS (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor IR (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.757,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,59	97.433,53
Alíquota IBS (%)	Valor IBS (R\$)		Alíquota CBS (%)	Valor CBS (R\$)		
*	*		*	*		

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santaluz-BA.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- Esta Nota Salvador substitui a Nota Salvador Nº 103.
- COMPETÊNCIA: 02/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/61 - Construção de edificações residenciais de qualquer tipo (Por Administração)

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
☐ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
☐ A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM 10/02/26

Franklin de I. Sora





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 616123	CONTRIBUINTE 59005 - PDN SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	INSCRIÇÃO:
TIPO / NOME LOGRADOURO: MARQUES DE CARAVELAS		NUMERO: 527
COMPLEMENTO: EDF. LEINAD - LJ. 04	BAIRRO: BARRA	MUNICÍPIO: SALVADOR
UF: BA		
DOCUMENTOS		
C.N.P.J. / CPF: 46.288.407/0001-67	R.G.:	ORGÃO
TOMADOR		
CONTRIBUINTE TOMADOR: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		C.N.P.J. / CPF: 30.731.257/0001-84
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Cálculo: 50.223,47	Aliquota (%): 5,000	Valor R\$: 2.511,17
Taxa Expediente R\$:		Valor Total R\$: 2.511,17
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 10/02/2026	MÊS REFERÊNCIA: Fevereiro	EXERCÍCIO: 2026
DATA EMISSÃO: 10/02/2026 02:40:05		DATA DE VENCIMENTO: 10/03/2026
INSTRUÇÕES: NF-e Nº 104 - DATA DE EMISSÃO: 10-02-2026		(=) VALOR DEVIDO - R\$ 2.511,17
		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
		(+) MULTA DE MORA - R\$
		(+) JUROS DE MORA - R\$
		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 2.511,17



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81710000025 . 3

11173906202 . 9

60310010500 . 7

00061612312 . 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81710000025 . 3

11173906202 . 9

60310010500 . 7

00061612312 . 1

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Fevereiro	Nº DAM: 616123	EXERCÍCIO: 2026	DATA: 10/02/2026 02:40:05	DATA VENCIMENTO: 10/03/2026
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.511,17
PDN SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.511,17



Obra: B.D.I.
SINAPI - 01/2025 - 24,67%
Banco: B.D.I.
Baixa: B.D.I.
SBC - 01/2025 -
Baixa: B.D.I.
CNPJ: 01/2025 -

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PEDRO DO VALE IRMÃO, COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA

CONTRATO: Início da Obra : 16/09/2025 054/2025
Processo ADM: Nº da O.S:
1035-2025 077/2025

PERÍODO: 15/01/2026 A 31/01/2026
Medição do Período:

Orçamento Sintético															
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com Imp.	Total	Peso (%)	MEDIÇÃO 04		ACUMULADO		SALDO	%		
								QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL				
1		ESCOLA PEDRO DO VALE IRMÃO		1	4.014.887,68	4.014.887,68	100,00 %								
1.1		SERVIÇOS INICIAIS		1	170.008,23	170.008,23	4,23 %								
1.1.1	103688	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022, PS		6	360,89	2.345,34	0,06 %	0,00	R\$	-	6,00	2345,34	R\$	0%	
1.1.2	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1	1.256,03	1.256,03	0,03 %	0,00	R\$	-	1,00	1256,03	R\$	0%	
1.1.3	73960/001	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO PISCINA OBRA, M3-CHAVE 100A, CARGA 30kW, 20CV EXCL. FORN. MEDIDOR	UN	1	2.166,26	2.166,26	0,05 %	0,00	R\$	-	1,00	2166,26	R\$	0%	
1.1.4	73960/001	BARRACÃO DE OBRA PARA ALMOXARFAGEM/ESTRUTURA, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCEMENTO 6MM, INCLUSO EM COBERTURA DE MADEIRA, REAPROVEITADO 5 Vezes	m²	16	516,98	8.271,68	0,21 %	0,00	R\$	-	16,00	8271,68	R\$	0%	
1.1.5	C1630	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS, REAPROVEITADO 5 Vezes	m²	1731	6,05	11.511,15	0,29 %	0,00	R\$	-	1731,00	11511,15	R\$	0%	
1.1.6	96459	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	80,4	87,09	7.002,03	0,17 %	0,00	R\$	-	80,40	7002,03	R\$	0%	
1.1.7	97622	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF. 03/2024	m²	68,91	55,95	3.855,51	0,10 %	31,11	R\$	1.740,60	68,91	3855,51	R\$	0%	
		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 08/2023												0%	
1.1.8	100681	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE JUNTA DE 1,30 M. AF. 07/2020	m³	68,91	10,50	723,55	0,02 %	18,51	R\$	194,35	68,91	723,55	R\$	0%	
1.1.9	72224	DEMOLIÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	m²	614	12,61	7.742,54	0,19 %	614,00	R\$	7.742,54	614,00	7742,54	R\$	0%	
1.1.10	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMAMANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	m²	614	7,64	4.690,96	0,12 %	614,00	R\$	4.690,96	614,00	4690,96	R\$	0%	
1.1.11	97652	REMOÇÃO DE TESSOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	UN	15	188,20	2.823,00	0,07 %	15,00	R\$	2.823,00	15,00	2823,00	R\$	0%	
1.1.12	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	m²	597,36	196,90	117.620,18	2,93 %	97,99	R\$	19.294,78	183,66	32224,54	R\$	73%	
1.2		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1	250.662,16	250.662,16	6,24 %		R\$	-	0,00				
1.2.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	704	150,78	106.149,12	2,64 %	86,00	R\$	13.268,64	244,38	36847,98	R\$	65%	
1.2.2	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1408	59,14	83.269,12	2,07 %	144,00	R\$	8.516,16	405,37	23973,65	R\$	71%	
1.2.3	90778	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1408	43,49	61.233,92	1,53 %	144,00	R\$	6.262,56	404,12	17575,14	R\$	71%	
1.3		MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES		1	88.324,60	88.324,60	2,20 %		R\$	-	0,00				
1.3.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 01/2024	m³	14,86	101,73	1.511,70	0,04 %	3,96	R\$	404,88	14,86	1511,70	R\$	0%	
1.3.2	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 01/2024	m³	107,77	92,51	9.969,80	0,25 %	7,63	R\$	705,85	107,77	9969,80	R\$	0%	
1.3.3	C0328	ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS, AF. 01/2024	m³	519,3	120,31	62.476,98	1,56 %	0,00	R\$	-	519,30	62476,98	R\$	0%	
1.3.4	10016	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m	49,5	150,22	7.435,99	0,19 %	0,00	R\$	-	49,50	7435,99	R\$	0%	
1.3.5	6879	Sondagem a percussão	Un	1	5.828,48	5.828,48	0,15 %	0,00	R\$	-	1,00	5828,48	R\$	0%	
		Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos - sondagem a percussão - dnt maior que 100 Km de Aracaju												0%	
1.3.6	C2637	RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM	UN	1	1.101,75	1.101,75	0,03 %	0,00	R\$	-	1,00	1101,75	R\$	0%	
1.4		INFRAESTRUTURA		1	128.090,73	128.090,73	3,19 %		R\$	-	0,00			0%	
1.4.1	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPa, AF. 11/2022	m³	48,95	2.367,94	115.185,36	2,87 %	4,89	R\$	11.540,96	48,85	115185,36	R\$	0%	
1.4.2	96857	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 20MMAOS, AF. 08/2023	m²	247,75	45,20	11.188,50	0,28 %	69,94	R\$	3.181,13	247,75	11198,30	R\$	0,00	
1.4.3	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM, AF. 01/2024	m²	40,5	42,15	1.707,07	0,04 %	10,02	R\$	422,34	40,50	1707,07	R\$	0%	
1.5		SUPERESTRUTURA		1	197.091,27	197.091,27	4,91 %		R\$	-	0,00			0%	
1.5.1		SUPERESTRUTURA		1	162.657,31	162.657,31	4,05 %		R\$	-	0,00			0%	
1.5.1.1	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPa, AF. 11/2022	m³	53,81	2.367,94	126.880,75	3,16 %		R\$	-	5,38	12.688,08	R\$	114.192,68	90%
1.5.1.2	7823	Leito pré-fabricado trapezoidal para piso ou cobertura, interaxe 38cm, h=16cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escomento em madeira e capsaimento 4cm.	m²	146	222,41	32.471,96	0,81 %		R\$	-	0,00	0,00	R\$	32.471,96	100%
1.5.1.3	10012	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4,2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gardau ou similar	m²	146	21,95	3.204,70	0,08 %	0,00	R\$	-	0,00	0,00	R\$	3.204,70	100%

Daniel Pinheiro de Moraes
Representante Legal
Eng. Civil - CREA/BA 051523692

Daniel Pinheiro Moraes
CREA-BA 051523692
PDN SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 46.268.107/0001-67

Rua Marquês de Caravellas, 000537 - Edif. Lantid, IpaçOA, Barra Salvador, BA, CEP 407-40241

Franklin de Jesus

Visto

1.5.2		SINAPI	RESERVATÓRIO ENTERRADO	1	34.533,96	34.533,96	0,86 %	R\$	0,00	0,00	0,00	0%
1.5.2.1	92267		FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	48,8	40,35	1.888,38	0,05 %	0,00	46,80	1.888,38	R\$	0%
1.5.2.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇÃO 12,3,2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COMBETONEIRA 400 L. AF_05/2021	5	515,51	2.577,55	0,06 %	R\$	5,00	2.577,55	R\$	0%
1.5.2.3	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	143,4	15,99	2.292,96	0,06 %	R\$	143,40	2.292,96	R\$	0%
1.5.2.4	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	204,1	14,17	2.892,09	0,07 %	R\$	204,10	2.892,09	R\$	0%
1.5.2.5	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	180,4	12,49	2.253,19	0,06 %	R\$	180,40	2.253,19	R\$	0%
1.5.2.6	96523	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	244,62	92,51	22.629,79	0,56 %	R\$	244,62	22.629,79	R\$	0%
1.6			ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS. AF_01/2024	244,62	92,51	22.629,79	0,56 %	R\$	244,62	22.629,79	R\$	0%
1.6.1	103328	SINAPI	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	1561,94	90,47	141.308,71	3,52 %	R\$	37,18	3.363,67	R\$	91%
1.6.2	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024	52,2	27,58	1.460,55	0,04 %	R\$	0,00	0,00	R\$	100%
1.6.3	93191	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024	97	64,91	6.296,27	0,16 %	R\$	0,00	0,00	R\$	100%
1.6.4	93199	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024	97	47,06	4.564,82	0,11 %	R\$	0,00	0,00	R\$	100%
1.6.5	2375	ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ av de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cristas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrófuga ou similar	14,84	357,22	5.301,14	0,13 %	R\$	0,00	0,00	R\$	100%
1.6.6	8637	ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	226,99	50,46	11.453,91	0,29 %	R\$	0,00	0,00	R\$	100%
1.6.7	13779	ORSE	Cercal/gradi Nytor f=2,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliéster por processo de pintura eletrolítica nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação, inclusive poste e acessórios.	80,4	574,94	46.225,17	1,15 %	R\$	0,00	0,00	R\$	100%
1.7			COBERTURA	1	738.923,62	738.923,62	18,41 %	R\$	0,00	0,00	R\$	0%
1.7.1			COBERTURA - ESTRUTURA METÁLICA E TELHAMENTO	1	682.556,32	682.556,32	15,50 %	R\$	0,00	0,00	R\$	0%
1.7.1.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	1059,07	188,36	199.486,42	4,97 %	R\$	0,00	0,00	R\$	100%
1.7.1.2	12398	ORSE	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC75, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto torn. Telhas - Executada - R3	1057,07	406,97	430.195,77	10,72 %	R\$	0,00	0,00	R\$	100%
1.7.1.3	100327	SINAPI	RUIFO EXTERNO INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	217,12	52,36	11.368,40	0,28 %	R\$	0,00	0,00	R\$	100%
1.7.1.4	94228	SINAPI	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	116,22	77,85	9.047,72	0,23 %	R\$	0,00	0,00	R\$	100%
1.7.1.5	94227	SINAPI	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	42,3	57,29	2.423,36	0,06 %	R\$	0,00	0,00	R\$	100%
1.7.1.6	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	83,3	79,80	6.630,68	0,17 %	R\$	0,00	0,00	R\$	100%
1.7.1.7	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	83,3	40,87	3.404,47	0,08 %	R\$	0,00	0,00	R\$	100%
1.7.2			ACABAMENTOS EM ACM	1	55.698,31	55.698,31	1,39 %	R\$	0,00	0,00	R\$	0%
1.7.2.1	5057	ORSE	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	117,9	472,42	55.698,31	1,39 %	R\$	0,00	0,00	R\$	100%
1.7.3			ÁGUA PLUVIAL	1	20.688,49	20.688,49	0,51 %	R\$	0,00	0,00	R\$	0%
1.7.3.1	104166	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_09/2022	286,9	58,45	16.944,65	0,42 %	R\$	0,00	0,00	R\$	100%
1.7.3.2	98263	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLÓS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60 MPARA REDE DE CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLÓS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40X0,40 MPARA REDE DE	6	529,31	3.175,86	0,08 %	R\$	0,00	0,00	R\$	100%
1.7.3.3	98261	SINAPI	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - PAREDES	2	273,99	547,98	0,01 %	R\$	0,00	0,00	R\$	100%
1.8			REVESTIMENTO INTERNO - PAREDES	1	302.427,14	302.427,14	7,53 %	R\$	0,00	0,00	R\$	0%
1.8.1				1	264.390,51	264.390,51	6,59 %	R\$	0,00	0,00	R\$	0%

Daniel Pinheiro Moraes
 CREA-BA 0515236942
 PDN SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA
 CNPJ: 46.288.707/0001-67

Franklin de Sousa



1.8.1.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	m²	2027,92	4,55	9.227,03	0,23 %	134,28	R\$	610,97	R\$	8.616,06	93%
1.8.1.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM. COM TALISCAS AF. 03/2024	m²	859,65	43,84	37.687,05	0,04 %	0,00	R\$	0,00	R\$	37.687,05	100%
1.8.1.3	87531	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM. COM TALISCAS AF. 03/2024	m²	1168,27	42,23	49.336,04	1,23 %	0,00	R\$	0,00	R\$	49.336,04	100%
1.8.1.4	C447	SEINFRA	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	m²	1120,25	130,55	146.248,63	3,64 %	0,00	R\$	0,00	R\$	146.248,63	100%
1.8.1.5	C442	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	m²	48,02	89,08	4.277,62	0,11 %	0,00	R\$	0,00	R\$	4.277,62	100%
1.8.1.6	101965	SINAPI	PRETÓRIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:8 COM ADITIVO. AF. 11/2020	M	82	94,37	7.738,34	0,19 %	0,00	R\$	0,00	R\$	7.738,34	100%
1.8.1.7	12444	ORSE	Divisão em granito branco semia. polido do dois lados, e= 2cm, inclusive montagem com	m²	12,6	783,00	9.865,80	0,25 %	0,00	R\$	0,00	R\$	9.865,80	100%
1.8.2			REVESTIMENTO EXTERNO - PAREDES		1	38.046,63	38.046,63	0,95 %	0,00	R\$	0,00	R\$	38.046,63	100%
1.8.2.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	m²	786,25	4,55	3.577,43	0,09 %	0,00	R\$	0,00	R\$	3.577,43	100%
1.8.2.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM. COM TALISCAS AF. 03/2024	m²	766,25	43,84	34.469,20	0,86 %	0,00	R\$	0,00	R\$	34.469,20	100%
1.9			REVESTIMENTO DE PISO		1	268.708,27	268.708,27	6,44 %	0,00	R\$	0,00	R\$	268.708,27	100%
1.9.1			REVESTIMENTO DE PISO - EXTERNO		1	216.312,66	216.312,66	5,36 %	0,00	R\$	0,00	R\$	216.312,66	100%
1.9.1.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF. 01/2024	m²	1180,08	38,19	45.067,25	1,12 %	0,00	R\$	0,00	R\$	45.067,25	100%
1.9.1.2	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESURA 3CM. AF. 07/2021	m²	1180,08	41,60	49.091,32	1,22 %	0,00	R\$	0,00	R\$	49.091,32	100%
1.9.1.3	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF. 09/2020	M	32,6	81,02	2.641,25	0,07 %	0,00	R\$	0,00	R\$	2.641,25	100%
1.9.1.4	C3007	SEINFRA	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	m²	188,15	122,98	23.138,68	0,58 %	0,00	R\$	0,00	R\$	23.138,68	100%
1.9.1.5	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MÁRMORE OU GRANITO EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF. 06/2022	m²	991,93	96,15	95.374,06	2,38 %	0,00	R\$	0,00	R\$	95.374,06	100%
1.9.2			REVESTIMENTO DE PISO - EXTERNO		1	43.395,71	43.395,71	1,08 %	0,00	R\$	0,00	R\$	43.395,71	100%
1.9.2.1	92386	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL, DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM AF. 10/2022	m²	485,11	75,96	37.608,55	0,94 %	0,00	R\$	0,00	R\$	37.608,55	100%
1.9.2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA). AF. 01/2024	M	49,9	37,12	1.852,28	0,05 %	0,00	R\$	0,00	R\$	1.852,28	100%
1.9.2.3	4864	ORSE	INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA AF. 01/2024	m²	12,48	145,47	1.815,46	0,05 %	0,00	R\$	0,00	R\$	1.815,46	100%
1.9.2.4	C3449	SEINFRA	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, pífideficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusiva regularização de base	M	82,5	25,99	2.119,42	0,05 %	0,00	R\$	0,00	R\$	2.119,42	100%
1.10			ESQUADRIAS		1	268.782,79	268.782,79	6,45 %	0,00	R\$	0,00	R\$	268.782,79	100%
1.10.1			ESQUADRIAS EM VIDRO LISO - JANELAS		1	61.054,12	61.054,12	1,52 %	0,00	R\$	0,00	R\$	61.054,12	100%
1.10.1.1	102166	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF. 01/2021, PS	m²	62,82	411,88	25.874,30	0,64 %	0,00	R\$	0,00	R\$	25.874,30	100%
1.10.1.2	94562	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATEANTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	m²	62,82	590,01	35.179,82	0,88 %	0,00	R\$	0,00	R\$	35.179,82	100%
1.10.2			ESQUADRIAS - PORTAS		1	65.372,29	65.372,29	1,38 %	0,00	R\$	0,00	R\$	65.372,29	100%
1.10.2.1	102169	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF. 01/2021, PS	m²	20,24	499,61	10.112,10	0,25 %	0,00	R\$	0,00	R\$	10.112,10	100%
1.10.2.2	12333	ORSE	Porta/Esquadria em alumínio, cor NUP/B, tipo moldura-vidro, inclusive cabalho vertical 5 x 10, maxi- ar fixo, dobradiças ou rodilões e fechadura, excludive vidro	m²	20,24	419,01	8.480,76	0,21 %	0,00	R\$	0,00	R\$	8.480,76	100%
1.10.2.3	13049	ORSE	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive cabalhos, dobradiças ou rodilões e fechadura	m²	4,32	559,35	2.416,39	0,06 %	0,00	R\$	0,00	R\$	2.416,39	100%
1.10.2.4	90846	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PRESADA OU SUPERPRESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -	UN	22	1.294,82	28.486,04	0,71 %	0,00	R\$	0,00	R\$	28.486,04	100%
1.10.2.5	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	4	982,84	3.931,36	0,10 %	0,00	R\$	0,00	R\$	3.931,36	100%

Daniel Pinheiro Moraes
 CREA-BA-0515236942 Eng Civil - CREA/BA 0515236942
 PDN SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA
 CNPJ: 46.283.437/0001-67

Franklin da Silva



1.10.2.6	90841	SINAPI	MAT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALUMÍNIO OU PVC.	UN	2	972,82	1.945,64	0,05 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	1.945,64	100%
1.10.3			ESQUADRIA PARA - FACHADA		1	142.356,38	142.356,38	3,65 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$		0%
1.10.3.1	102166	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE AF_01/2021_PS	m²	171,33	411,88	70.967,40	1,76 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	70.967,40	100%
1.10.3.2	12333	ORSE	Porta/Escadaria em alumínio, cor NIP/IB, tipo moldura-vidro, inclusive caixilho vertical 5 x 10, material fixo, dobradiças ou rodapiés e fechadura, exclusiva vidro	m²	171,33	419,01	71.788,98	1,79 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	71.788,98	100%
1.11			FORRO		1	89.536,36	89.536,36	2,23 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$		0%
1.11.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO, AF_08/2023_PS	m²	1135,38	77,00	87.424,26	2,18 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	87.424,26	100%
1.11.2	96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO), AF_08/2023	M	743,7	2,84	2.112,10	0,05 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	2.112,10	100%
1.12			PINTURA		1	111.427,97	111.427,97	2,78 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$		0%
1.12.1			PINTURA - INTERNA		1	31.792,86	31.792,86	0,79 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$		0%
1.12.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UNADEMÃO, AF_04/2023	m²	859,65	3,91	3.361,23	0,08 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	3.361,23	100%
1.12.1.2	88487	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUASDEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	m²	859,65	16,53	14.210,01	0,35 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	14.210,01	100%
1.12.1.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	m²	859,65	12,64	10.865,97	0,27 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	10.865,97	100%
1.12.1.4	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) / ESMALTE SINTÉTICO-FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	m²	99,96	16,11	1.610,35	0,04 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	1.610,35	100%
1.12.1.5	102201	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA), AF_01/2021	m²	99,96	17,46	1.745,30	0,04 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	1.745,30	100%
1.12.2			PINTURA - TETO		1	55.906,10	55.906,10	1,39 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$		0%
1.12.2.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UNADEMÃO, AF_04/2023	m²	1135,38	3,91	4.439,33	0,11 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	4.439,33	100%
1.12.2.2	88486	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUASDEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	m²	1135,38	30,40	34.515,55	0,85 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	34.515,55	100%
1.12.2.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	m²	1135,38	14,93	16.951,22	0,42 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	16.951,22	100%
1.12.3			PINTURA - EXTERNA		1	23.729,01	23.729,01	0,59 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$		0%
1.12.3.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UNADEMÃO, AF_04/2023	m²	786,25	3,91	3.074,23	0,08 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	3.074,23	100%
1.12.3.2	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	m²	786,25	13,63	10.716,58	0,27 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	10.716,58	100%
1.12.3.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	m²	786,25	12,64	9.938,20	0,25 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	9.938,20	100%
1.13			HIDROSANITÁRIO		1	48.072,67	48.072,67	1,20 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$		0%
1.13.1			UNIDADE DE TRATAMENTO		1	6.385,41	6.385,41	0,16 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$		0%
1.13.1.1	96084	SINAPI	TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES), AF_12/2020	UN	1	6.385,41	6.385,41	0,16 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	6.385,41	100%
1.13.2			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		1	13.348,83	13.348,83	0,33 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$		0%
1.13.2.1	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2024	UN	1	220,82	220,82	0,01 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	220,82	100%
1.13.2.2	1200	ORSE	Ponto de água fria embutido, cromatado, material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	20	108,35	2.167,00	0,05 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	2.167,00	100%
1.13.2.3	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (levelatórios, miclorios, ralos e ralos, etc.)	un	11	76,54	841,94	0,02 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	841,94	100%
1.13.2.4	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	9	89,30	803,70	0,02 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	803,70	100%
1.13.2.5	1702	ORSE	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regular, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	un	7	50,29	352,03	0,01 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	352,03	100%
1.13.2.6	94784	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COMACAMENTO E CANOPIA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	9	190,81	1.447,29	0,04 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	1.447,29	100%
1.13.2.7	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	M	79	33,31	2.631,49	0,07 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	2.631,49	100%
1.13.2.8	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARAREDE DE ESGOTO, AF_12/2020	UN	1	425,84	425,84	0,01 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	425,84	100%

Daniel Pinheiro Moraes
 CREA-BA 0515236942
 PDN SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA
 CNPJ: 46.268.407/0001-67

Rua Marquês de Caravellas, 090527, Edif. Lennid, Iguatã, Barra Salvador, BA, CEP 40140241

Franklin de Souza



1.13.2.9	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE 36L) RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS= 0,20X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF. 12/2020	UN	1	393,68	393,68	0,01 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	393,68	100%
1.13.2.1	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS= 0,6X0,6X0,8 MPARA REDE DE ESGOTO.	UN	6	606,10	3.636,60	0,06 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	3.636,60	100%
1.13.2.1	99707	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	9	43,80	394,20	0,01 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	394,20	100%
1.13.2.1	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	4	8,56	34,24	0,00 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	34,24	100%
1.13.3			LOUÇAS E METAIS		1	24.044,71	24.044,71	0,60 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$		0%
1.13.3.1	3659	ORSE	Vaso sanitário c/abaixa de descarga acoplada, linha versatil 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versatil 07963 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	9	678,34	6.105,06	0,15 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	6.105,06	100%
1.13.3.2	106858	SINAPI	MICOTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2	624,79	1.249,58	0,03 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	1.249,58	100%
1.13.3.3	12281	ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1,30x0,60, com02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopie 10 cm, assentada.	un	2	1.680,47	3.360,94	0,06 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	3.360,94	100%
1.13.3.4	12290	ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0,80x0,60, com01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopie 10 cm, assentada.	un	5	1.019,06	5.095,30	0,13 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	5.095,30	100%
1.13.3.5	95546	SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO	UN	9	110,91	998,19	0,02 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	998,19	100%
1.13.3.6	85005	SINAPI	ESPÉLHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO SEM MOLDURA	m²	6,12	594,70	3.639,56	0,09 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	3.639,56	100%
1.13.3.7	100967	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	3	246,36	739,08	0,02 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	739,08	100%
1.13.3.8	86922	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1	662,48	662,48	0,02 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	662,48	100%
1.13.3.9	2108	ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,80x0,60, c/ 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1	1.689,14	1.689,14	0,04 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	1.689,14	100%
1.13.3.1	96989	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1	505,38	505,38	0,01 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	505,38	100%
1.13.4			CAIXA D'ÁGUA		1	4.293,72	4.293,72	0,11 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	4.293,72	100%
1.13.4.1	102609	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 05/2021	UN	4	1.073,43	4.293,72	0,11 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	4.293,72	100%
1.14			INSTALAÇÃO ELÉTRICA		1	80.792,51	80.792,51	2,01 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$		0%
1.14.1			CABOS, TOMADAS E INTERRUPTORES		1	61.889,98	61.889,98	1,54 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$		0%
1.14.1.1	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	34,76	7,69	267,30	0,01 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	267,30	100%
1.14.1.2	91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	99,22	11,50	1.141,03	0,03 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	1.141,03	100%
1.14.1.3	91857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	2,3	15,12	34,77	0,00 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	34,77	100%
1.14.1.4	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	54,7	11,51	629,59	0,02 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	629,59	100%
1.14.1.5	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023, PA	M	203,52	18,18	3.699,99	0,09 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	3.699,99	100%
1.14.1.6	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	11	43,90	482,90	0,01 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	482,90	100%
1.14.1.7	91957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	1	58,55	58,55	0,00 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	58,55	100%
1.14.1.8	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	18	29,26	526,68	0,01 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	526,68	100%
1.14.1.9	92016	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	52	61,89	3.218,28	0,08 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	3.218,28	100%
1.14.1.1	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	21	49,02	1.029,42	0,03 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	1.029,42	100%
1.14.1.1	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X40X42).	UN	73	7,03	513,19	0,01 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	513,19	100%
1.14.1.1	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	73	17,15	1.251,95	0,03 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	1.251,95	100%
1.14.1.1	92865	SINAPI	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	6	15,48	92,88	0,00 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	92,88	100%

Franklin da Silva



Daniel Pinheiro Morais
Eng. Civil - CREA-BA: 0515236942
P.D.N. SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 46.928.407/0001-67

1.14.1.1	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	366,73	8,44	3.095,20	0,08 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	3.095,20	100%
1.14.1.1	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	1417,54	6,09	8.632,81	0,22 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	8.632,81	100%
1.14.1.1	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	786,64	4,03	3.170,15	0,08 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	3.170,15	100%
1.14.1.1	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	170	21,40	3.638,00	0,08 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	3.638,00	100%
1.14.1.1	8895	ORSE	Caixa de passagem pvc tipo aquatic 30x30x10cm	un	3	81,24	243,72	0,01 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	243,72	100%
1.14.1.1	92866	SINAPI	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UN	29	15,48	448,92	0,01 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	448,92	100%
1.14.1.1	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UN	38	17,15	651,70	0,02 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	651,70	100%
1.14.1.2	101567	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2020	M	342,84	73,35	25.147,31	0,63 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	25.147,31	100%
1.14.1.2	101564	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2020	M	96,85	40,43	3.915,64	0,10 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	3.915,64	100%
1.14.2	100662	SINAPI	DISJUNTORES, MEDIDOR E ATERRAMENTO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2019	UN	1	9.620,23	9.620,23	0,24 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	9.620,23	0%
1.14.2.1	9042	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 440V	un	1	68,32	68,32	0,00 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	68,32	100%
1.14.2.3	97362	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTOBLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1	1.329,10	1.329,10	0,03 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	1.329,10	100%
1.14.2.4	8312	ORSE	Disjuntor monopolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, Sierrensis similar	un	1	210,49	210,49	0,01 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	210,49	100%
1.14.2.5	93666	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	27	11,83	319,41	0,01 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	319,41	100%
1.14.2.6	93665	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	8	11,83	94,64	0,00 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	94,64	100%
1.14.2.7	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1	13,62	13,62	0,00 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	13,62	100%
1.14.2.8	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	3	19,77	59,31	0,00 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	59,31	100%
1.14.2.9	101866	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1	505,81	505,81	0,01 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	505,81	100%
1.14.2.1	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	2	87,48	174,96	0,00 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	174,96	100%
1.14.2.1	12910	ORSE	Poste decorativo 2 pólissas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	3	2.198,71	6.596,13	0,16 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	6.596,13	100%
1.14.3	12971	ORSE	LUMINÁRIAS Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000K, da G-light ou similar - Rev01_11/2021	un	1	9.282,30	9.282,30	0,23 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	9.282,30	0%
1.14.3.1	97608	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	96,91	581,46	0,01 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	581,46	100%
1.14.3.3	12901	ORSE	Luminária de embutir redonda para lâmpada fluorescente ou LED 11W, compacta sistema draw back, modelo esf. 1140 da marca BOUNIN ou similar	un	17	117,12	1.991,04	0,05 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	1.991,04	100%
1.14.3.4	12900	ORSE	Luminária de sobrepôr, de alumínio, redonda com diam 20cm, para lâmpada fluorescente ou LED de 9W, modelo PL Hiper 20 x 20 BR, Rev 01_06/2024	un	12	139,15	1.669,80	0,04 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	1.669,80	100%
1.15	000408	SBC	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO PROJETO INSTALACOES PREV. E COMBATE A INCENDIO ACIMA 700M2	m²	1059,07	9,30	9.849,35	0,25 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	9.849,35	100%
1.15.1	12888	ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Editorial de inclinação pontilêr". Placa E5	un	1	15,30	15,30	0,00 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	15,30	100%
1.15.3	12884	ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência. Placa S2	un	1	20,84	20,84	0,00 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	20,84	100%
1.15.4	C1039	SEINFRA	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M	1	31,91	31,91	0,00 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	31,91	100%
1.15.5	101809	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020, PE	UN	1	231,38	231,38	0,01 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	231,38	100%
1.15.6	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020, PE	UN	1	634,54	634,54	0,02 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	634,54	100%
1.16	103946	SINAPI	JARDIM PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EMPLACAS, A.E. 07/2020A	m²	53,39	15,63	834,48	0,02 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	834,48	0%
1.16.2	7782	ORSE	Planta - Palmeira fênix (Phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	un	7	133,48	934,36	0,02 %	R\$	-	0,00	0,00	R\$	934,36	100%


Daniel Pinheiro Moraes
 CREA-BA 0515236942
 Representante Legal
 PDN SERVIÇO DE COMERCIO LTDA
 CNPJ: 46.208.107/0001-67



1.18.4.4	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO	m²	41,28	375,54	15.502,29	0,30 %		R\$	0,00	R\$	15.502,29	100%
1.18.4.5	12788	ORSE	Junta serrada, dimensões 6x6x6mm, com preenchimento de mastique de poliuretano-MBT, Base ou similar, para pavimentos em concreto	m	498,6	20,78	10.360,90	0,26 %		R\$	0,00	R\$	10.360,90	100%
1.18.4.6	8411	ORSE	Póimento de piso cimentado - R1	m²	515,95	21,70	11.195,11	0,28 %		R\$	0,00	R\$	11.195,11	100%
1.18.4.7	10012	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4,2mm, panel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m²	515,95	21,95	11.325,10	0,28 %		R\$	0,00	R\$	11.325,10	100%
1.18.5			PINTURA PISO - QUADRA COBERTA		1	22.796,07	22.796,07	0,57 %		R\$	0,00	R\$		0%
1.18.5.1	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR AF_05/2021	m²	515,95	20,40	10.525,38	0,26 %		R\$	0,00	R\$	10.525,38	100%
1.18.5.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMADEMAÇÃO AF_04/2023	m²	515,95	3,91	2.017,36	0,05 %		R\$	0,00	R\$	2.017,36	100%
1.18.5.3	100761	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALOQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA, (02 DEMÃOS) AF_01/2020, PE	m²	188,1	54,51	10.253,33	0,26 %		R\$	0,00	R\$	10.253,33	100%
1.18.6			ALAMBRA DO TELA LOZANGULAR DE PROTEÇÃO CAMPO ESPORTES		1	141.042,38	141.042,38	3,51 %		R\$	0,00	R\$		0%
1.18.6.1	111670	SBC	ALAMBRA DO TELA LOZANGULAR DE PROTEÇÃO CAMPO ESPORTES	m²	378,8	320,52	121.412,97	3,02 %		R\$	0,00	R\$	121.412,97	100%
1.18.6.2	8791	ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ arv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar.	m²	47,35	414,56	19.529,41	0,49 %		R\$	19.529,41	R\$		0%
1.18.7			ARQUIBANCADA - QUADRA COBERTA		1	46.128,96	46.128,96	1,15 %		R\$	0,00	R\$		0%
1.18.7.1	2374	ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ arv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e entalhamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck=15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m²	158,3	244,24	38.663,19	0,96 %		R\$	38.663,19	R\$		0%
1.18.7.2	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	46,05	19,34	860,60	0,02 %		R\$	860,60	R\$		0%
1.18.7.3	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	m²	46,05	41,60	1.915,68	0,05 %		R\$	1.915,68	R\$		0%
1.18.7.4	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR AF_05/2021	m²	112,25	20,40	2.289,90	0,06 %		R\$	0,00	R\$	2.289,90	100%

Handwritten signature and stamp:
 Daniel Pinheiro Morais
 18/08/2024

Daniel Pinheiro Morais
 Daniel Pinheiro Morais
 CREA-BA: 051523/894
 PDN SERVICO E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 16.263.197/0001-67

Rua Marquês de Caxias, 009527, Edif. Lenat, Iq. 04, Barra Salvador, BA, CEP 40140241



1.18.7.5	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024	m²	112,25	4,58	514,10	0,01 %	R\$	0,00	R\$	514,10	100%
1.18.7.6	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOIS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	112,25	16,53	1.855,49	0,06 %	R\$	0,00	R\$	1.855,49	100%
1.18.8			EQUIPAMENTOS - QUADRA COBERTA						R\$	0,00	R\$		0%
1.18.8.1	103769	SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	UN	1	6.657,54	6.657,54	0,17 %	R\$	0,00	R\$	2.531,01	100%
1.18.8.2	10069	ORSE	Trave oficial para tubo de seção 3x2m em aço galvanizado de 3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto completo)	par	1	2.531,01	2.531,01	0,06 %	R\$	0,00	R\$	3.154,16	100%
1.18.8.3	2432	ORSE	Poste oficial para vola em aço galvanizado de 3", craseador e calha	par	1	3.154,16	3.154,16	0,08 %	R\$	0,00	R\$	780,60	100%
1.18.8.4	2429	ORSE	Rede para vola profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1	780,60	780,60	0,02 %	R\$	0,00	R\$	191,77	100%
1.18.9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRA COBERTA						R\$	0,00	R\$		0%
1.18.9.1	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	3	7.095,61	7.095,61	0,18 %	R\$	0,00	R\$	51,45	100%
1.18.9.2	74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1	17,15	496,98	0,01 %	R\$	0,00	R\$	496,98	100%
1.18.9.3	91864	SINAPI	Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, 200W, IP68 duplo, módulos 12, corpo em alumínio, pintura eletrolítica, proteção contra corrosão, 6500K, FP = >0,95, IRC = Ra-90, FL = 22.000 Lúmens, VU = 50.000h, ângulo feixe = 120°	M	71,06	14,54	1.033,21	0,03 %	R\$	0,00	R\$	1.033,21	100%
1.18.9.4	13537	ORSE	Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 40A, fornecimento e instalação. AF 03/2023	un	8	216,12	1.726,96	0,04 %	R\$	0,00	R\$	1.726,96	100%
1.18.9.5	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, FORNECIMENTO E	UN	1	57,19	57,19	0,00 %	R\$	0,00	R\$	57,19	100%
1.18.9.6	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, FORNECIMENTO E	UN	2	57,19	114,38	0,00 %	R\$	0,00	R\$	114,38	100%
1.18.9.7	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	223,18	8,44	1.883,63	0,05 %	R\$	0,00	R\$	1.883,63	100%
1.18.9.8	97867	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,400 X 0,400 X 0,4 M. AF 12/2020	UN	6	250,86	1.505,16	0,04 %	R\$	0,00	R\$	1.505,16	100%
1.18.9.9	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	5	44,93	224,65	0,01 %	R\$	0,00	R\$	224,65	100%
1.19			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)						R\$	0,00	R\$		0%
1.19.1	11273	ORSE	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x60mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref: TEL-901 ou similar (SPDA)	un	1	332,75	332,75	0,01 %	R\$	0,00	R\$	332,75	100%
1.19.2	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO DIÂMETRO 34", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E	UN	22	38,98	857,56	0,02 %	R\$	0,00	R\$	857,56	100%
1.19.3	96686	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 34", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E	UN	22	115,15	2.533,30	0,06 %	R\$	0,00	R\$	2.533,30	100%
1.19.4	104753	SINAPI	CONECTOR SPIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM² - FORNECIMENTO E	UN	1	22,62	22,62	0,00 %	R\$	0,00	R\$	22,62	100%
1.19.5	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -	M	135	64,47	8.703,45	0,22 %	R\$	0,00	R\$	8.703,45	100%
1.19.6	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	251	44,93	11.277,43	0,28 %	R\$	0,00	R\$	11.277,43	100%
1.19.7	7028	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 35 mm² - fornecimento e instalação	un	11	4,41	48,51	0,00 %	R\$	0,00	R\$	48,51	100%
1.19.8	104749	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 34" E CABOS DE 10 A 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	22	21,36	469,92	0,01 %	R\$	0,00	R\$	469,92	100%
1.19.9	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	66	18,32	1.209,12	0,03 %	R\$	0,00	R\$	1.209,12	100%
1.19.10	11132	ORSE	Presilha de laço, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo ø=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref: TEL-744 ou similar (SPDA)	un	200	2,00	400,00	0,01 %	R\$	0,00	R\$	400,00	100%
1.19.11	10091	ORSE	Fixador tipo Ômega em cobre, L=15mm, øfuros d=5,5mm e trava p/cabo de 35mm², ref: TEL-833 ou similar (pSPDA)	un	45	1,97	84,15	0,00 %	R\$	0,00	R\$	84,15	100%
1.19.12	9048	ORSE	Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref: TEL-560 (para-Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação	un	22	45,52	1.001,44	0,02 %	R\$	0,00	R\$	1.001,44	100%
1.19.13	11039	ORSE	Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação	un	300	0,79	237,00	0,01 %	R\$	0,00	R\$	237,00	100%

Francinópolis



Daniel Pinheiro Morais
 CREA-BA/0515236942
 Representante Legal
 PBN SERVIÇO E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 46.298.407/0001-67

1.19.14	11000	ORSE	Tela em aço inoxidável, padrão moeda, fixada em moldura constituída de cantoneira de 3/4 x 3/4 x 1/8"	m²	6	216,37	1.298,22	0,03 %	R\$	0,00	0,00	R\$	1.298,22	100%
1.20			INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA		1	211.048,86	211.048,86	6,26 %	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.20.1	064533	SBC	COLETOR SOLAR FECHADO 2,00 x 1,00m	UN	165	852,75	140.703,75	3,50 %	R\$	0,00	0,00	R\$	140.703,75	100%
1.20.2	012004	SBC	INVERSOR/GERADOR SOLAR ON-GRID 75KW TRIF 380V SGT6CX SUNGROW	UN	1	20.836,09	20.836,09	0,52 %	R\$	0,00	0,00	R\$	20.836,09	100%
1.20.3	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176	37,53	6.605,28	0,16 %	R\$	0,00	0,00	R\$	6.605,28	100%
1.20.4	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176	27,34	4.811,84	0,12 %	R\$	0,00	0,00	R\$	4.811,84	100%
1.20.5	100147	SBC	ESTRUTURA ALUMINIO LEVE FIXAÇÃO DO COLETOR SOLAR	m²	330	115,43	38.091,90	0,95 %	R\$	0,00	0,00	R\$	38.091,90	100%
1.21			SERVIÇOS FINAIS		1	14.779,08	14.779,08	0,37 %	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.21.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1731	3,62	6.266,22	0,16 %	R\$	0,00	0,00	R\$	6.266,22	100%
1.21.2	5	ORSE	Placa de inauguração de obra CONFORME PROJETO	un	1	1.735,45	1.735,45	0,04 %	R\$	0,00	0,00	R\$	1.735,45	100%
1.21.3	12385	ORSE	Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diâmetro 1,1/2", barras verticais d=3/4" e cada 0,11m, curvas de aço inox. - Escada	m	6,27	1.021,90	6.407,31	0,16 %	R\$	0,00	0,00	R\$	6.407,31	100%
1.21.4	106674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVO ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2024	m²	1	370,10	370,10	0,01 %	R\$	0,00	0,00	R\$	370,10	100%
BM 04:										R\$ 100.446,94	ACUMULADO:	R\$ 589.906,30	R\$ 3.424.781,38	

VALOR TOTAL	R\$ 4.014.687,68
VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 100.446,94
ACUMULADO	R\$ 589.906,30
SALDO CONTRATUAL	R\$ 3.424.781,38

[Assinatura manuscrita]



Daniel Pinheiro Morais
 CREA-BA 0515236942
 PDN SERVIÇO E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 46.288.307/0001-07



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

CONTRATO:1035-2025
OBRA:REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
PEDRO VALE
ENDEREÇO: RUA MARQUÊS DE CARAVELAS
Nº 527

INÍCIO: 15/09/2025
Nº DA OS: 054/2025

DATA:
13.12.2025 A 14.12.2025



MANHÃ

TARDE

MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE OBRA		AJUDANTE GERAL		PLACA COMPACTADORA	
ENGENHEIRO CIVIL		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
MESTRE DE OBRA		CARPINTEIRO		CAÇAMBA	
		PEDREIRO		CAMINHÃO PIPA	

TAREFAS REALIZADAS

1) SEM SERVIÇO; FINAL DE SEMANA

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Franklin de Faria

Daniel Pinheiro Moraes
CREA-BA 0515256942
PDN SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 46.288.407/0001-67



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

CONTRATO:1035-2025
OBRA:REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
PEDRO VALE
ENDEREÇO: RUA MARQUÊS DE CARAVELAS
Nº 527

INÍCIO: 15/09/2025
Nº DA OS: 054/2025

DATA:
15/12/2025 A 19/12/2025



MANHÃ

TARDE

MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	6	PLACA COMPACTADORA	
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	2	RETRO ESCAVADEIRA	
MESTRE DE OBRA	1	CARPINTEIRO	1	CAÇAMBA	
		PEDREIRO	3	CAMINHÃO PIPA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK =25 MPA. AF_11/2022
- 2) ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
- 3) REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMAMANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/20234)
- 4) REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
- 7)
- 8)
- 9)

Franklin de F. Costa



Daniel Pinheiro Moraes
CREA-BA:0515236942
PDN SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 46.289.407/0001-67



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

CONTRATO:1035-2025
OBRA:REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
PEDRO VALE
ENDEREÇO: RUA MARQUÊS DE CARAVELAS
Nº 527

INÍCIO: 15/09/2025
Nº DA OS: 054/2025

DATA:
20.12.2025 A 21.12.2025



MANHÃ

TARDE

MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE OBRA		AJUDANTE GERAL		PLACA COMPACTADORA	
ENGENHEIRO CIVIL		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
MESTRE DE OBRA		CARPINTEIRO		CAÇAMBA	
		PEDREIRO		CAMINHÃO PIPA	

TAREFAS REALIZADAS

1) SEM SERVIÇO; FINAL DE SEMANA

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Franklin de F. Costa



Daniel Pinheiro Moraes
CREA-BA 0515236942
PDN SERVIÇO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 46.288.407/0001-67



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

CONTRATO:1035-2025

OBRA:REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
PEDRO VALE

ENDEREÇO: RUA MARQUÊS DE CARAVELAS
Nº 527

INÍCIO: 15/09/2025

Nº DA OS: 054/2025

DATA:

22/12/2025 A 24/12/2025



MANHÃ

TARDE

MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	6	PLACA COMPACTADORA	
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	2	RETRO ESCAVADEIRA	
MESTRE DE OBRA	1	CARPINTEIRO	1	CAÇAMBA	
		PEDREIRO	3	CAMINHÃO PIPA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK =25 MPA. AF_11/2022
- 2) ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
- 3) REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMAMANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/20234)
- 4) REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
- 7)
- 8)
- 9)

Franklin de F. Pena



Daniel Pinheiro Moraes
CREA-BA/0515236942
PDN SERVIÇO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 46.283.407/0001-67



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

CONTRATO:1035-2025
OBRA:REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
PEDRO VALE
ENDEREÇO: RUA MARQUÊS DE CARAVELAS
Nº 527

INÍCIO: 15/09/2025
Nº DA OS: 054/2025

DATA:
25.12.2025 A 28.12.2025



MANHÃ

TARDE

MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE OBRA		AJUDANTE GERAL		PLACA COMPACTADORA	
ENGENHEIRO CIVIL		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
MESTRE DE OBRA		CARPINTEIRO		CAÇAMBA	
		PEDREIRO		CAMINHÃO PIPA	

TAREFAS REALIZADAS

1) SEM SERVIÇO; RECESSO NATALINO;

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Franklin de L. Pena



Daniel Pinheiro Morais
CREA-BA 0515236942
PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 46.288.407/0001-67



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

CONTRATO:1035-2025
OBRA:REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
PEDRO VALE
ENDEREÇO: RUA MARQUÊS DE CARAVELAS
Nº 527

INÍCIO: 15/09/2025
Nº DA OS: 054/2025

DATA:
29/12/2025 A 31/12/2025



MANHÃ

TARDE

MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	6	PLACA COMPACTADORA	
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	2	RETRO ESCAVADEIRA	
MESTRE DE OBRA	1	CARPINTEIRO	1	CAÇAMBA	
		PEDREIRO	3	CAMINHÃO PIPA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK =25 MPA. AF_11/2022
- 2) ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
- 3) REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMAMANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/20234)
- 4) REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
- 7)
- 8)
- 9)

Franklin de F. Costa



Daniel Pinheiro Moraes
CREA-BA:0515236942
PDN SERVIÇO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 46.288.407/0001-67



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

CONTRATO:1035-2025
OBRA:REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
PEDRO VALE
ENDEREÇO: RUA MARQUÊS DE CARAVELAS
Nº 527

INÍCIO: 15/09/2025
Nº DA OS: 054/2025

DATA:
01.01.2026 A 04.01.2026



MANHÃ

TARDE

MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE OBRA		AJUDANTE GERAL		PLACA COMPACTADORA	
ENGENHEIRO CIVIL		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
MESTRE DE OBRA		CARPINTEIRO		CAÇAMBA	
		PEDREIRO		CAMINHÃO PIPA	

TAREFAS REALIZADAS

1) SEM SERVIÇO; RECESSO ANO NOVO;

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Franklin de L. S. S. S.



Daniel Pinheiro Morais
CREA-BA 0515236942
PDN SERVIÇO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 46.288.407/0001-67



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

CONTRATO:1035-2025
OBRA:REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
PEDRO VALE
ENDEREÇO: RUA MARQUÊS DE CARAVELAS
Nº 527

INÍCIO: 15/09/2025
Nº DA OS: 054/2025

DATA:
05/01/2026 A 09/01/2026



MANHÃ

TARDE

MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	6	PLACA COMPACTADORA	
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	2	RETRO ESCAVADEIRA	
MESTRE DE OBRA	1	CARPINTEIRO	1	CAÇAMBA	
		PEDREIRO	3	CAMINHÃO PIPA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
- 2) ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
- 3) REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/20234)
- 4) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
- 7)
- 8)
- 9)

Franklin de Sousa



Daniel Pinheiro Morais
CREA-BA 0515236942
PDN SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 46.288.407/0001-67



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

CONTRATO:1035-2025
OBRA:REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
PEDRO VALE
ENDEREÇO: RUA MARQUÊS DE CARAVELAS
Nº 527

INÍCIO: 15/09/2025
Nº DA OS: 054/2025

DATA:
10.01.2026 A 11.01.2026



MANHÃ

TARDE

QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
	GERENTE DE OBRA		PLACA COMPACTADORA	
	ENGENHEIRO CIVIL		RETRO ESCAVADEIRA	
	MESTRE DE OBRA		CAÇAMBA	
			CAMINHÃO PIPA	
	AJUDANTE GERAL			
	ARMADOR			
	CARPINTEIRO			
	PEDREIRO			

TAREFAS REALIZADAS

1) SEM SERVIÇO; FINAL DE SEMANA;

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Franklin de Sousa



Daniel Pinheiro Moraes
CREA-BA/0515236942
PDN SERVIÇO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 46.288.17/0001-67



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

CONTRATO:1035-2025
OBRA:REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
PEDRO VALE
ENDEREÇO: RUA MARQUÊS DE CARAVELAS
Nº 527

INÍCIO: 15/09/2025
Nº DA OS: 054/2025

DATA:
12/01/2026 A 16/01/2026



MANHÃ

TARDE

MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	6	PLACA COMPACTADORA	
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	2	RETRO ESCAVADEIRA	
MESTRE DE OBRA	1	CARPINTEIRO	1	CAÇAMBA	
		PEDREIRO	3	CAMINHÃO PIPA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
- 2) ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
- 3) Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar.
- 4) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
- 7)
- 8)
- 9)

Franco da Silva
12/01/2026



Daniel Pinheiro Morais
CREA-BA: 0515236942
PDN SERVIÇO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 46.288.177/0001-67



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

CONTRATO:1035-2025
OBRA:REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
PEDRO VALE
ENDEREÇO: RUA MARQUÊS DE CARAVELAS
Nº 527

INÍCIO: 15/09/2025
Nº DA OS: 054/2025

DATA:
17.01.2026 A 18.01.2026



MANHÃ

TARDE

MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE OBRA		AJUDANTE GERAL		PLACA COMPACTADORA	
ENGENHEIRO CIVIL		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
MESTRE DE OBRA		CARPINTEIRO		CAÇAMBA	
		PEDREIRO		CAMINHÃO PIPA	

TAREFAS REALIZADAS

1) SEM SERVIÇO; FINAL DE SEMANA;

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

[Handwritten signature]
Daniel Pinheiro Moraes



Daniel Pinheiro Moraes
CREA-BA:0515236942
PDN SERVICO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 46.283.407/0001-67



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

CONTRATO:1035-2025
OBRA:REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
PEDRO VALE
ENDEREÇO: RUA MARQUÊS DE CARAVELAS
Nº 527

INÍCIO: 15/09/2025
Nº DA OS: 054/2025

DATA:
19/01/2026 A 23/01/2026



MANHÃ

TARDE

MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	6	PLACA COMPACTADORA	
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	2	RETRO ESCAVADEIRA	
MESTRE DE OBRA	1	CARPINTEIRO	1	CAÇAMBA	
		PEDREIRO	3	CAMINHÃO PIPA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
- 2) ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
- 3) Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar.
- 4) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
- 7)
- 8)
- 9)



Daniel Pinheiro Moraes
CREA-BA: 515236942
PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 46.288.407/0001-67



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

CONTRATO:1035-2025
OBRA:REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
PEDRO VALE
ENDEREÇO: RUA MARQUÊS DE CARAVELAS
Nº 527

INÍCIO: 15/09/2025
Nº DA OS: 054/2025

DATA:
24.01.2026 A 25.01.2026



MANHÃ

TARDE

MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE OBRA		AJUDANTE GERAL		PLACA COMPACTADORA	
ENGENHEIRO CIVIL		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
MESTRE DE OBRA		CARPINTEIRO		CAÇAMBA	
		PEDREIRO		CAMINHÃO PIPA	

TAREFAS REALIZADAS

1) SEM SERVIÇO; FINAL DE SEMANA;

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)



Daniel Pinheiro Morais
CREA-BA/0515236942
PDN SERVIÇO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 46.288.407/0001-67



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

CONTRATO:1035-2025
OBRA:REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
PEDRO VALE
ENDEREÇO: RUA MARQUÊS DE CARAVELAS
Nº 527

INÍCIO: 15/09/2025
Nº DA OS: 054/2025

DATA:
26/01/2026 A 30/01/2026



MANHÃ

TARDE

MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	6	PLACA COMPACTADORA	
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	2	RETRO ESCAVADEIRA	
MESTRE DE OBRA	1	CARPINTEIRO	1	CAÇAMBA	
		PEDREIRO	3	CAMINHÃO PIPA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
- 2) ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
- 3) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
- 4)
- 7)
- 8)
- 9)

Francisco de Paula
15/09/2025



Daniel Pinheiro Moraes
CREA-BA/0515236942
PDN SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 46.288.407/0001-67

Daniel Pinheiro Moraes
CREA-BA:0515236942
PDN SERVIÇO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 46.238.407/0001-67

	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CNPJ: 46288407000167		Nº DA OS: 054/2025 CONTRATO: 1035-2025 BM: 004
	DATA DA MEDIÇÃO: 31/01/2026	OBJETO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PEDRO DO VALE IRMÃO, COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA

FOTO - 01 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMAMANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

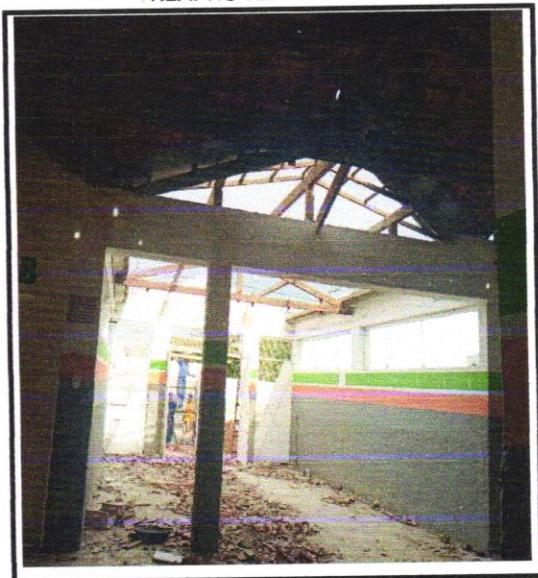


FOTO - 02 :DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO



FOTO - 03 : REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M,


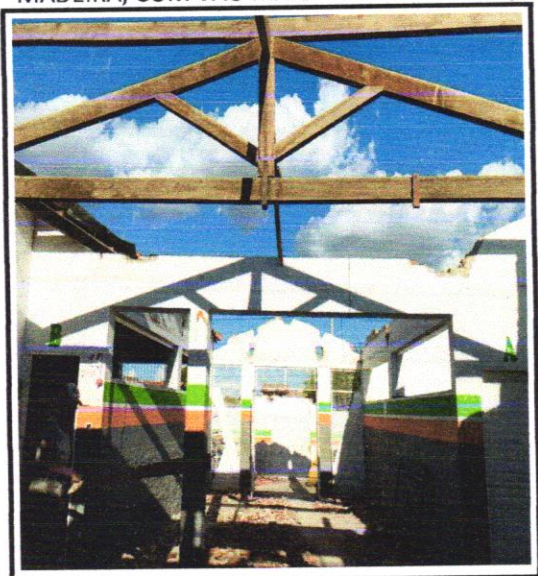


FOTO - 04: DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO



Franklin de Faria

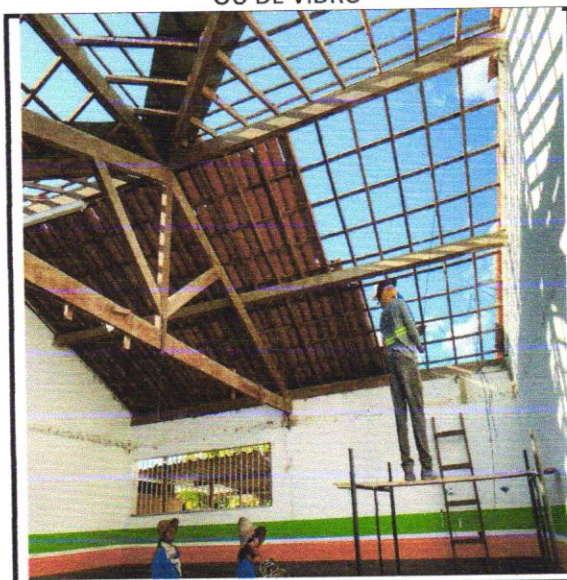

Daniel Pinheiro Moraes
 CREA-BA: 0515236942
 PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 46.288.407/0001-67

	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CNPJ: 46288407000167		Nº DA OS: 054/2025 CONTRATO: 1035-2025 BM: 004
	DATA DA MEDIÇÃO: 31/01/2026	OBJETO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PEDRO DO VALE IRMÃO, COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA

FOTO - 05 Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m,

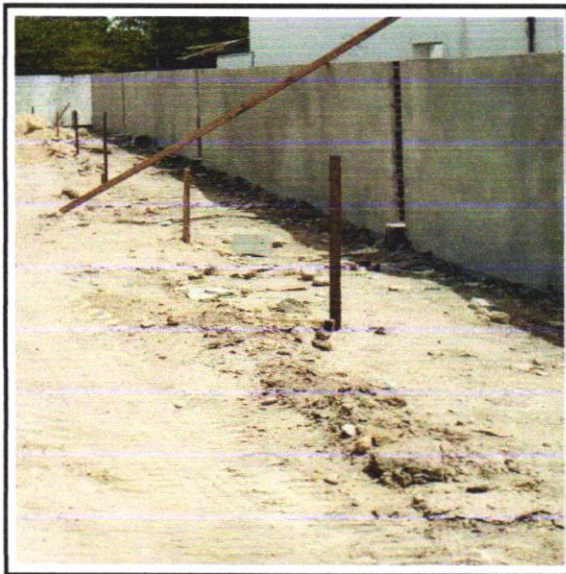


FOTO - 06 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

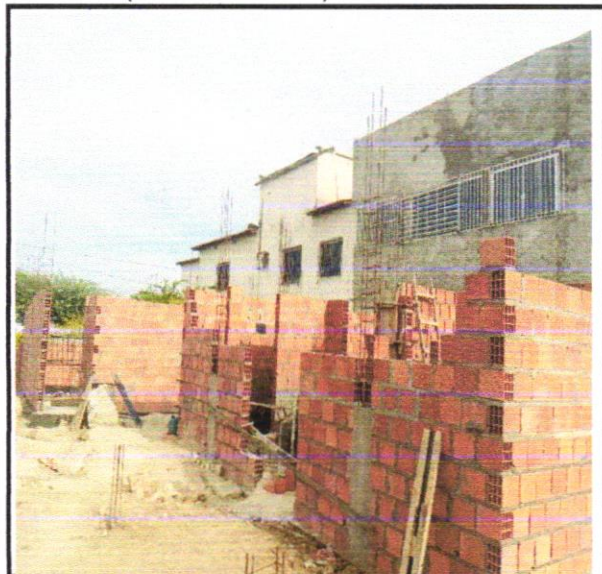


FOTO - 07 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM



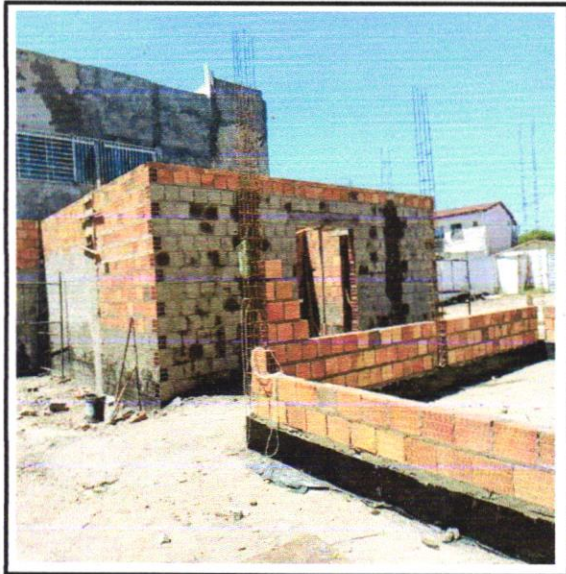


FOTO - 08 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER

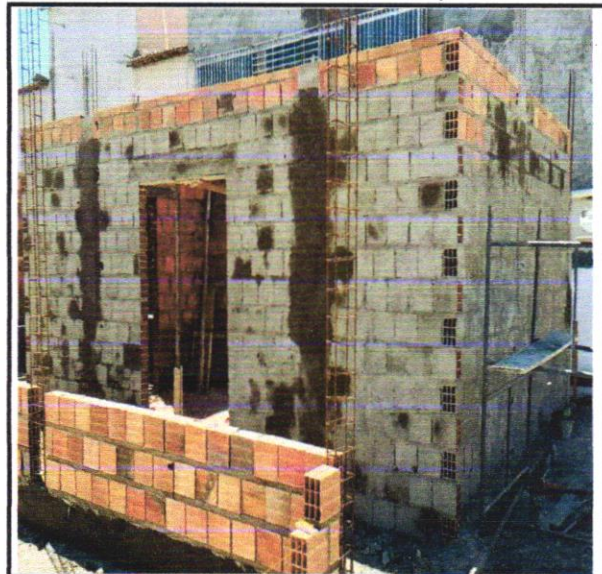


 Francisco de Paula
 Engenheiro Civil

Daniel Pinheiro Morais
 CREA-BA 0515236942
 PDN SERVIÇO E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 46.288.407/0001-67



		RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CNPJ: 46288407000167	Nº DA OS: 054/2025 CONTRATO: 1035-2025 BM: 004
DATA DA MEDIÇÃO: 31/01/2026	OBJETO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PEDRO DO VALE IRMÃO, COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA	

FOTO - 09

LASTRO DE CONCRETO MAGRO

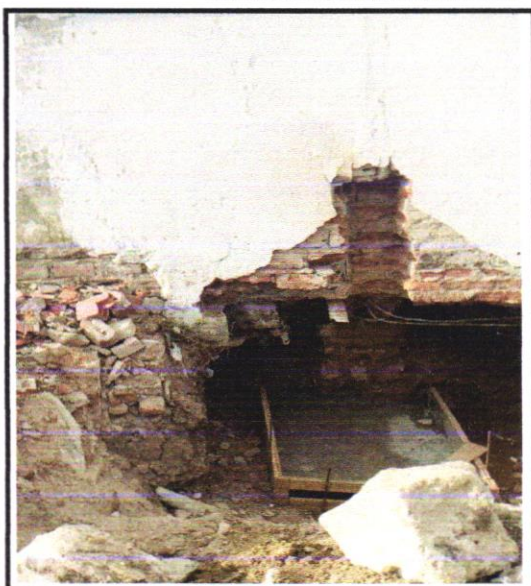


FOTO - 10 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA

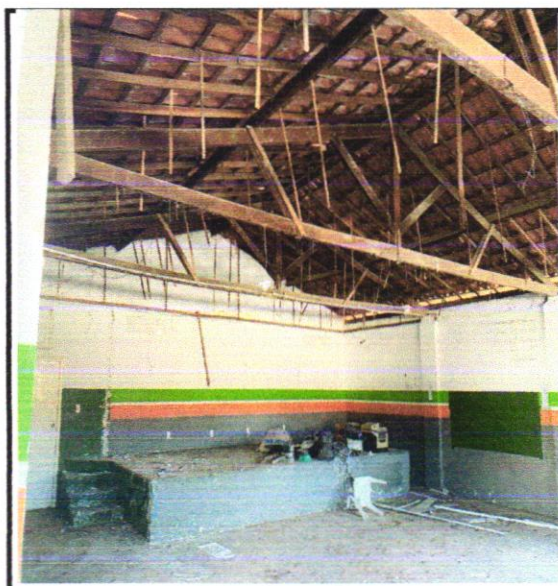


FOTO 11- DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.


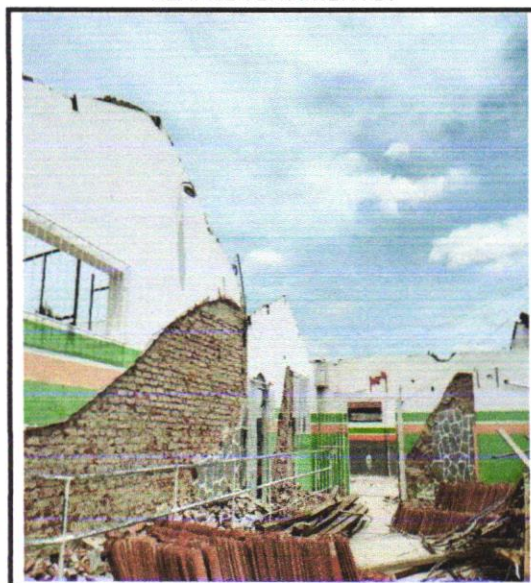


FOTO- 12 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO



Franklin Costa

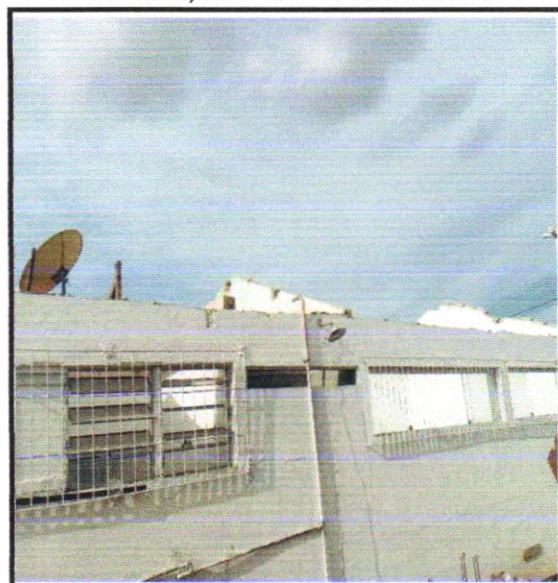

Daniel Pinheiro Moraes
 CREA-BA/0515236942
 PDN SERVIÇO E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 46.288.407/0001-67

 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CNPJ: 46288407000167		Nº DA OS: 054/2025 CONTRATO: 1035-2025 BM: 004
DATA DA MEDIÇÃO: 31/01/2026	OBJETO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PEDRO DO VALE IRMÃO, COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA

FOTO-13 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DECONCRETO

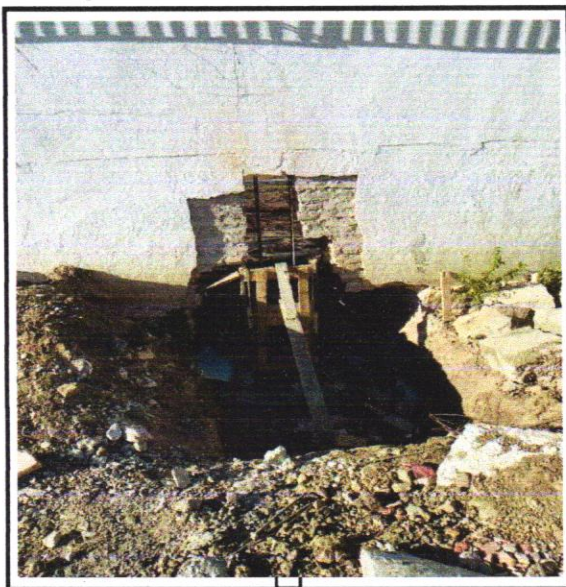


FOTO-14 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DECONCRETO ARMADO,

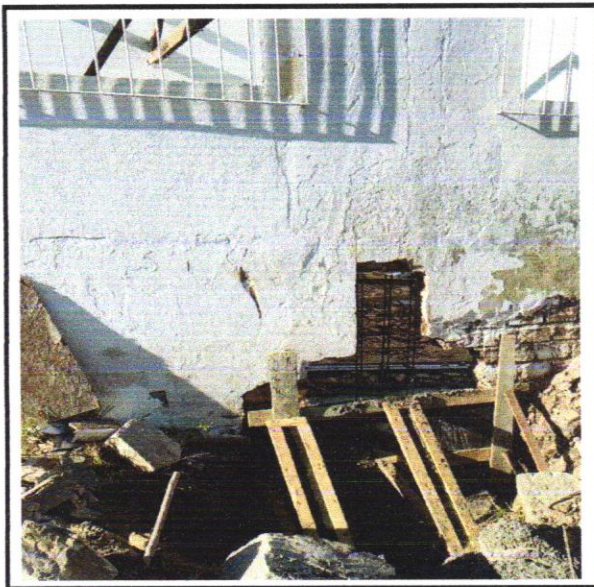


FOTO 15- REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO



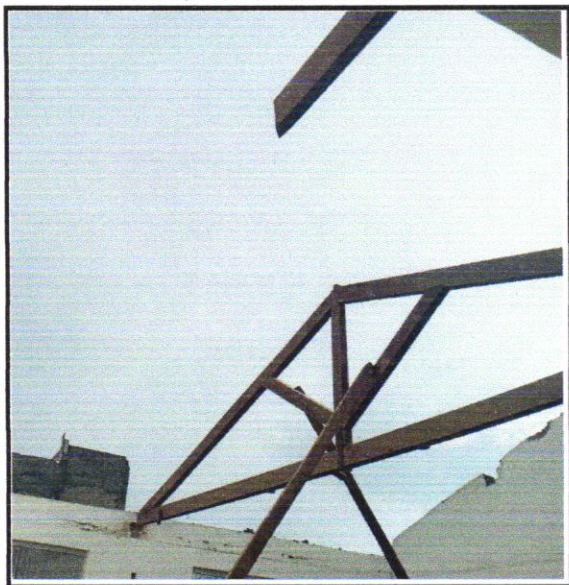


FOTO 16-DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO.

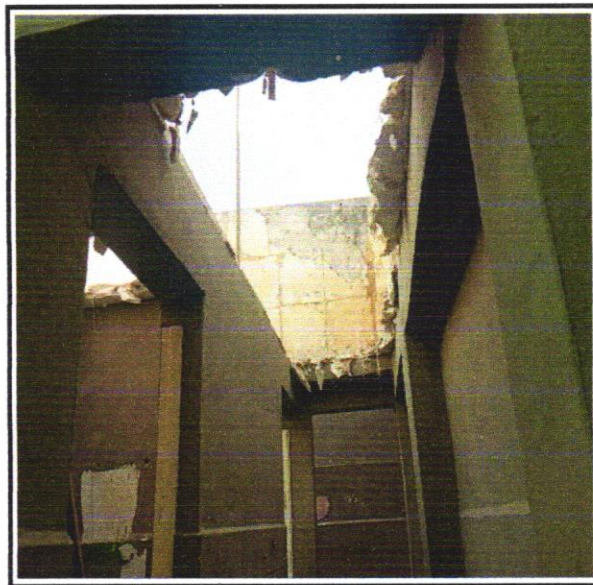


 Franklin de S. Sampaio


 Daniel Pinheiro Moraes
 CREA-BA/0515236942
 PDN SERVIÇO E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 46.288.407/0001-67



	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CNPJ: 46288407000167		Nº DA OS: 054/2025 CONTRATO: 1035-2025 BM: 004
	DATA DA MEDIÇÃO: 31/01/2026	OBJETO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PEDRO DO VALE IRMÃO, COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA

FOTO - 17 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM

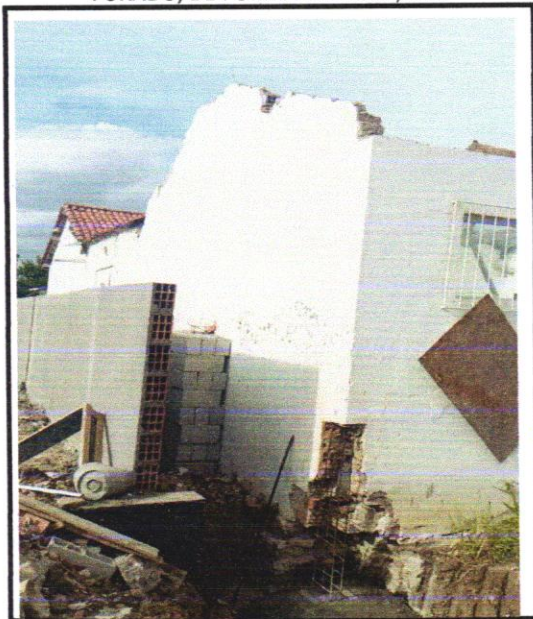


FOTO - 18 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

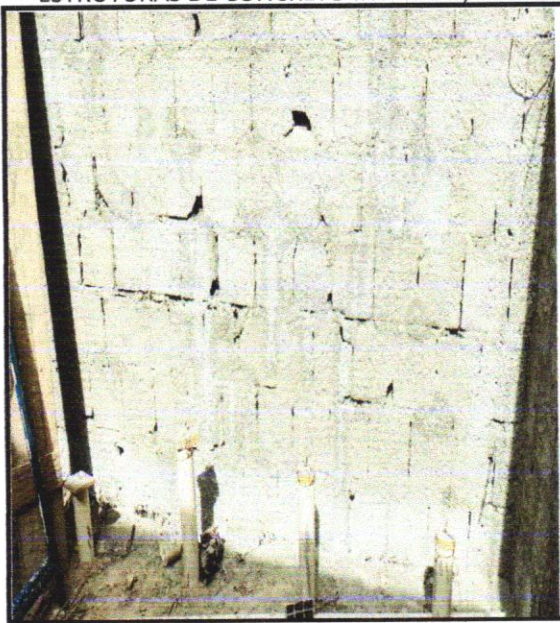


FOTO 19- CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO


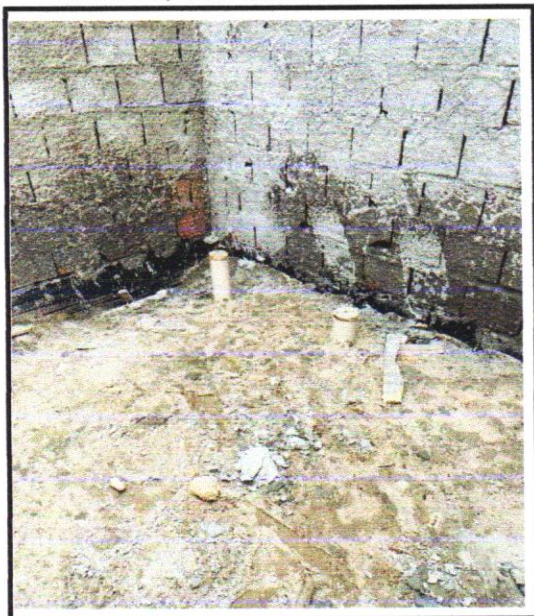


FOTO- 20 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO



Francilino da Silva

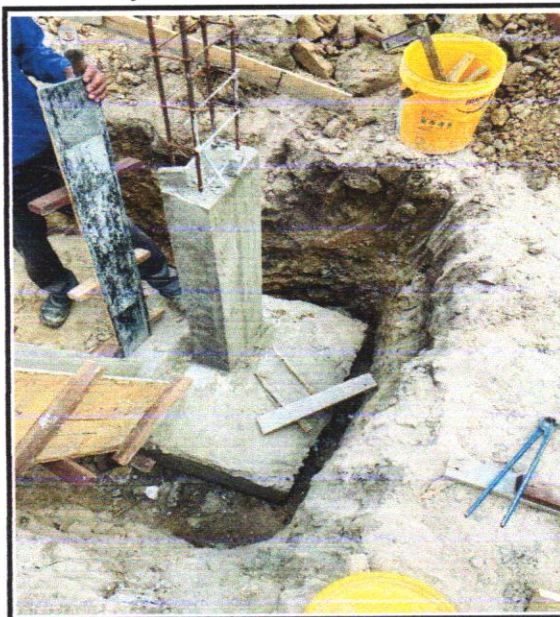


Daniel Pinheiro Moraes
 CREA-BA 0515236942
 PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 46.288.407/0001-67



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 46288407000167

Nº DA OS: 054/2025
CONTRATO: 1035-2025
BM: 004

DATA DA
MEDIÇÃO: 31/01/2026

OBJETO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PEDRO DO VALE IRMÃO, COM
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA

FOTO - 21 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,



FOTO - 22 DEMOLIÇÃO DE PISO DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO



FOTO - 23 DEMOLIÇÃO DE PISO DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO



FOTO - 24 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,



Francilene Costa Sana



Daniel Pinheiro Moraes
CREA-BA: 0515236942
PDN SERVIÇO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 46.288.407/0001-67



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 46288407000167

Nº DA OS: 054/2025
CONTRATO: 1035-2025
BM: 004

DATA DA MEDIÇÃO: 31/01/2026

OBJETO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PEDRO DO VALE IRMÃO, COM
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA

FOTO 25- REMOÇÃO DE ESQUADRIAS

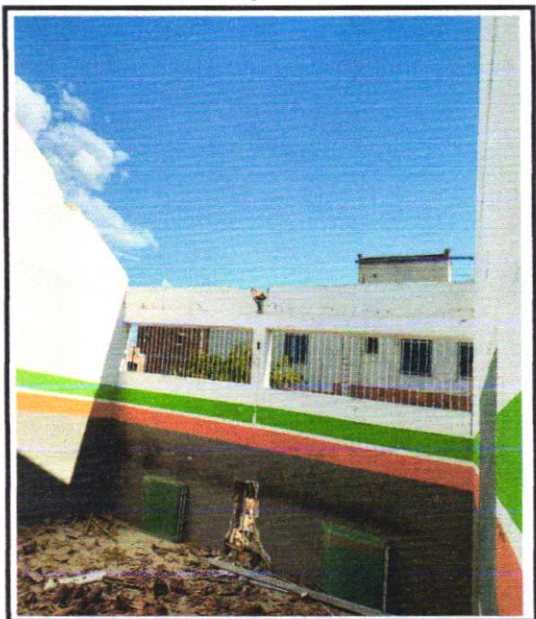


FOTO - 26 REMOÇÃO DE ESQUADRIAS

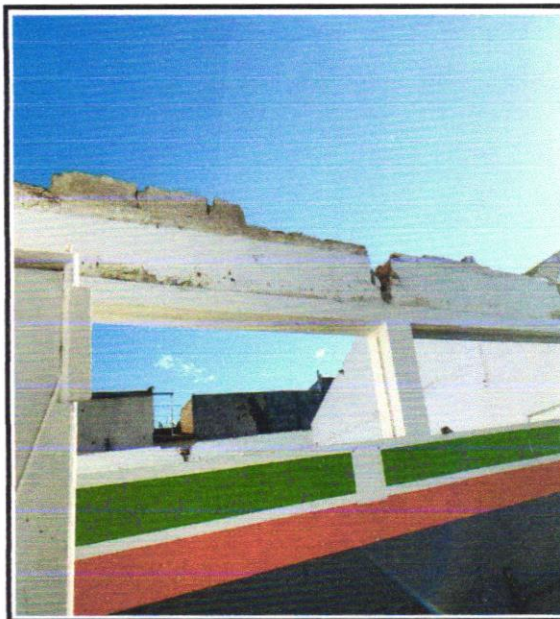


FOTO 28 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE
BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM


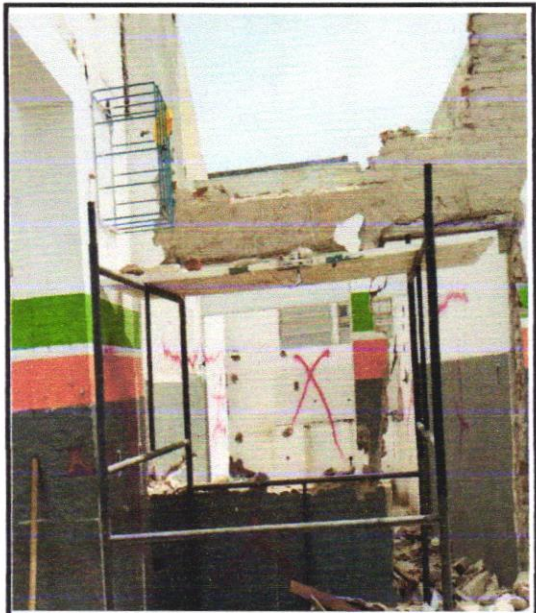


FOTO 29-DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM



Francilene de S. Silva

Daniel Pinheiro Moraes
CREA-BA: 0515236942
PDN SERVIÇO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 46 288 407 0001-67

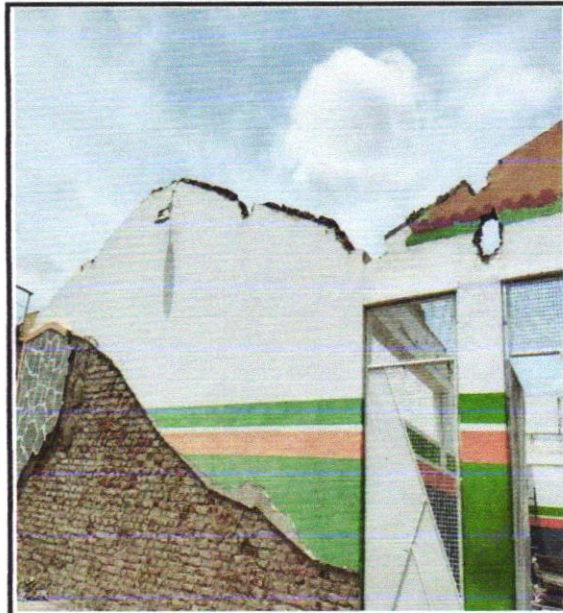



Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social: PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 46.288.407/0001-67
Endereço: RUA MARQUES DE CARAVELAS Nº 000527 - BARRA, SALVADOR/BA - CEP: 40140241 - EDIF LEINAD LOJA 04

Número da Certidão: 3738159

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sefaz.salvador.ba.go.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 15:15:03 horas do dia 26/01/2026.
Válida até dia 26/04/2026.

Código de controle da certidão: **712A.4078.6F4F.D94C.6567.D66B.7896.5C9C**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20256462444

RAZÃO SOCIAL	
PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	46.288.407/0001-67

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 26/12/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA/
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 46.288.407/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:49:06 do dia 20/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/02/2026.

Código de controle da certidão: **501F.8516.E40A.3BD4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 46.288.407/0001-67

Certidão nº: 80164992/2025

Expedição: 26/12/2025, às 11:15:22

Validade: 24/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.288.407/0001-67**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.288.407/0001-67
Razão Social: PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereço: R MARQUES DE CARAVELAS 000527 EDIF LEINAD / BARRA / SALVADOR / BA / 40140-241

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/01/2026 a 16/02/2026

Certificação Número: 2026011803485812997611

Informação obtida em 26/01/2026 15:16:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**





PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 01106563E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **09/02/2026**, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA

CNPJ: 46.288.407/0001-67

Endereço: RUA MARQUES DE CARAVELAS, N527, EDIF LEINAD , LOJA 04, BARRA , CEP. 40140-241

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	46.288.407/0001-67
Nome	PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA
Período de apuração	12/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	37257683415 / eSocial 136462177 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 2.599,30	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 6.912,11	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 121,38	R\$ 121,38
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 9.632,79	R\$ 121,38

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	DANIEL PINHEIRO DE MORAIS
CPF	050.774.095-52
Telefone	3345-0318



DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	17/01/2026 00:41:46
Nº do recibo de entrega	0000050000430644365
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	46.288.407/0001-67





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 46.288.407 Nome Empregador: PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.160,67
Número da Guia: 0126011715891072-7 Data Emissão: 17/01/2026 00:56:36 (Brasília) Emitida por: 46.288.407/0001-67 - PDN SERVICOS E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 46.288.407/0001-67		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ADALTO EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIO	40	026.675.325-62	101	20/01/2026	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32
12/2025		ADEMILSON DOS SANTOS SILVA	39	906.029.785-72	101	20/01/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
12/2025		ADSON OLIVEIRA CARMO	37	093.332.435-93	101	20/01/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
12/2025		EDIMILSON RIBEIRO DE JESUS	46	663.892.245-91	101	20/01/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
12/2025		JOSE DOMINGOS DA SILVA NASCIMENTO	43	068.222.935-07	101	20/01/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
12/2025		MATHEUS EVANGELISTA SANTOS	42	863.926.415-56	101	20/01/2026	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
12/2025		MIGUEL RIBEIRO DOS SANTOS NETO	44	075.228.955-10	101	20/01/2026	Mensal	2.942,34	235,38	0,00	0,00	0,00	235,38
12/2025		MISAEAL DA SILVA PEREIRA	45	927.755.435-53	101	20/01/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
12/2025		ROBERTO DE SENA ALMEIDA	41	062.340.785-08	101	20/01/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
12/2025		TEOBALDO GUILHERME DE OLIVEIRA	35	411.602.315-91	101	20/01/2026	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
12/2025		VISDAELTON MACEDO DE SOUZA	38	029.911.495-31	101	20/01/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
		Total do Tomador	Sem Tomador					27.009,24	2.160,67	0,00	0,00	0,00	2.160,67
		Total do Estabelecimento	46.288.407/0001-67					27.009,24	2.160,67	0,00	0,00	0,00	2.160,67
							Total FGTS	27.009,24	2.160,67	0,00	0,00	0,00	2.160,67





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 46.288.407 **Nome Empregador:** PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.160,67
Número da Guia: 0126011715891072-7 **Data Emissão:** 17/01/2026 00:56:36 (Brasília) **Emitida por:** 46.288.407/0001-67 - PDN SERVICOS E

Relação de Categorias

Estabelecimento: 46.288.407/0001-67

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	101	11	27.009,24	2.160,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,67
		Total FGTS	27.009,24	2.160,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,67

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.001/1996
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conserite
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/locatário em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empreendedor, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
735 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário de Justiça do Trabalho ou de Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
908 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 46.288.407 Nome Empregador: PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.160,67
Número da Guia: 0126011715891072-7 Data Emissão: 17/01/2026 00:56:36 (Brasília) Emitida por: 46.288.407/0001-67 - PDN SERVICOS E

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	46.288.407/0001-67	11	27.009,24	2.160,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,67
		Total FGTS	27.009,24	2.160,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,67





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 46.288.407 Nome Empregador: PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.160,67
Número da Guia: 0126011715891072-7 Data Emissão: 17/01/2026 00:56:36 (Brasília) Emitida por: 46.288.407/0001-67 - PDN SERVICOS E

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 46.288.407/0001-67										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	11 - FGTS mensal	11	27.009,24	2.160,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,67
Total FGTS			27.009,24	2.160,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,67





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 46.288.407 **Nome Empregador:** PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.160,67
Número da Guia: 0126011715891072-7 **Data Emissão:** 17/01/2026 00:56:36 (Brasília) **Emitida por:** 46.288.407/0001-67 - PDN SERVICOS E

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2025	11	27.009,24	2.160,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,67	
	Total FGTS	27.009,24	2.160,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,67	



Empresa: PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

Emissão: 19/12/2025 12:56

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL 2

CNPJ/CEI: 46288407000167

dezembro/2025

Colaborador :40		ADALTO EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR				Admissão: 10/04/2025		Matricula: 40			
Cargo: 992205		ENCARREGADO GERAL				Situação: Ativo					
CTPS: 9224427-0010\BA		Salário Base: 3.779,04		Tipo de Salário: Mensalista							
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto	
1	SALARIO BASE			220,00		hora(s)		3.779,04		A	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00						1.511,62 A	
108	INSS			9,18						346,88 A	
111	IRRF			15,00						81,62 A	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00						25,57 A	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50						56,69 A	
								3.779,04		2.022,38	
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF	
										Líquido:	
Assinatura				3.779,04		3.779,04		302,32		3.171,84	

Colaborador : 39		ADEMILSON DOS SANTOS SILVA				Admissão: 10/04/2025		Matricula: 39			
Cargo: 715210		PEDREIRO				Situação: Ativo					
CTPS: 0024600-00055\BA		Salário Base: 2.455,70		Tipo de Salário: Mensalista							
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto	
1	SALARIO BASE			220,00		hora(s)		2.455,70			
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00						982,28	
108	INSS			8,07						198,24	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00						25,57	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50						36,84	
								2.455,70		1.242,93	
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF	
										Líquido:	
Assinatura				2.455,70		2.455,70		196,46		0,00	

Colaborador :	37	ADSON OLIVEIRA CARMO				Admissão:	10/04/2025	Matricula:	37	
Cargo:	716610	PINTOR				Situação:	Ativo			
CTPS:	5066845-0050\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista					
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)				2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%					982,28	A
108	INSS		8,07	%					198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					36,84	A
							2.455,70	1.242,93		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			1.212,77	
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00					

Colaborador :6		DANIEL PINHEIRO DE MORAIS				Admissão:		01/03/2023		Matricula:		6							
Cargo:		141410		SOCIO DIRETOR				Situação:		Ativo									
CTPS:		-\		Salário Base:		3.500,00		Tipo de Salário:		Mensalista									
Evento						Referência		Tipo						Provento		Desconto			
129		PROLABORE - SÓCIO						cota(s)						3.500,00				A	
111		IRRF				15,00		%								39,76		A	
210		INSS AUTÔNOMO/SÓCIO				11,00		%								385,00		A	
														3.500,00		424,76			
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:				3.075,24			
Assinatura				3.500,00		0,00		0,00		2.892,80									



Empresa: PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Estabelecimento: Matriz
CNPJ/CEI: 46288407000167

Emissão: 19/12/2025 12:56
Usuário: SETOR PESSOAL 2

dezembro/2025

Colaborador :46		EDIMILSON RIBEIRO DE JESUS				Admissão:		04/11/2025		Matricula:		46						
Cargo:		716610		PINTOR				Situação:		Ativo								
CTPS:		6638922-4591\SE		Salário Base:		2.455,70		Tipo de Salário:		Mensalista								
Evento				Referência		Tipo						Provento		Desconto				
1		SALARIO BASE				220,00		hora(s)						2.455,70				A
66		LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00		%								982,28		A
108		INSS				8,07		%								198,24		A
187		VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00		%								25,57		A
446		TAXA ASSISTENCIAL				1,50		%								36,84		A
												2.455,70		1.242,93				
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:		1.212,77				
Assinatura				2.455,70		2.455,70		196,46		0,00								

Colaborador :43		JOSE DOMINGOS DA SILVA NASCIMENTO				Admissão:		04/11/2025		Matricula:		43					
Cargo:		715210		PEDREIRO				Situação:		Ativo							
CTPS:		0682229-3507\BA		Salário Base:		2.455,70		Tipo de Salário:		Mensalista							
Evento				Referência		Tipo						Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE				220,00		hora(s)						2.455,70				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00		%								982,28		A
108	INSS				8,07		%								198,24		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00		%								25,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL				1,50		%								36,84		A
												2.455,70		1.242,93			
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:		1.212,77			
Assinatura				2.455,70		2.455,70		196,46		0,00							

Colaborador :42		MATHEUS EVANGELISTA SANTOS				Admissão:		04/11/2025		Matricula:		42						
Cargo:		717020		AJUDANTE COMUM				Situação:		Ativo								
CTPS:		8639264-1556\BA		Salário Base:		1.548,98		Tipo de Salário:		Mensalista								
Evento						Referência		Tipo						Provento		Desconto		
1	SALARIO BASE					220,00		hora(s)						1.548,98				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL					100,00		%								619,59		A
108	INSS					7,53		%								116,63		A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT					5,00		%								25,57		A
446	TAXA ASSISTENCIAL					1,50		%								23,23		A
												1.548,98		785,02				
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:				763,96		
Assinatura				1.548,98		1.548,98		123,92		0,00								

Colaborador : 44		MIGUEL RIBEIRO DOS SANTOS NETO				Admissão:		04/11/2025		Matricula:		44				
Cargo:		782510		MOTORISTA CARGA PESADA				Situação:		Ativo						
CTPS:		0752289-5510\SE		Salário Base:		2.942,34		Tipo de Salário:		Mensalista						
Evento				Referência		Tipo		Provento				Desconto				
1		SALARIO BASE				220,00		hora(s)		2.942,34						A
66		LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00		%						1.176,94		A
108		INSS				8,38		%						246,48		A
187		VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				1,00		%						4,80		A
										2.942,34		1.428,22				
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:		1.514,12		
Assinatura				2.942,34		2.942,34		235,39		0,00						



Empresa: PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

Emissão: 19/12/2025 12:56

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL 2

CNPJ/CEI: 46288407000167

dezembro/2025

Colaborador : 45		MISAEI DA SILVA PEREIRA				Admissão: 04/11/2025		Matricula: 45					
Cargo: 715210		PEDREIRO				Situação:		Ativo					
CTPS:		33013-00042\BA		Salário Base: 2.455,70		Tipo de Salário:		Mensalista					
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto			
1		SALARIO BASE			220,00		hora(s)		2.455,70		A		
66		LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00		%				982,28 A		
108		INSS			8,07		%				198,24 A		
187		VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00		%				25,57 A		
446		TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				36,84 A		
									2.455,70		1.242,93		
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido: 1.212,77	
Assinatura				2.455,70		2.455,70		196,46		0,00			

Colaborador :	41	ROBERTO DE SENA ALMEIDA				Admissão:	10/04/2025	Matricula:	41
Cargo:	715505	Carpinteiro				Situação:	Ativo		
CTPS:	8841150-0050\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	2.455,70				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				982,28	A
108	INSS		8,07	%				198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				36,84	A
							2.455,70	1.242,93	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.212,77	
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				

Colaborador : 35		TEOBALDO GUILHERME DE OLIVEIRA				Admissão:		10/03/2025		Matricula:		35						
Cargo:		717020		SERVENTE COMUM				Situação:		Ativo								
CTPS:		4116023-1591\BA		Salário Base:		1.548,98		Tipo de Salário:		Mensalista								
Evento						Referência		Tipo						Provento		Desconto		
1		SALARIO BASE				220,00		hora(s)						1.548,98				A
66		LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00		%								619,59		A
108		INSS				7,53		%								116,63		A
187		VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00		%								25,57		A
446		TAXA ASSISTENCIAL				1,50		%								23,23		A
												1.548,98		785,02				
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:				763,96		
Assinatura				1.548,98		1.548,98		123,92		0,00								

Colaborador :	38	VISDAELTON MACEDO DE SOUZA				Admissão:	10/04/2025	Matricula:	38
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	8070636-0010\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	2.455,70				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				982,28	A
108	INSS		8,07	%				198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				36,84	A
							2.455,70	1.242,93	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.212,77	
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				



Empresa: PDN SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

Emissão: 19/12/2025 12:56

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL 2

CNPJ/CEI: 46288407000167

dezembro/2025

Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
1	SALARIO BASE					27.009,24	
129	PROLABORE - SÓCIO					3.500,00	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						10.803,70
108	INSS						2.214,30
111	IRRF						121,38
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						260,50
446	TAXA ASSISTENCIAL						361,03
210	INSS AUTÔNOMO/SÓCIO						385,00
Ocorrências no Mês						30.509,24	14.145,91
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	16.363,33
12	0	0	0	0	0		

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	2.160,77	Valor total base de INSS	30.509,24
FGTS de Rescisão	0,00	DARF - Segurados	2.599,30
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	27.009,24
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	5.401,85
Base do FGTS 8%	27.009,24	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P.= 1,0000%)	810,28
Base FGTS 8% na Rescisão	0,00	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	3.500,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	1.566,54
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	2.599,30	DARF (SÓCIO) 20,000%	700,00
Total salário maternidade(inss)	0,00	DARF - Salário Família	0,00
Total salário maternidade(empregador)	0,00	DARF - Retenção do Tomador	0,00
Base de IRRF	30.509,24	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	11.077,97
Rat Agente Nocivo 09% - Ocorrência 03	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 04	0,00		
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 06	0,00		
Rat Agente Nocivo 09% -Ocorrência 07	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 08	0,00		



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA	CNPJ	46.288.407/0001-67
Período apuração	12/2025	Número do Recibo	50000430644365
Data/Hora da Transmissão	17/01/2026 00:41:46	Identificação da Apuração de Débitos	37257683415 / eSocial 136462177 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	3-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída e não substituída
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000430403270
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	MARQUES DE CARAVELAS	Número	000527
Complemento	EDIF LEINAD LOJA 04	Bairro/Distrito	BARRA
Município	SALVADOR	UF	BA
CEP	40140241	Telefone	7192043755
Correio Eletrônico	GUSTAVOSOUZA.CONTABIL@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	DANIEL PINHEIRO DE MORAIS	CPF	05077409552
Telefone	33450318		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	2.214,30		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.214,30		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	385,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 385,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	5.401,84		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.401,84		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	700,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 700,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	810,27		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 810,27		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	121,38		
Saldo a Pagar	121,38		





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 46.288.407/0001-67	Razão Social PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA		
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26017.8868696-5	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000430644365			Valor Total do Documento 121,38

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	121,38			121,38
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
	Totais	121,38			121,38

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

17/01/2026 00:51:19

85880000001 6 21380385260 0 20071626017 7 88686965284 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000001 6 21380385260 0 20071626017 7 88686965284 0



CNPJ: 46.288.407/0001-67
Número: 07.16.26017.8868696-5
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 121,38

Pague com o PIX





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 20/01/2026 - 15h41

Nº de controle: 717.374.300.775.368.842

Conta: **Agência: 3231 | Conta: 0405500-4**

Empresa: **PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA**

Dados de quem
recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**

Agência: **1607**

Conta: **333666-2**

Dados do Pagamento

Valor: **R\$ 121,38**

Descrição: **07162601788686965043108065**

Identificação: **E60746948202601201841C3231wKv59U**

TXID: **07162601788686965043108065**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.160,67

CPF/CNPJ do Empregador
46.288.407

Nome/Razão Social do Empregador
PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126011715891072-7

Tag
17/01/2026 00:56

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	11	2.160,67	0,00	0,00	0,00	2.160,67
Total FGTS:		2.160,67	0,00	0,00	0,00	2.160,67

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.160,67

Observações

Data de geração da Guia: 17/01/2026 às 00:56:36 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 20/01/2026 - 15h39

Nº de controle: 717.374.300.775.368.842

Conta: **Agência: 3231 | Conta: 0405500-4**

Empresa: **PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA**

Dados de quem
recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305-5**

Dados do Pagamento

Valor: **R\$ 2.160,67**

Descrição: **1c73f8bfcfa247d7a3a7ee974ffe2e20**

Identificação: **E60746948202601201839C3231uBEIC4**

TXID: **1c73f8bfcfa247d7a3a7ee974ffe2e20**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

**Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.**

**Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**

Ouvidoria **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

