



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: - - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 009-2025

EMPENHO: 162 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 375 Data do Sub-Empenho: 28/04/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA **Tipo Pessoa:** Jurídica

Endereço: ALAMEDA SALVADOR, 001057 **Complemento:** EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE

Bairro: CAMINHO DAS ARVORES **Cidade:** **Estado:**

CNPJ: 23.694.541/0001-62 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**

Conta Corrente: 98783-1 **Agência:** 0334 **Banco:** 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Tipo PIX: **Nº PIX:**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1002.4451.1542 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR **Data do Empenho:** 28/04/2025

Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12 - Educação

Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 004 - EDUCALUZ

Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental

Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte: 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 003-2025PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 001-2025ARP	1.005.000,00	108.000,00	897.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

REFERENTE À REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NA FORMA ESTABELECIDADA NO TERMO DE REFERÊNCIA, E NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS, DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL-SINAPI E NA TABELA ORSE - ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE (BRASIL), LICITAÇÃO 003-2025PE, CONTRATO: 001-2025ARP. ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIS DOS SANTOS - POVOADO LAMEIRO - ESCORREGA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. OBRA Nº 002/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO 01. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/04/2025 À 22/04/2025. NFS-e: 2025282.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
108.000,00	67.411,30	40.588,70

Data do Empenho: 28/04/2025 **Data da Liquidação:** 28/04/2025

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1542 INSS	1.415,64
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000	IRRF - Fonte 1542	808,94
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000	ISS - Fonte 1542	2.022,34
Valor Retido		4.246,92
Valor Líquido		63.164,38

Sessenta e três mil e cento e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	25/04/2025	2025282	U			67.411,30
Quantidade: 1					Total:	67.411,30

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	67.411,30

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 28/04/2025.</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>MARLI NUNES LIMA Secretária de Educação CPF: 930.248.435-15</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 28/04/2025, podendo efetuar o pagamento.</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408</p>
--	---

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA
EM 29/04/25
CARLOS ANTONIO DA SILVA FILHO
CONTROADOR INTERNO
PORTARIA 013/2025

SIAF IC -





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . . - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 009-2025

EMPENHO: 162 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 375 Data do Sub-Empenho: 28/04/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: **5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA** Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: ALAMEDA SALVADOR, 001057 Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE
 Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:
 CNPJ: 23.694.541/0001-62 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta Corrente: 98783-1 Agência: 0334 Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
 Tipo PIX: Nº PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1002.4451.1542 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 28/04/2025

Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Função: 12 - Educação
 Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
 Programa: 004 - EDUCALUZ
 Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 001-2025PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 001-2025ARP	1.005.000,00	108.000,00	897.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE À REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NA FORMA ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, E NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS, DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL-SINAPI E NA TABELA ORSE - ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE (BRASIL). LICITAÇÃO 003-2025PE, CONTRATO: 001-2025ARP.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
108.000,00	67.411,30	40.588,70

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	67.411,30	67.411,30

Sessenta e sete mil e quatrocentos e onze reais e trinta centavos

67.411,30

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 28/04/2025.

MARLI NUNES LIMA
Secretária de Educação
CPF: 930.248.435-15

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 28/04/2025

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408

3866390





MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
2025282
Data e Hora de Emissão
25/04/2025 11:43:05
Código de Verificação
70BDF3488

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço <http://www.laurodefreitas.ba.gov.br> ou através da leitura do QR Code.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.694.541/0001-62** Inscrição Estadual
Inscrição **0010045273**
Nome/Razão **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**
Endereço: **AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305**
Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**
CEP: **42702-400** Email: **RODRIGO_DDD91@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI: **13.807.870/0001-19**
Inscrição Inscrição Estadual: **00000000**
Nome/Razão **MUNICÍPIO DE SANTALUZ**
Endereço: **praça coronel José leitão, 06**
Bairro: **CENTRO** Município: **SANTALUZ** UF: **BA**
CEP: **48880-000** Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **Santaluz**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIS DOS SANTOS - POVOADO LAMEIRO - ESCORREGA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
BM 01

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/04/2025 A 22/04/2025

VALOR: R\$67.411,30

VALOR MÃO DE OBRA 60%: 40.446,78


VALOR DE MATERIAL 40%: 26.964,52

BC DE INSS 60%: 40.446,78 x 3,5%: 1.415,64

BC DE ISS 60%: 40.446,78 x 2,5%: 1.011,17

VALOR LIQUIDO: R\$64.984,49

DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG: 0334 C/C: 98783-1



Franklin de J. ...
Assinatura

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ **67.411,30**

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifi

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: (Lei Municipal 1572/2015)

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
26.964,52	40.446,78	2,50	1011,17	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	1.415,64	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ **64.984,49**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 04/2025 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Percentual de Total da Dedução: **40,0%**



Autentique
Via QR Code



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2025

I.R.R.F

Nº DAM: 405602	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES	INSCRIÇÃO: 31124	
TIPO / NOME LOGRADOURO: AV SANTOS DUMONT			NÚMERO: 1883
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS	UF: BA
DOCUMENTOS			
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 23.694.541/0001-62
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE			
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO			
Base Cálculo: 808,94	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$ 808,94
Taxa Expediente R\$:		Valor Total R\$: 808,94	
DADOS PARA PAGAMENTO			
DATA LANÇAMENTO: 28/04/2025	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2025	DATA EMISSÃO: 29/04/2025 10:49:21
		DATA DE VENCIMENTO: 31/05/2025	
Composição do Imposto/Lançamentos		(-) VALOR DEVIDO - R\$ 808,94	
Valor do Tributo: 808,94	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 808,94		
Taxa de Expediente: 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
Valor de Base Cálculo: 808,94	Vlr. Devido com Desconto: 808,94	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
INSTRUÇÕES: 1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento. 4) NF-e Nº 2025282 - Data de emissão: 25-04-2025		(+) MULTA DE MORA - R\$	
		(+) JUROS DE MORA - R\$	
		(-) VALOR A PAGAR - R\$ 808,94	



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8179000008 . 1 08943906202 . 0 50531010100 . 9 00040560207 . 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8179000008 . 1 08943906202 . 0 50531010100 . 9 00040560207 . 9

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2025

I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 405602	EXERCÍCIO 2025	DATA EMISSÃO: 29/04/2025 10:49:21	DATA VENCIMENTO: 31/05/2025
INSCRIÇÃO: 31124		(-) VALOR DEVIDO - R\$		808,94
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E		(-) VALOR A PAGAR - R\$		808,94





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 405603		CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA			INSCRIÇÃO:		
TIPO / NOME LOGRADOURO SANTOS DUMONT					NÚMERO 1883		
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305			BAIRRO: CENTRO		MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS		
						UF: BA	
DOCUMENTOS							
C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0001-62				R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR							
CONTRIBUINTE TOMADOR: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					C.N.P.J. / CPF: 30.731.257/0001-84		
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO							
Base Cálculo: 40.446,78		Alíquota (%): 5,000		Valor R\$: 2.022,34		Taxa Expediente R\$: Valor Total R\$: 2.022,34	
DADOS PARA PAGAMENTO							
DATA LANÇAMENTO: 28/04/2025		MÊS REFERÊNCIA: Abril		EXERCÍCIO: 2025		DATA EMISSÃO: 28/04/2025 11:56:23	
						DATA DE VENCIMENTO: 31/05/2025	
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 2025282 - DATA DE EMISSÃO: 25-04-2025				(-) VALOR DEVIDO - R\$		2.022,34	
				(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
				(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
				(+) MULTA DE MORA - R\$			
				(+) JUROS DE MORA - R\$			
				(-) VALOR A PAGAR - R\$		2.022,34	



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8172000020 . 3 22343906202 . 5 50531010500 . 0 00040560312 . 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8172000020 . 3 22343906202 . 5 50531010500 . 0 00040560312 . 7

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Abril	Nº DAM: 405603	EXERCÍCIO 2025	DATA 28/04/2025 11:56:23	DATA VENCIMENTO: 31/05/2025
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.022,34
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.022,34



Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 25/04/2025

A empresa:

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA; CNPJ: 23.694.541/0001-62.

Endereço:

AV. Santos Dumont 1883, andar 3, sala 305, centro – LAURO DE FREITAS - BA, CEP 42702-400

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
AÇÃO: FUNDEB
HISTÓRICO: OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIS DOS SANTOS - POVOADO LAMEIRO - ESCORREGA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA Processo Licitatório: Pregão eletrônico 003/2025 Contrato: 001/2025 Processo administrativo: 009-2025 Nº da obra: 002/2025 Nº da Nota Fiscal (Matricula): 2025282 VALOR DA NOTA: R\$ 67.411,30 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/04/2025 a 22/04/2025 DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 01, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 03, DCTFWEB CP 03. CONTA: AGÊNCIA 0334 C/C: 98783-1 BANCO ITAÚ Recurso - FUNDEB

Atenciosamente,


Fiscal de contratos



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE SANTALUZ
Controladoria Interna do Município



ORDEM DE SERVIÇO

OBRA Nº 002-/2025

ATA Nº 001-2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009-2025
MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO PREÇO Nº 003-2025
INÍCIO DA OBRA – 18/03/2025
PRAZO DE CONCLUSÃO – 17/07/2025
VALOR DA OBRA: 208.642,17

A Prefeitura Municipal de Santaluz, considerando o Processo de Pregão Eletrônico de Registro de Preço 015-2022, autoriza a empresa GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO- CNPJ n.º 23.694.541/0001-62, com endereço na Alameda Salvador nº 001057 – Ed. Salvador Shopping Business – Torre Europa – sala 103 - Caminho das Árvores – Salvador – Bahia – Para Iniciar a Obra de Manutenção e Reforma com fornecimento de Materiais, Ferramenta, Equipamentos e Mão de Obra – da Escola Municipal José Luis dos Santos – (Povoado de Lameiro – Escorrega) - Santaluz – Bahia, Conforme Ata nº 001-2025

Santaluz - Bahia, 18 de Março de 2025.

ARISMÁRIO BARBOSA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NA FORMA ESTABELECIDADA NO TERMO DE REFERÊNCIA, E NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS, DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL-SINAPI E NA TABELA ORSE - ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE (BRASIL) NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ BAHIA - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUÍS DOS SANTOS POVOADO DE LAMEIRO (ESCORREGA)

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Bahia
ORSE - 12/2024 - Sergipe

B.D.I.
22,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,15%
Mensalista: 71,72%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	TOTAL S/ DESCONTA	TOTAL C/ DESCONTO (25%)	MEDIÇÃO 01	
			Und	Quant.							QUANT.	PREÇO TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				1	946,76		10.181,56	R\$ 7.636,17		
1.1	99805 SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	195,17	12,15	14,82	2.892,42		R\$ 2.169,31			R\$ 0,00
1.2	4859 ORSE	Remoção de fechadura	un	1	5,66	6,90	6,90		R\$ 5,18			R\$ 0,00
1.3	7215 ORSE	Remoção de metais sanitários (tomeira, registros, chuveiros, etc.)	un	3	20,11	24,53	73,59		R\$ 55,19			R\$ 0,00
1.4	97863 SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2	14,07	17,16	34,32		R\$ 25,74			R\$ 0,00
1.5	7725 ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	138	6,94	8,46	1.167,48		R\$ 875,61	138,00		R\$ 875,61
1.6	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	3,47	62,42	76,15	264,24		R\$ 198,18	3,47		R\$ 198,18
1.7	97626 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	4,86	627,36	765,37	3.719,70		R\$ 2.789,77	4,86		R\$ 2.789,77
1.8	100938 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	108,29	7,65	9,33	1.010,35		R\$ 757,76			R\$ 0,00
1.9	22 ORSE	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m²	42,12	19,71	24,04	1.012,56		R\$ 759,42			R\$ 0,00
2	dez/24					448,47	27.865,98		R\$ 20.899,49			
2.1	151 ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	216,45	52,82	64,44	13.947,91		R\$ 10.460,93	129,87		R\$ 6.276,56
2.2	105023 SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	6,72	69,16	84,37	566,97		R\$ 425,22			R\$ 0,00
2.3	105029 SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	6,72	52,27	63,76	428,47		R\$ 321,35			R\$ 0,00
2.4	8637 ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	m	188,86	52,36	63,87	12.062,49		R\$ 9.046,87	37,77		R\$ 1.809,37
2.5	98546 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	5	141,01	172,03	860,15		R\$ 645,11	5,00		R\$ 645,11
3		REVESTIMENTO				1	1.544,00		38.594,61	R\$ 28.945,96		
3.1	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	432,90	9,22	11,24	4.865,8		R\$ 3.649,31	259,7		R\$ 2.189,59
3.2	87543 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	m²	432,90	27,48	33,52	14.510,67		R\$ 10.883,01	259,7		R\$ 6.529,80
3.3	4850 ORSE	Impermeabilização com vedapren parede ou similar, 03 demãos	m²	42,12	35,75	43,61	1.836,85		R\$ 1.377,64			R\$ 0,00

3.4	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	71,86	128,11	156,29	11.231,00	R\$ 8.423,25	R\$ 0,00
3.5	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	42,12	62,81	76,62	3.227,23	R\$ 2.420,43	R\$ 0,00
3.6	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	19,86	55,64	67,88	1.348,10	R\$ 1.011,07	R\$ 0,00
3.7	88648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	180	7,18	8,75	1.575,00	R\$ 1.181,25	R\$ 0,00
4			COBERTURA		1		495,39	40.504,23	R\$ 30.378,17	
4.1	4370	ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, itabaiana ou similar	m²	201,18	76,22	92,98	18.705,72	R\$ 14.029,29	R\$ 0,00
4.2	247	ORSE	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022	m	26,29	30,63	37,36	982,19	R\$ 736,65	R\$ 0,00
4.3	248	ORSE	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	66,66	7,71	9,40	626,60	R\$ 469,95	R\$ 0,00
4.4	4449	ORSE	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m²	166,05	70,00	85,40	14.180,67	R\$ 10.635,50	R\$ 0,00
4.5	94227	SINAPI	CÁLHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	66,66	61,92	75,54	5.035,50	R\$ 3.776,62	R\$ 0,00
4.6	7393	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, interesse 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	5	159,60	194,71	973,55	R\$ 730,16	R\$ 0,00
5			MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS/ GRADES/ VIDROS/ FERRAGENS		1		2.522,38	7.055,76	R\$ 5.291,82	
5.1	11532	ORSE	Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m²	3,486	758,77	925,69	3.226,96	R\$ 2.420,22	R\$ 0,00
5.2	12105	ORSE	Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme desenho	m²	1,3	470,70	574,25	746,53	R\$ 559,89	R\$ 0,00
5.3	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	192,06	234,31	234,31	R\$ 175,73	R\$ 0,00
5.4	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	6,16	212,98	259,83	1.600,55	R\$ 1.200,41	R\$ 0,00
5.5	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	0,72	411,31	501,79	361,29	R\$ 270,97	R\$ 0,00
5.6	9484	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvnil ou similar)	m²	6,552	21,73	26,51	173,69	R\$ 130,27	R\$ 0,00
5.7	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	5,6	104,28	127,22	712,43	R\$ 534,32	R\$ 0,00
6			PINTURA		1		58,95	21.408,63	R\$ 16.056,47	

6.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023	m²	636,5	4,34	5,29	3.367,09	R\$ 2.525,31	R\$ 0,00
6.2	96135	SINAPI	APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. DUAS DEMAO. AF_03/2024	m²	201,13	30,34	37,01	7.443,82	R\$ 5.582,87	R\$ 0,00
6.3	88489	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES. DUAS DEMAO. AF_04/2023	m²	636,5	13,65	16,65	10.597,73	R\$ 7.948,29	R\$ 0,00
7			INSTALACOES HIDRAULICAS		1		4.237,44	6.511,28	R\$ 4.883,46	
7.1	102610	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021	UN	1	1.928,64	2.352,94	2.352,94	R\$ 1.764,71	R\$ 0,00
7.2	1680	ORSE	Revisao de ponto de esgoto tipo 1	un	4	36,91	45,03	180,12	R\$ 135,09	R\$ 0,00
7.3	1204	ORSE	Revisao de ponto de agua tipo 1	un	4	26,76	32,64	130,56	R\$ 97,92	R\$ 0,00
7.4	624	ORSE	Revisao de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	8	28,84	35,18	281,44	R\$ 211,08	R\$ 0,00
7.5	5003	ORSE	Torneira de bola p/caixa d'agua em pvc d = 3/4"	un	1	38,88	47,43	47,43	R\$ 35,57	R\$ 0,00
7.6	86884	SINAPI	ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6	10,77	13,13	78,78	R\$ 59,09	R\$ 0,00
7.7	104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	18,08	22,05	22,05	R\$ 16,54	R\$ 0,00
7.8	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	UN	2	162,41	198,14	396,28	R\$ 297,21	R\$ 0,00
7.9	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	UN	2	32,34	39,45	78,90	R\$ 59,18	R\$ 0,00
7.10	89386	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	UN	6	15,61	19,04	114,24	R\$ 85,68	R\$ 0,00
7.11	91173	SINAPI	FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO. DIÁMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4". FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	34	4,15	5,06	172,04	R\$ 129,03	R\$ 0,00
7.12	91785	SINAPI	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	46	47,34	57,75	2.656,50	R\$ 1.992,38	R\$ 0,00
8			INSTALACOES ELÉTRICAS		1		1.438,65	7.796,05	R\$ 5.847,04	
8.1	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	M	101,25	4,98	6,07	614,59	R\$ 460,84	R\$ 0,00
8.2	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	M	40	3,71	4,52	180,80	R\$ 135,60	R\$ 0,00
8.3	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020	UN	13	136,12	166,06	2.158,78	R\$ 1.619,09	R\$ 0,00
8.4	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	M	130	11,29	13,77	1.790,10	R\$ 1.342,58	R\$ 0,00
8.5	91982	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	UN	4	44,78	54,63	216,52	R\$ 163,89	R\$ 0,00
8.6	91986	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	UN	9	33,71	41,12	370,08	R\$ 277,56	R\$ 0,00



 Prefeito Municipal
 02/08/2024



OBRAS DE REFORMA E
 MANUTENÇÃO DE
 OBRAS DE REFORMA E
 MANUTENÇÃO DE

8.7	92001	SINAPI	UN	6	30,91	37,71	226,26	R\$ 169,70	R\$ 0,00
8.10	97600	SINAPI	UN	4	340,32	415,19	1.660,76	R\$ 1.245,57	R\$ 0,00
8.11	91931	SINAPI	M	35	10,34	12,61	441,35	R\$ 331,01	R\$ 0,00
8.12	101938	SINAPI	UN	1	110,50	134,81	134,81	R\$ 101,11	R\$ 0,00
9				1		3.934,02	5.179,66	R\$ 3.884,75	
9.1	86914	SINAPI	UN	3	105,26	128,41	385,23	R\$ 288,92	R\$ 0,00
9.2	2056	ORSE	un	4	23,70	28,91	115,64	R\$ 86,73	R\$ 0,00
9.3	86889	SINAPI	UN	1	619,32	755,57	755,57	R\$ 566,66	R\$ 0,00
9.4	2097	ORSE	un	1	1.023,30	1.248,42	1.248,42	R\$ 936,32	R\$ 0,00
9.5	86932	SINAPI	UN	4	548,12	668,70	2.674,80	R\$ 2.006,10	R\$ 0,00
10				1		425,12	1.248,00	R\$ 936,00	
10.1	91181	SINAPI	M	40	25,58	31,20	1.248,00	R\$ 936,00	R\$ 0,00
11				1		2,85	504,88	R\$ 378,66	
11.1	2450	ORSE	m²	177,15	2,34	2,85	504,88	R\$ 378,66	R\$ 0,00
12				1		4.049,34	93.537,97	R\$ 70.153,48	
12.1	92762	SINAPI	KG	254,21	11,44	13,95	3.546,23	R\$ 2.659,67	R\$ 1.595,80
12.2	103689	SINAPI	m³	8,21	999,32	1.219,17	10.009,39	R\$ 7.507,04	R\$ 4.504,22
12.3	104919	SINAPI	KG	294,4	13,34	16,27	4.789,89	R\$ 3.592,42	R\$ 2.155,45
12.4	103682	SINAPI	m³	10,26	1.017,96	1.241,91	12.742,00	R\$ 9.656,50	R\$ 5.733,90
12.5	96523	SINAPI	m³	19,97	103,78	126,61	2.528,40	R\$ 1.896,30	R\$ 1.137,78

[Handwritten signature]
 17/09/2024
 17/09/2024



[Small handwritten text]
 17/09/2024
 17/09/2024

12.6	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m²	8,64	781,08	952,91	8.233,14	R\$ 6.174,86	5,18	R\$ 3.704,91
12.7	92264	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	41,4	199,86	243,82	10.094,15	R\$ 7.570,61	24,84	R\$ 4.542,37
12.8	92266	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	205	147,67	180,15	36.930,75	R\$ 27.698,06	123,00	R\$ 16.618,84
12.9	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	85,5	44,72	54,55	4.664,03	R\$ 3.498,02	51,30	R\$ 2.098,81
13			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA				201,05	17.800,96	R\$ 13.350,72		
13.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	128	38,85	47,39	6.065,92	R\$ 4.549,44	38,40	R\$ 1.364,83
13.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60	122,30	149,20	8.952,00	R\$ 6.714,00	18,00	R\$ 2.014,20
13.3	13042	ORSE	Deslocamento de Equipe Técnica (Engenheiro/Técnico/Auxiliar/Motorista) por veículo - Rev 01	km	624	3,66	4,46	2.783,04	R\$ 2.087,28	187,20	R\$ 626,18

278.189,56	R\$ 208.642,17	BM 01:	R\$ 67.411,30
------------	----------------	--------	---------------


GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0

TOTAL CONTRATUAL
TOTAL DA OBRA
SALDO CONTRATUAL

12.603.197,30
 208.642,17
 12.394.555,13


 Francisco de Lencastre
 Engenheiro de Obras
 CREA-BA 051602557-0



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.694.541/0001-62
Razão Social: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOE
Endereço: - AV SANTOS DUMONT - / CENTRO / LAURO DE FREITAS / BA / 42702-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/04/2025 a 13/05/2025

Certificação Número: 2025041407582530992725

Informação obtida em 21/04/2025 10:41:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Certidão nº: 11323792/2025

Expedição: 26/02/2025, às 13:03:48

Validade: 25/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.694.541/0001-62**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

CNPJ: 13.927.819/0001-40

Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO CADASTRO MOBILIÁRIO

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 20/02/2025, sob processo de nº .

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Física / Jurídica GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o nº. 23694541000162, encontra-se quite com os tributos municipais referentes à inscrição municipal nº. 10045273.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301, §1º, da Lei nº. 1.572/2015 do Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 20/02/2025 13:58:48, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 616571000065493920250220

Emitida via Internet, às 13:58:47 hs, do dia 20/02/2025

Validade: 90 dias.

OBSERVAÇÃO:

- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br>;
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20251496767**

RAZÃO SOCIAL	
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LT	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
128.887.871 - BAIXADO	23.694.541/0001-62

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 18/03/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA/
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
CNPJ: 23.694.541/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:22:47 do dia 14/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/07/2025.

Código de controle da certidão: **DC72.4540.54C3.B2D1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CNPJ 23.694.541/0001-62	Razão Social GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25100.4920065-8	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000331974628			Valor Total do Documento 1.549,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	402,70			402,70
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	651,95			651,95
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	260,78			260,78
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025 CNO:90.017.87716/72	75,50			75,50
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025 CNO:90.017.87716/72	113,25			113,25
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025 CNO:90.017.87716/72	45,30			45,30
Totais		1.549,48			1.549,48

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000015 0 49480385251 0 07071625100 1 49200658037 5



CNPJ: 23.694.541/0001-62
Número: 07.16.25100.4920065-8
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 1.549,48

Pague com o PIX



PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Nome Empresarial: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 10/04/2025

Número de Controle: 20.51.54.86.28

Número da Declaração: 20515.48628.100425.1.3.15-5878

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Retenção - Lei nº 9.711/98

Oriundo de Ação Judicial: Não

Crédito de Sucedida: Não

Competência: 02/2025

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 1.534,14

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP TERCEIROS	1.549,48

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

CPF: 039.200.175-60

Telefone:

Celular: (71)99103-2747

Correio Eletrônico: gustavosouza.contabil@gmail.com

Versão: 8.30

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 10/04/2025 às 11:20:33
2648180799

20.51.54.86.28

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.



Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.081,01

CPF/CNPJ do Empregador
23.694.541

Nome/Razão Social do Empregador
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125041064540140-0

Tag
10/04/2025 11:05

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	22	4.081,01	0,00	0,00	0,00	4.081,01
Total FGTS:		4.081,01	0,00	0,00	0,00	4.081,01

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 4.081,01

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 10/04/2025 às 11:05:52 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





✓ Pix enviado
R\$ 4.081,01

Sobre a transação

Data do pagamento **Quinta, 10/04/2025**
Horário **11h35**
Identificador **ae0444352c044e0392ab7c236e8e1243**
ID da transação **E00416968202504101434uNUYxDeBmcZ**

Quem recebeu

Nome **Caixa Economica Federal**
CPF/CNPJ **00.360.305/0001-04**
Instituição **Caixa Economica Federal**

Quem pagou

Nome **GLOBAL MATERIAIS SERVICOS E MANUTEN**
CPF/CNPJ **23.694.541/0001-62**
Instituição **Banco Inter S.A.**

Fale com a gente

Capitais e regiões metropolitanas: **3003 4070**
Demais localidades: **0800 940 0007**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**
Ouvidoria: **0800 940 7772**



IRRF

CNPJ 23.694.541/0001-62	Razão Social GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25100.4940977-8	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000331974628			Valor Total do Documento 623,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	623,22			623,22
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	Totais	623,22			623,22

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000006 0 23220385251 7 07071625100 1 49409778418 8



CNPJ: 23.694.541/0001-62
Número: 07.16.25100.4940977-8
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 623,22

Pague com o PIX





✓ Pix enviado
R\$ 623,22

Sobre a transação

Data do pagamento **Quinta, 10/04/2025**
Horário **11h35**
Identificador **07162510049409778046683152**
ID da transação **E004169682025041014351E8kSrowN4J**

Quem recebeu

Nome **Receita Federal**
CPF/CNPJ **00.394.460/0058-87**
Instituição **Bco do Brasil S.A.**

Quem pagou

Nome **GLOBAL MATERIAIS SERVICOS E MANUTEN**
CPF/CNPJ **23.694.541/0001-62**
Instituição **Banco Inter S.A.**

Fale com a gente

Capitais e regiões metropolitanas: **3003 4070**
Demais localidades: **0800 940 0007**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**
Ouvidoria: **0800 940 7772**



Relatório de Lançamento de Rubricas

Estabelecimento: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA - Matriz		Tomador: GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA				
Evento: IRRF		Período: março/2025 à março/2025				
Departamento	Colaborador	Exercício	Base	Referência	Provento	Desconto
GERAL.	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA	03/2025	4.260,41	22,50		295,82
GERAL.	MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	03/2025	3.634,24	15,00		163,70
GERAL.	OSVALDO BORGES TELES FILHO	03/2025	3.634,24	15,00		163,70
Sub total:					0,00	623,22
Total Geral:					0,00	623,22



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.081,01
Número da Guia: 0125041064540140-0 **Data Emissão:** 10/04/2025 11:05:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.694.541/0001-62		Sem Tomador											
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ADILSON SPINELLE DOS SANTOS	42	671.013.805-49	101	17/04/2025	Mensal	2.740,70	219,25	0,00	0,00	0,00	219,25
03/2025		ANDRE DE SOUZA BISPO	43	788.635.035-91	101	17/04/2025	Mensal	1.841,22	147,29	0,00	0,00	0,00	147,29
03/2025		ANTONIO ALVES DA SILVA	26	880.125.575-68	101	17/04/2025	Mensal	1.841,22	147,29	0,00	0,00	0,00	147,29
03/2025		CLEBER FERREIRA MELO	56	797.743.695-72	101	17/04/2025	Mensal	716,66	57,33	0,00	0,00	0,00	57,33
03/2025		FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	101	17/04/2025	Mensal	2.740,70	219,25	0,00	0,00	0,00	219,25
03/2025		JAILSON ALVES DOS SANTOS	25	006.662.855-51	101	17/04/2025	Mensal	2.740,70	219,25	0,00	0,00	0,00	219,25
03/2025		JOCELINO SANTANA DOS SANTOS	30	358.563.228-94	101	17/04/2025	Mensal	2.740,70	219,25	0,00	0,00	0,00	219,25
03/2025		JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	14	637.012.785-04	101	17/04/2025	Mensal	2.240,95	179,27	0,00	0,00	0,00	179,27
03/2025		MAICON QUEIROZ KONIG	52	054.385.415-90	101	17/04/2025	Mensal	2.740,70	219,25	0,00	0,00	0,00	219,25
03/2025		MARCELO BISPO DOS SANTOS	34	024.081.435-51	101	17/04/2025	Mensal	1.638,98	131,11	0,00	0,00	0,00	131,11
03/2025		MARCIO DOS SANTOS LISBOA	31	947.555.745-87	101	17/04/2025	Mensal	2.013,00	161,04	0,00	0,00	0,00	161,04
03/2025		MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51	859.291.315-20	101	17/04/2025	Mensal	4.199,04	335,92	0,00	0,00	0,00	335,92
03/2025		OSVALDO BORGES TELES FILHO	22	356.453.185-87	101	17/04/2025	Mensal	4.199,04	335,92	0,00	0,00	0,00	335,92
03/2025		REGINALDO CONCEIÇÃO SANTOS	27	021.482.225-70	101	17/04/2025	Mensal	2.740,70	219,25	0,00	0,00	0,00	219,25
03/2025		ROBERT OLVEIRA CARMO	24	075.203.675-09	101	17/04/2025	Mensal	1.638,98	131,11	0,00	0,00	0,00	131,11
03/2025		ROSANGELA SODRE BACELAR	53	776.394.995-34	101	17/04/2025	Mensal	1.826,49	146,11	0,00	0,00	0,00	146,11
03/2025		TAIARA SOARES DE CASTRO	58	984.807.155-53	101	17/04/2025	Mensal	484,09	38,72	0,00	0,00	0,00	38,72
03/2025		VIDAL MENDES DA SILVA	36	419.317.425-53	101	17/04/2025	Mensal	2.740,70	219,25	0,00	0,00	0,00	219,25
03/2025		WALES COSTA CRUZ	46	059.147.905-22	101	17/04/2025	Mensal	1.638,98	131,11	0,00	0,00	0,00	131,11
Total do Tomador							Sem Tomador	43.463,55	3.476,97	0,00	0,00	0,00	3.476,97
Total do Estabelecimento							23.694.541/0001-62	43.463,55	3.476,97	0,00	0,00	0,00	3.476,97
Total FGTS								51.014,20	4.081,01	0,00	0,00	0,00	4.081,01



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.081,01
Número da Guia: 0125041064540140-0 **Data Emissão:** 10/04/2025 11:05:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Trabalhadores

Comp. Apreciação		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025			GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO	17	944.964.205-20	101	17/04/2025	Mensal	2.740,70	219,25	0,00	0,00	0,00	219,25
03/2025			GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031.681.375-37	101	17/04/2025	Mensal	2.740,70	219,25	0,00	0,00	0,00	219,25
03/2025			OZIAS COSTA DE JESUS	15	007.206.525-70	101	17/04/2025	Mensal	2.069,25	165,54	0,00	0,00	0,00	165,54
Total do Tomador								Sem Tomador	7.550,65	604,04	0,00	0,00	0,00	604,04
Total do Estabelecimento								90.017.87716/72	7.550,65	604,04	0,00	0,00	0,00	604,04
Total FGTS									51.014,20	4.081,01	0,00	0,00	0,00	4.081,01



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.081,01
Número da Guia: 0125041064540140-0 **Data Emissão:** 10/04/2025 11:05:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2025	101	19	43.463,55	3.476,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,97	
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	43.463,55	3.476,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,97	

Estabelecimento: 90.017.87716/72											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2025	101	3	7.550,65	604,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,04	
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	7.550,65	604,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,04	
Total FGTS			51.014,20	4.081,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,01	

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conselheiro
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador tecido/exercente em outro órgão/órgão auxiliar - informação prestada pelo aposentado/reservista
- 701 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte Individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte Individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte Individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte Individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de Confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
- 805 - Artista não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.081,01
Número da Guia: 0125041064540140-0 **Data Emissão:** 10/04/2025 11:05:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Estabelecimentos

Comp. Ajustação	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	23.694.541/0001-62	19	43.463,55	3.476,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,97
03/2025	90.017.87716/72	3	7.550,65	604,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,04
		Total FGTS	51.014,20	4.081,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,01





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.081,01
Número da Guia: 0125041064540140-0 **Data Emissão:** 10/04/2025 11:05:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	11 - FGTS mensal	19	43.463,55	3.476,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,97
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	43.463,55	3.476,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,97

Estabelecimento: 90.017.87716/72

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	11 - FGTS mensal	3	7.550,65	604,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,04
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	7.550,65	604,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,04
Total FGTS			51.014,20	4.081,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,01





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.081,01
Número da Guia: 0125041064540140-0 **Data Emissão:** 10/04/2025 11:05:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador;	Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2025	22	51.014,20	4.081,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,01	
	Total FGTS	51.014,20	4.081,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,01	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	23.694.541/0001-62
Nome	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Período de apuração	03/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	31844661963 / eSocial 106670904 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 4.752,36	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 14.040,70	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 2.958,77	R\$ 1.549,48
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 623,22	R\$ 623,22
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 22.375,05	R\$ 2.172,70

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF	020.200.175-60
Telefone	-



DCTFWeb recebida via internet pelo Agente Receptor SERPRO em 10/04/2023 10:55:20

Nº do recibo de entrega 0000050000331974628

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 23.694.541/0001-62



**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	CNPJ	23.694.541/0001-62
Período apuração	03/2025	Número do Recibo	50000331974628
Data/Hora da Transmissão	10/04/2025 10:53:26	Identificação da Apuração de Débitos	31844661963 / eSocial 106670904 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000331108438
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SANTOS DUMONT	Número	1883
Complemento	ANDAR 3 SALA 305	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	LAURO DE FREITAS	UF	BA
CEP	42702400	Telefone	7197002129
Correio Eletrônico	RODRIGO_DDD91@HOTMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA	CPF	03920017560
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	4.202,36		
Deduções	Salário Família: 160,33 Retenção Lei 9711/98: 4.042,03		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	550,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 550,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	8.692,71		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 8.692,71		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	15,10		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 15,10		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	434,63		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 31,93		
Saldo a Pagar	402,70		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	75,50		
Saldo a Pagar	75,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	113,25		
Saldo a Pagar	113,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	45,30		
Saldo a Pagar	45,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	651,95		
Saldo a Pagar	651,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	260,78		
Saldo a Pagar	260,78		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	623,22		
Saldo a Pagar	623,22		





DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Data de Criação	10/04/2025
Data de Transmissão	10/04/2025
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Retenção - Lei nº 9.711/98
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

- 1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
- 2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;
- 3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou
- 4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não





EDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PERDCOMP 8.3

NPJ 23.694.541/0001-62

20515.48628.100425.1.3.15-5878

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CNPJ	039.200.175-60
Telefone Celular	(71) 991032747
Endereço Eletrônico	gustavosouza.contabil@gmail.com

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA
CNPJ	013.598.325-80
CRC	043222
UF	BA
Telefone Celular	(71) 991032747
Endereço Eletrônico	gustavosouza.contabil@gmail.com





EDITADO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PERDCOMP 8.3
CNPJ 23.694.541/0001-62 20515.48628.100425.1.3.15-5878

RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Não
Crédito de Sucédida	Não
CNPJ do Estabelecimento Detentor do Crédito	23.694.541/0001-62
Competência	Fevereiro de 2025
Alíquota Acumulada	1,00%
Crédito Passível de Restituição	47.683,42
Crédito Original na Data da Entrega	3.000,00
Crédito Atualizado	3.030,00
Total dos Débitos deste Documento	1.549,48
Total do Crédito Original Utilizado neste Documento	1.534,14
Saldo do Crédito Original	1.465,86

DETALHAMENTO – RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

001. Competência	02/2025
CNPJ/CEI	23.694.541/0001-62
Número da EFD-REINF	8318290-01-2099-2502-8318290
Data de Fechamento EFD-REINF	12/03/2025
Valor das Retenções	66.224,41
Deduções em DCTFWeb	18.540,99

DEDUÇÕES DCTFWeb – RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

Número da DCTFWeb	050000323798262
Data da Transmissão DCTFWeb	19/03/2025
Valor Total das Deduções DCTFWeb	18.540,99
Valor Total das Deduções DCTFWeb 13º	0,00





EDITO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PERDCOMP 8.3

CNPJ 23.694.541/0001-62

20515.48628.100425.1.3.15-5878

CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE EFD-REINF

001. CNPJ do Tomador	13.096.029
Valor da Retenção	26.924,34
002. CNPJ do Tomador	13.807.870
Valor da Retenção	29.026,71
003. CNPJ do Tomador	13.825.500
Valor da Retenção	3.421,36
004. CNPJ do Tomador	13.894.878
Valor da Retenção	6.852,00
VALOR TOTAL DA RETENÇÃO	66.224,41





EDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PERDCOMP 8.3
 NPJ 23.694.541/0001-62 20515.48628.100425.1.3.15-5878

01. Débito CP Terceiros

NPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62	
Débito de Sucédida	Não	
Grupo de Tributo	CP Terceiros	
Código da Receita/Denominação	1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI	
Débito Controlado em Processo	Não	
Período de Apuração	Março de 2025	
Periodicidade	Mensal	
Data de Vencimento do Tributo/Quota	17/04/2025	
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000331974628	
Data de Transmissão DCTFWeb	10/04/2025	
Categoria DCTFWeb	Geral	
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não	
Periodicidade DCTFWeb	Mensal	
Período Apuração DCTFWeb	03/2025	
Principal		402,70
Multa		0,00
Juros		0,00
Total		402,70

02. Débito CP Terceiros

NPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Março de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	17/04/2025





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PERDCOMP 8.3

CNPJ 23.694.541/0001-62 20515.48628.100425.1.3.15-5878

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000331974628	
Data de Transmissão DCTFWeb	10/04/2025	
Categoria DCTFWeb	Geral	
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72	
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não	
Periodicidade DCTFWeb	Mensal	
Período Apuração DCTFWeb	03/2025	
Principal		75,50
Multa		0,00
Juros		0,00
Total		75,50

003. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62	
Débito de Sucedida	Não	
Grupo de Tributo	CP Terceiros	
Código da Receita/Denominação	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI	
Débito Controlado em Processo	Não	
Período de Apuração	Março de 2025	
Periodicidade	Mensal	
Data de Vencimento do Tributo/Quota	17/04/2025	
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000331974628	
Data de Transmissão DCTFWeb	10/04/2025	
Categoria DCTFWeb	Geral	
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72	
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não	
Periodicidade DCTFWeb	Mensal	
Período Apuração DCTFWeb	03/2025	
Principal		113,25
Multa		0,00
Juros		0,00
Total		113,25





NPJ 23.694.541/0001-62 20515.48628.100425.1.3.15-5878

04. Débito CP Terceiros

NPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62	
Débito de Sucédida	Não	
Grupo de Tributo	CP Terceiros	
Código da Receita/Denominação	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI	
Débito Controlado em Processo	Não	
Período de Apuração	Março de 2025	
Periodicidade	Mensal	
Data de Vencimento do Tributo/Quota	17/04/2025	
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000331974628	
Data de Transmissão DCTFWeb	10/04/2025	
Categoria DCTFWeb	Geral	
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não	
Periodicidade DCTFWeb	Mensal	
Período Apuração DCTFWeb	03/2025	
Principal		651,95
Multa		0,00
Juros		0,00
Total		651,95

05. Débito CP Terceiros

NPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62	
Débito de Sucédida	Não	
Grupo de Tributo	CP Terceiros	
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE	
Débito Controlado em Processo	Não	
Período de Apuração	Março de 2025	
Periodicidade	Mensal	
Data de Vencimento do Tributo/Quota	17/04/2025	





CNPJ 23.694.541/0001-62 20515.48628.100425.1.3.15-5878

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000331974628
Data de Transmissão DCTFWeb	10/04/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.017.87716/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	03/2025
Principal	45,30
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	45,30

006. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	23.694.541/0001-62
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Março de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	17/04/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000331974628
Data de Transmissão DCTFWeb	10/04/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	03/2025
Principal	260,78
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	260,78






PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO		PERDCOMP 8.3
CNPJ 23.694.541/0001-62		20515.48628.100425.1.3.15-5878
TOTAL	1.549,48	



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIS DOS SANTOS - POVOADO LAMEIRO - ESCORREGA ESCOLA DO POVOADO DO ESCORREGA ATA Nº 001-2025					S	X	T	Q	Q	S	S	D
					EFETIVO PESSOAL							
ATA Nº 001-2025		PREGAO ELETRONICO Nº 003-2025		RDO:	01		CATEGORIA		QTDE			
Condições Climáticas		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA				
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS					Engenheiro							
					Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral							
ORDEM DE SERVIÇO					Hh DO DIA							
					MÃO DE OBRA DIRETA							
CONSIDERAÇÕES					Topografo							
					Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
OBSERVAÇÕES					Hh DO DIA							
					RESUMO DO EFETIVO							
					EFETIVO DO DIA							
					JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					TIPO Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:							
Data: 18/03/2025					Data: 18/03/2025							


GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA.051602557-0


 Franklin de Jesus


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data														
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIS DOS SANTOS - POVOADO LAMEIRO - ESCORREGA ESCOLA DO POVOADO DO ESCORREGA ATA Nº 001-2025					<table border="1"> <tr> <td>S</td><td>T</td><td>X</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td><td>D</td> </tr> </table>							S	T	X	Q	Q	S	S	D
												S	T	X	Q	Q	S	S	D
PREGAO ELETRONICO Nº 003-2025 RDO: 02					CATEGORIA		QTDE												
Condições Climáticas	Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA												
SIMBOLOGIA	1 - Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3 - Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra												
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS PLACA DA OBRA							Engenheiro					1							
							Tec. de Segurança												
							AUX ADM												
							Mestre de obra												
							Encarregado geral					1							
							Hh DO DIA												
							MÃO DE OBRA DIRETA												
Topografo																			
Auxiliar de topografia																			
Pedreiro					1														
Ajudante Geral					1														
Calceteiro																			
Carpinteiro																			
Operador de Motosserra																			
Motorista																			
Montador																			
Montador/Eletricista																			
Eletricista																			
Operador de Patrol																			
Operador de Escavadeira																			
Operador de Pá carregadeira																			
Motorista de caçamba																			
Pintor																			
Serralheiro																			
Hh DO DIA																			
CONSIDERAÇÕES							RESUMO DO EFETIVO												
					EFETIVO DO DIA														
					JORNADA DE TRABALHO														
					Hh DO DIA														
					Hh ACUMULADO														
OBSERVAÇÕES							EFETIVO EQUIPAMENTOS												
					TIPO		QTDE.												
					Veículo Leve														
					Caminhão Munck														
					Caminhão Toco														
					Escavadeira														
					Pá carregadeira														
					Caçamba														
					Patrol														
					PC 200														
					Placa Vibratória														
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:														
Data: 19/03/2025					Data: 19/03/2025														


GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602567-0


Franklin de Jesus
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 0088943-1


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIS DOS SANTOS - POVOADO LAMEIRO - ESCORREGA ESCOLA DO POVOADO DO ESCORREGA ATA N° 001-2025						S T Q Q S S D						
						EFETIVO PESSOAL						
PREGAO ELETRONICO N° 003-2025			RDO: 03			CATEGORIA		QTDE				
Condições Climáticas Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom		2 - Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS						Engenheiro 1						
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023						Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023						Hh DO DIA						
						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 1 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
						Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 20/03/2025				FISCALIZAÇÃO: Data: 20/03/2025								


GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0


Franklin de L. Sena
 Engenheiro CI
 CREA-BA 008943-7


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIS DOS SANTOS - POVOADO LAMEIRO - ESCORREGA ESCOLA DO POVOADO DO ESCORREGA ATA N° 001-2025						S	T	Q	Q	X	S	S	D
						EFETIVO PESSOAL							
ATA N° 001-2025		PREGAO ELETRONICO N° 003-2025		RDO: 04		CATEGORIA		QTDE					
Condições Climáticas Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()						MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Engenheiro 1							
						DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023						Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1	
						Hh DO DIA							
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topografo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro 1							
						Ajudante Geral 1							
						Calceteiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motoserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pá carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pintor							
						Serralheiro							
						Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO							
						Veiculo Leve							
						Caminhão MuncK							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
PC 200													
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 21/03/2025						Data: 21/03/2025							


GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602567-0


Franklin de J. Sena
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602567-0


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIS DOS SANTOS - POVOADO LAMEIRO - ESCORREGA ESCOLA DO POVOADO DO ESCORREGA ATA Nº 001-2025						S T Q Q S S D						
						PREGAO ELETRONICO Nº 003-2025 RDO: 05						EFETIVO PESSOAL
Condições Climáticas Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()						CATEGORIA QTDE						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						MÃO DE OBRA INDIRETA						
SEM SERVIÇO						Gerente de Obra						
						Engenheiro 1						
						Tec. de Segurança						
						Aux Adm 1						
						mestre de obra						
						Encarregado geral 1						
						Hh DO DIA						
						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topografo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro 1						
						Ajudante Geral 1						
						Calceteiro						
						Carpinteiro						
						Operador de Motosserra						
						Motorista						
						Montador						
						Montador/Eletricista						
						Eletricista						
						Operador de Patrol						
						Operador de Escavadeira						
						Operador de Pá carregadeira						
						Motorista de caçamba						
						Pintor						
						Serralheiro						
						Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO QTDE.						
						Veículo Leve						
						Caminhão Munck						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira						
						Pá carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
PC 200												
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 22/03/2025						Data: 22/03/2025						


GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0


 Franklin de Souza


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
					S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIS DOS SANTOS - POVOADO LAMEIRO - ESCORREGA												
ESCOLA DO POVOADO DO ESCORREGA ATA Nº 001-2025												
		PREGAO ELETRONICO Nº 003-2025	RDO: 06	CATEGORIA	QTDE							
Condições Climáticas	Manhã: (1)		Tarde: (1)	Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRECTA						
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					Gerente de Obra						
SEM SERVIÇO					SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS							
					Engenheiro							1
					Tec. de Segurança							
					Aux ADM							
					Mestre de obra							
					Encargado geral							1
Hh DO DIA												
					MÃO DE OBRA DIRETA							
Topografo												
Auxiliar de topografia												
Pedreiro							1					
Ajudante Geral							1					
Calceteiro												
Carpinteiro												
Operador de Motosserra												
Motorista												
Montador												
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor												
Serralheiro												
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO							
					EFETIVO DO DIA							
					JORNADA DE TRABALHO							
					Hh DO DIA							
					Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					TIPO							
					QTDE.							
					Veiculo Leve							
					Caminhão MuncK							
					Caminhão Toco							
					Escavadeira							
					Pá carregadeira							
					Caçamba							
					Patrol							
					PC 200							
					Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:							
Data: 23/03/2025					Data: 23/03/2025							


GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Canalla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0


Franklin de Lencina
 Engenheiro


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data	X									
				S	T	Q	Q	S	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIS DOS SANTOS - POVOADO LAMEIRO - ESCORREGA ESCOLA DO POVOADO DO ESCORREGA ATA N° 001-2025				PREGAO ELETRONICO N° 003-2025				RDO: 07		EFETIVO PESSOAL				
Condições Climáticas Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA		QTDE								
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra										
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023				Engenheiro 1										
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023				Tec. de Segurança Aux ADM mestre de obra encarregado geral 1										
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024														
				Hh DO DIA										
				MÃO DE OBRA DIRETA										
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 1 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro										
				Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO										
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS										
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Piaça Vibratória										
GERENTE DE OBRA: Data: 24/03/2025				FISCALIZAÇÃO: Data: 24/03/2025										


 GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0


 Franklin de Oliveira
 Eng. Civil

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIS DOS SANTOS - POVOADO LAMEIRO - ESCORREGA ESCOLA DO POVOADO DO ESCORREGA ATA N° 001-2025						EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()						MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Engenheiro 1						
						Tec. de Segurança						
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023						Aux Adm						
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023						Mestre de obra						
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024						Encarregado geral 1						
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024												
						Hh DO DIA						
						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topografo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro 1						
						Ajudante Geral 2						
						Calceteiro						
						Carpinteiro						
						Operador de Motosserra						
						Motorista						
						Montador						
						Montador/Eletricista						
						Eletricista						
						Operador de Patrol						
						Operador de Escavadeira						
						Operador de Pá carregadeira						
						Motorista de caçamba						
						Pintor						
						Serralheiro						
						Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO						
						QTDE.						
						Veículo Leve						
						Caminhão Munck						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira						
						Pá carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
						PC 200						
						Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 25/03/2025						Data: 25/03/2025						


GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0


 Franck de S. Senna
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIS DOS SANTOS - POVOADO LAMEIRO - ESCORREGA ESCOLA DO POVOADO DO ESCORREGA ATA N° 001-2025						S T X Q Q S S D						
						PREGAO ELETRONICO N° 003-2025 RDO: 09						EFETIVO PESSOAL
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()						MAO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS						Engenheiro 1						
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023						Tec. de Segurança Aux Adm mestre de obra Encarregado geral 1						
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023												
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020												
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024												
						Hh DO DIA						
						MAO DE OBRA DIRETA						
						Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
						Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 26/03/2025						Data: 26/03/2025						


GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602567-0


 Franklin de J. Sousa
 Engenheiro


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data										
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIS DOS SANTOS - POVOADO LAMEIRO - ESCORREGA ESCOLA DO POVOADO DO ESCORREGA ATA Nº 001-2025						S	T	Q	Q	X	S	S	D	EFETIVO PESSOAL		
						PREGAO ELETRONICO Nº 003-2025			RDO:	10	CATEGORIA		QTDE			
Condições Climáticas Manhã: (1) Tarde: (1) Norte: ()						MÃO DE OBRA INDIRETA										
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Gerente de Obra										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Engenheiro 1										
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020						Tec. de Segurança										
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024						AUX ADM										
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022						Mestre de obra										
						Encarregado geral 1										
						Hh DO DIA										
						MÃO DE OBRA DIRETA										
						Topografo										
						Auxiliar de topografia										
						Pedreiro 1										
						Ajudante Geral 2										
						Calceteiro										
						Carpinteiro										
						Operador de Motosserra										
						Motorista										
						Montador										
						Montador/Eletricista										
						Eletricista										
						Operador de Patrol										
						Operador de Escavadeira										
						Operador de Pá carregadeira										
						Motorista de caçamba										
						Pintor										
						Serralheiro										
						Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO										
						EFETIVO DO DIA										
						JORNADA DE TRABALHO										
						Hh DO DIA										
						Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS										
						TIPO				QTDE.						
						Veículo Leve										
						Caminhão MuncK										
						Caminhão Toco										
						Escavadeira										
						Pá carregadeira										
						Caçamba										
						Patrol										
						PC 200										
						Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:										
Data: 27/03/2025						Data: 27/03/2025										


GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051802557-0


 Francisco de S. Silva


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIS DOS SANTOS - POVOADO LAMEIRO - ESCORREGA ESCOLA DO POVOADO DO ESCORREGA ATA Nº 001-2025						S T Q Q X S S D EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()						MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09						Engenheiro 1						
						Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
						Hh DO DIA						
						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topografo						
						Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
						Hh DO DIA						
						RESUMO DO EFETIVO						
CONSIDERAÇÕES						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO QTDE.						
						Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 28/03/2025						Data: 28/03/2025						


 GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0


 Franklin de Lencina
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	Q	S	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIS DOS SANTOS - POVOADO LAMEIRO - ESCORREGA ESCOLA DO POVOADO DO ESCORREGA ATA N° 001-2025						EFETIVO PESSOAL							
ATA N° 001-2025		PREGAO ELETRONICO N° 003-2025		RDO: 12									CATEGORIA
Condições Climáticas Manhã: (1) Tarde: (1) Noite:]						MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS SEM SERVIÇO						Hh DO DIA							
						MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motoserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
						Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA: Data: 29/03/2025						FISCALIZAÇÃO: Data: 29/03/2025							


GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0


 Martin de L. S. Silva
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIS DOS SANTOS - POVOADO LAMEIRO - ESCORREGA ESCOLA DO POVOADO DO ESCORREGA ATA Nº 001-2025						S T Q Q S S D							
						PREGAO ELETRONICO Nº 003-2025 RDO: 13						EFETIVO PESSOAL	
Condições Climáticas Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()						CATEGORIA				QTDE			
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						MÃO DE OBRA INDIRETA							
SEM SERVIÇO						Gerente de Obra							
						Engenheiro 1							
						Tec. de Segurança							
						Aux Adm mestre de obra encarregado geral 1							
						Hh DO DIA							
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topografo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro 1							
						Ajudante Geral 2							
						Calceteiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pá carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pintor							
						Serralheiro							
						Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO				QTDE.			
						Veículo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
PC 200													
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 30/03/2025						Data: 30/03/2025							


GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0


 Franklin de J. Souza


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIS DOS SANTOS - POVOADO LAMEIRO - ESCORREGA ESCOLA DO POVOADO DO ESCORREGA ATA Nº 001-2025 PREGAO ELETRONICO Nº 003-2025 RDO: 14						X									
						S	T	Q	Q	S	S	D			
Condições Climáticas Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()						EFETIVO PESSOAL									
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						CATEGORIA				QTDE					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Gerente de Obra									
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09						Engenheiro				1					
						Tec. de Segurança									
						Aux. Adm.									
						Mestre de obra									
						Encarregado geral				1					
Hh DO DIA															
						MÃO DE OBRA DIRETA									
						Topografo									
						Auxiliar de topografia									
						Pedreiro				1					
						Ajudante Geral				2					
						Calceteiro									
						Carpinteiro									
						Operador de Motosserra									
						Motorista									
						Montador									
						Montador/Eletricista									
						Eletricista									
						Operador de Patrol									
						Operador de Escavadeira									
						Operador de Pá carregadeira									
						Motorista de caçamba									
						Pintor									
						Serralheiro									
Hh DO DIA															
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO									
						EFETIVO DO DIA									
						JORNADA DE TRABALHO									
						Hh DO DIA									
						Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS									
						TIPO				QTDE.					
						Veículo Leve									
						Caminhão MuncK									
						Caminhão Toco									
						Escavadeira									
						Pá carregadeira									
						Caçamba									
						Patrol									
						PC 200									
						Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:									
Data: 31/03/2025						Data: 31/03/2025									


 GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0


 ...


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	X	T	Q	Q	S	S	D
OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIS DOS SANTOS - POVOADO LAMEIRO - ESCORREGA						EFETIVO PESSOAL							
ESCOLA DO POVOADO DO ESCORREGA ATA N° 001-2025						PREGAO ELETRONICO N° 003-2025			RDO: 15		CATEGORIA		QTDE
Condições Climáticas						MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA						Gerente de Obra							
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()						Engenheiro 1							
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Tec. de Segurança							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						AUX ADM							
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023						Mestre de obra							
Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09						Encarregado geral 1							
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022													
						Hh DO DIA							
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topografo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro 2							
						Ajudante Geral 2							
						Calceteiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motoserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pá carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pintor							
						Serralheiro							
						Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO							
						QTDE.							
						Veículo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 01/04/2025						Data: 01/04/2025							


GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602567-0


 Franklin de Jesus
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 051602567-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIS DOS SANTOS - POVOADO LAMEIRO - ESCORREGA ESCOLA DO POVOADO DO ESCORREGA ATA N° 001-2025						EFETIVO PESSOAL							
PREGAO ELETRÔNICO N° 003-2025		RDO: 16		CATEGORIA									QTDE
Condições Climáticas Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()						MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Engenheiro 1							
						Tec. de Segurança							1
Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022						Aux Adm mestre de obra encarregado geral							
						Hh DO DIA							
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topógrafo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro 2							
						Ajudante Geral 2							
						Calceteiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pá carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pintor							
						Serralheiro							
						Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO							
						QTDE.							
						Veículo Leve							
						Caminhão Munc							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 02/04/2025						Data: 02/04/2025							


GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0


 Franklin de J. Sena


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA							Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIS DOS SANTOS - POVOADO LAMEIRO - ESCORREGA ESCOLA DO POVOADO DO ESCORREGA ATA Nº 001-2025							EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()							MAO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.							Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022							Engenheiro 1						
							Tec. de Segurança Aux ADM Mestre de obra Encarregado geral 1						
Hh DO DIA							MAO DE OBRA DIRETA						
							Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES							Hh DO DIA						
							RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES							EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
							EFETIVO EQUIPAMENTOS						
GERENTE DE OBRA: Data: 03/04/2025							TIPO QTDE.						
							Veículo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
FISCALIZAÇÃO: Data: 03/04/2025													


GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602657-0


 Franklin de L. S. Silva
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602657-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIS DOS SANTOS - POVOADO LAMEIRO - ESCORREGA ESCOLA DO POVOADO DO ESCORREGA ATA Nº 001-2025						ELETIVO PESSOAL							
PREGAO ELETRONICO Nº 003-2025			RDO: 18										CATEGORIA
Condições Climáticas Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()						MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022						Engenheiro 1							
						Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
						Hh DO DIA							
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
						Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						ELETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA: Data: 04/04/2025						FISCALIZAÇÃO: Data: 04/04/2025							


GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602567-0


 Gerente de Obra

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIS DOS SANTOS - POVOADO LAMEIRO - ESCORREGA ESCOLA DO POVOADO DO ESCORREGA ATA Nº 001-2025		EFETIVO PESSOAL						
PREGAÇÃO ELETRÔNICO Nº 003-2025 RDO: 19		CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra						
SEM SERVIÇO		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
		Engenheiro 1						
		Tec. de Segurança						
		Aux. adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral 1						
		CONSIDERAÇÕES		MÃO DE OBRA DIRETA				
Topografo								
Auxiliar de topografia								
Pedreiro 2								
Ajudante Geral 2								
Calçeteiro								
Carpinteiro								
Operador de Motosserra								
Motorista								
Montador								
Montador/Eletricista								
Eletricista								
Operador de Patrol								
Operador de Escavadeira								
Operador de Pá carregadeira								
Motorista de caçamba								
Pintor								
Serralheiro								
OBSERVAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
Hh ACUMULADO								
		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve						
		Caminhão Munc						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 05/04/2025		Data: 05/04/2025						


GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602567-0


Franklin de Sousa

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data																						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO; OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIS DOS SANTOS - POVOADO LAMEIRO - ESCORREGA ESCOLA DO POVOADO DO ESCORREGA ATA N° 001-2025						EFETIVO PESSOAL							S		T		Q		Q		S		S		X		D	
													PREGAO ELETRONICO N° 003-2025		RDO: 20		CATEGORIA				QTDE							
Condições Climáticas		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA																				
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2- Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra																				
SEM SERVIÇO						Engenheiro																1						
						Tec. de Segurança																						
						AUX ADM																						
						Mestre de obra																						
						Encarregado geral																1						
						Hh DO DIA																						
						MÃO DE OBRA DIRETA																						
						Topografo																						
						Auxiliar de topografia																						
						Pedreiro																2						
						Ajudante Geral																2						
						Calceteiro																						
						Carpinteiro																						
						Operador de Motosserra																						
						Motorista																						
						Montador																						
						Montador/Eletricista																						
						Eletricista																						
						Operador de Patrol																						
						Operador de Escavadeira																						
						Operador de Pá carregadeira																						
						Motorista de caçamba																						
						Pintor																						
						Serralheiro																						
						Hh DO DIA																						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO																						
						EFETIVO DO DIA																						
						JORNADA DE TRABALHO																						
						Hh DO DIA																						
						Hh ACUMULADO																						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS																						
						TIPO																QTDE.						
						Veiculo Leve																						
						Caminhão Munck																						
						Caminhão Toco																						
						Escavadeira																						
						Pá carregadeira																						
						Caçamba																						
						Patrol																						
						PC 200																						
						Placa Vibratória																						
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:																						
Data: 06/04/2025						Data: 06/04/2025																						



GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051802557-0

Franklin de L...

 ...


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIS DOS SANTOS - POVOADO LAMEIRO - ESCORREGA ESCOLA DO POVOADO DO ESCORREGA ATA Nº 001-2025					X								
					S	T	Q	Q	S	S	D		
PREGAO ELETRONICO Nº 003-2025 RDO: 21					CATEGORIA		QTDE						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()					MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					Gerente de Obra								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS					Engenheiro		1						
Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09					Tec. de Segurança								
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022					Aux Adm								
					Mestre de obra								
					Encarregado geral		1						
					Hh DO DIA								
					MÃO DE OBRA DIRETA								
					Topografo								
					Auxiliar de topografia								
					Pedreiro		2						
					Ajudante Geral		2						
					Calceteiro								
					Carpinteiro								
					Operador de Motosserra								
					Motorista								
					Montador								
					Montador/Eletricista								
					Eletricista								
					Operador de Patrol								
					Operador de Escavadeira								
					Operador de Pá carregadeira								
					Motorista de caçamba								
					Pintor								
					Serralheiro								
					Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO								
					EFETIVO DO DIA								
					JORNADA DE TRABALHO								
					Hh DO DIA								
					Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS								
					TIPO		QTDE.						
					Veículo Leve								
					Caminhão Munck								
					Caminhão Toco								
					Escavadeira								
					Pá carregadeira								
					Caçamba								
					Patrol								
PC 200													
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:								
Data: 07/04/2025					Data: 07/04/2025								


GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0


Franklin de J. Souza
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIS DOS SANTOS - POVOADO LAMEIRO - ESCORREGA ESCOLA DO POVOADO DO ESCORREGA ATA N° 001-2025						S T Q Q S S D						
						EFETIVO PESSOAL						
PREGAO ELETRONICO N° 003-2025			RDO: 22			CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()						MAO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Gerente de Obra						1
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Engenheiro						1
Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09						Tec. de Segurança						1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022						Aux ADM						1
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020						mestre de obra						1
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022						encarregado geral						1
						Hh DO DIA						
						MAO DE OBRA DIRETA						
						Topografo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro						2
						Ajudante Geral						2
						Calceteiro						
						Carpinteiro						
						Operador de Motosserra						
						Motorista						
						Montador						
						Montador/Eletricista						
						Eletricista						
						Operador de Patrol						
						Operador de Escavadeira						
						Operador de Pá carregadeira						
						Motorista de caçamba						
						Pintor						
						Serralheiro						
						Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
						Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO						QTDE.
						Veiculo Leve						
						Caminhão Munch						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira						
						Pá carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
						PC 200						
						Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 08/04/2025						Data: 08/04/2025						


GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0


 Franklin de Souza
 Eng. Civil

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	Y	X	Q	Q	S	S	D
OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIS DOS SANTOS - POVOADO LAMEIRO - ESCORREGA						EFETIVO PESSOAL							
ESCOLA DO POVOADO DO ESCORREGA ATA N° 001-2025						PREGAO ELETRONICO N° 003-2025			RDO: 23		CATEGORIA		QTDE
Condições Climáticas Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()						MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Engenheiro 1							
<p>Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09</p> <p>CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022</p> <p>FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020</p> <p>CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022</p>						Tec. de Segurança Aux Adm mestre de obra Encarregado geral 1							
						Hh DO DIA							
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topografo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro 2							
						Ajudante Geral 2							
						Calceteiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
Motorista													
Montador													
Montador/Eletricista													
Eletricista													
Operador de Patrol													
Operador de Escavadeira													
Operador de Pá carregadeira													
Motorista de caçamba													
Pintor													
Serralheiro													
Hh DO DIA													
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO							
						Veículo Leve							
						Caminhão Muncck							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 09/04/2025						Data: 09/04/2025							

Camilla Ribeiro
GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0

Franklin
Franklin
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIS DOS SANTOS - POVOADO LAMEIRO - ESCORREGA ESCOLA DO POVOADO DO ESCORREGA ATA N° 001-2025						EFETIVO PESSOAL							
ATA N° 001-2025			PREGAO ELETRONICO N° 003-2025		RDO: 24								CATEGORIA
Condições Cilmáticas Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()						MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024						Engenheiro 1							
						Tec. de Segurança Aux ADM mestre de obra Encarregado geral 1							
						Hh DO DIA							
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topografo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro 2							
						Ajudante Geral 2							
						Calceteiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pá carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pintor							
						Serralheiro							
						Hh DO DIA							
						RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES						Hh ACUMULADO							
						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO QTDE.							
						Veiculo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 10/04/2025						Data: 10/04/2025							


GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602567-0


 Franklin de Jesus


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIS DOS SANTOS - POVOADO LAMEIRO - ESCORREGA ESCOLA DO POVOADO DO ESCORREGA ATA Nº 001-2025 PREGAO ELETRONICO Nº 003-2025 RDO: 25						S	T	Q	Q	X	S	S	D
						EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()						CATEGORIA		QTDE					
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024						Gerente de Obra							
						Engenheiro		1					
						Tec. de Segurança							
						Aux Adm							
						Mestre de obra							
						Encarregado geral		1					
						Hh DO DIA							
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topografo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro		2					
						Ajudante Geral		2					
						Calceteiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pá carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pintor							
						Serralheiro							
						Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO		QTDE.					
						Veículo Leve							
						Caminhão Muncck							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 11/04/2025						Data: 11/04/2025							


GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602567-0


 Franklin de J. Souza
 Eng. Civil


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIS DOS SANTOS - POVOADO LAMEIRO - ESCORREGA ESCOLA DO POVOADO DO ESCORREGA ATA N° 001-2025						S T Q Q S S D EFETIVO PESSOAL									
														PREGAO ELETRONICO N° 003-2025	
Condições Climáticas Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA									
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2- Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra							
SEM SERVIÇO						SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Engenheiro		1	
						Tec. de Segurança		Aux Adm		Mestre de obra		Encarregado geral			
						Hh DO DIA									
						MÃO DE OBRA DIRETA									
						Topografo									
						Auxiliar de topografia									
						Pedreiro						2			
						Ajudante Geral						2			
						Calceteiro									
						Carpinteiro									
						Operador de Motosserra									
						Motorista									
						Montador									
						Montador/Eletricista									
						Eletricista									
						Operador de Patrol									
						Operador de Escavadeira									
						Operador de Pá carregadeira									
						Motorista de caçamba									
						Pintor									
						Serralheiro									
						Hh DO DIA									
						RESUMO DO EFETIVO									
						EFETIVO DO DIA									
						JORNADA DE TRABALHO									
						Hh DO DIA									
						Hh ACUMULADO									
						EFETIVO EQUIPAMENTOS									
						TIPO						QTDE.			
						Veiculo Leve									
						Caminhão Munck									
						Caminhão Toco									
						Escavadeira									
						Pá carregadeira									
						Caçamba									
						Patrol									
						PC 200									
						Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:											
Data: 12/04/2025				Data: 12/04/2025											


GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0

Franklin de J. Souza

 Serralheiro

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIS DOS SANTOS - POVOADO LAMEIRO - ESCORREGA ESCOLA DO POVOADO DO ESCORREGA ATA N° 001-2025						S T Q Q S S X S T Q Q S S D						
						PREGAO ELETRONICO N° 003-2025 RDO: 27						EFETIVO PESSOAL
Condições Climáticas Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()						CATEGORIA QTDE						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						MÃO DE OBRA INDIRETA						
SEM SERVIÇO						SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
						Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança AUX ADM Mestre de obra Encarregado geral 1						
						Hh DO DIA						
						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
						Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
OBSERVAÇÕES						TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:						
Data: 13/04/2025						Data: 13/04/2025						


GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602567-0


 Franklin de J. Costa
 Encarregado


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA							Data							
							S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIS DOS SANTOS - POVOADO LAMEIRO - ESCORREGA ESCOLA DO POVOADO DO ESCORREGA ATA N° 001-2025							EFETIVO PESSOAL							
ATA N° 001-2025				PREGAO ELETRONICO N° 003-2025		RDO:	29		CATEGORIA			QTDE		
Condições Climáticas Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()							MÃO DE OBRA INDIRECTA							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.							Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS							Engenheiro 1							
Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09							Tec. de Segurança							
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022							AUX ADM							
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024							mestre de obra							
Chapim de concreto pré-moldado							Encarregado geral 1							
							Hh DO DIA							
							MÃO DE OBRA DIRETA							
							Topografo							
							Auxiliar de topografia							
							Pedreiro 2							
							Ajudante Geral 2							
							Calceteiro							
							Carpinteiro							
							Operador de Motosserra							
							Motorista							
							Montador							
							Montador/Eletricista							
							Eletricista							
							Operador de Patrol							
							Operador de Escavadeira							
							Operador de Pá carregadeira							
							Motorista de caçamba							
							Pintor 1							
							Serralheiro							
							Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES							RESUMO DO EFETIVO							
							EFETIVO DO DIA							
							JORNADA DE TRABALHO							
							Hh DO DIA							
							Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES							EFETIVO EQUIPAMENTOS							
							TIPO							
							Veículo Leve							
							Caminhão Munck							
							Caminhão Toco							
							Escavadeira							
							Pá carregadeira							
							Caçamba							
							Patrol							
							PC 200							
							Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:							FISCALIZAÇÃO:							
Data: 15/04/2025							Data: 15/04/2025							


GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0


 Franklin de J. S. C. Oliveira
 Eng. Civil

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	X	Q	S	S	D
OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIS DOS SANTOS - POVOADO LAMEIRO - ESCORREGA				EFETIVO PESSOAL							
ATA N° 001-2025											
ATA N° 001-2025		PREGAO ELETRONICO N° 003-2025		RDO: 31		CATEGORIA		QTDE			
Condições Climáticas Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro 1							
				Tec. de Segurança							
Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09				AUX Adm							
				Mestre de obra							
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024				Encarregado geral 1							
Chapim de concreto pré-moldado				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 2							
				Ajudante Geral 2							
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor 1							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
								TIPO			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 17/04/2025				Data: 17/04/2025							


GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camila Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0


 Franklin de J. Costa
 Eng. Civil



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA							Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIS DOS SANTOS - POVOADO LAMEIRO - ESCORREGA ESCOLA DO POVOADO DO ESCORREGA ATA N° 001-2025 PREGAO ELETRONICO N° 003-2025 RDO: 32							S	T	Q	Q	X	S	D
Condições Climáticas Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.							CATEGORIA			QTDE			
SEM SERVIÇO							MÃO DE OBRA INDIRETA						
							Gerente de Obra						1
							Engenheiro						
							Tec. de Segurança						
							AUX Adm						
							Mestre de obra						
							Encarregado geral						1
							Hh DO DIA						
MÃO DE OBRA DIRETA													
Topografo													
Auxiliar de topografia													
Pedreiro						2							
Ajudante Geral						2							
Calçeteiro													
Carpinteiro													
Operador de Motosserra													
Motorista													
Montador													
Montador/Eletricista													
Eletricista													
Operador de Patrol													
Operador de Escavadeira													
Operador de Pá carregadeira													
Motorista de caçamba													
Pintor						1							
Serralheiro													
Hh DO DIA													
RESUMO DO EFETIVO													
EFETIVO DO DIA													
JORNADA DE TRABALHO													
Hh DO DIA													
Hh ACUMULADO													
EFETIVO EQUIPAMENTOS													
TIPO						QTDE.							
Veiculo Leve													
Caminhão Muncck													
Caminhão Toco													
Escavadeira													
Pá carregadeira													
Caçamba													
Patrol													
PC 200													
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA: FISCALIZAÇÃO: Data: 18/04/2025 Data: 18/04/2025													


GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camila Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602567-0


 Franklin de Jesus



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	X S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIS DOS SANTOS - POVOADO LAMEIRO - ESCORREGA ESCOLA DO POVOADO DO ESCORREGA		EFETIVO PESSOAL						
ATA N° 001-2025	PREGAÇÃO ELETRÔNICO N° 003-2025 RDO: 33							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()	MAO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.	SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança AUX ADM mestre de obra Encarregado geral 1					
SEM SERVIÇO			MAO DE OBRA DIRETA					
			Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 1 Serralheiro					
			Hh DO DIA					
			Hh DO DIA					
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO					QTDE.	
		Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 19/04/2025		Data: 19/04/2025						


GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602567-0


 Franklin de A. Costa
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602567-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	T	Q	Q	S	S	X	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIS DOS SANTOS - POVOADO LAMEIRO - ESCORREGA ESCOLA DO POVOADO DO ESCORREGA				EFETIVO PESSOAL								
ATA N° 001-2025		PREGAO ELETRONICO N° 003-2025									RDO: 34	
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SEM SERVIÇO				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS								
				Gerente de Obra							1	
				Engenheiro								
				Tec. de Segurança								
				AUX ADM								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral							1	
				Hh DO DIA								
								MÃO DE OBRA DIRETA				
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro							2	
				Ajudante Geral							2	
				Calceteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor							1	
				Serralheiro								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO							QTDE.	
				Veiculo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 20/04/2025				Data: 20/04/2025								



 GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. G. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602567-0


 Francisco de J. Ferreira
 Eng. Civil



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data									
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						X									
OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIS DOS SANTOS - POVOADO LAMEIRO - ESCORREGA						EFETIVO PESSOAL									
ATA Nº 001-2025						PREGAO ELETRONICO Nº 003-2025		RDO: 35		CATEGORIA			QTDE		
Condições Climáticas						MAO DE OBRA INDIRECTA									
SIMBOLOGIA						Gerente de Obra									
Manhã: (1)						Engenheiro									
Tarde: (1)						Tec. de Segurança									
Noite: ()						AUX ADM									
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Mestre de obra									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS						Encarregado geral									
SEM SERVIÇO															
						Hh DO DIA									
						MAO DE OBRA DIRETA									
						Topografo									
						Auxiliar de topografia									
						Pedreiro									
						Ajudante Geral									
						Calceteiro									
						Carpinteiro									
						Operador de Motosserra									
						Motorista									
						Montador									
						Montador/Eletricista									
						Eletricista									
						Operador de Patrol									
						Operador de Escavadeira									
						Operador de Pá carregadeira									
						Motorista de caçamba									
						Pintor									
						Serralheiro									
						Hh DO DIA									
						RESUMO DO EFETIVO									
						EFETIVO DO DIA									
						JORNADA DE TRABALHO									
						Hh DO DIA									
						Hh ACUMULADO									
						EFETIVO EQUIPAMENTOS									
						TIPO									
						QTDE.									
						Veículo Leve									
						Caminhão Munck									
						Caminhão Toco									
						Escavadeira									
						Pá carregadeira									
						Caçamba									
						Patrol									
						PC 200									
						Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:									
Data: 21/04/2025						Data: 21/04/2025									


GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Roberto C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0


 Franklin de Jesus Roberto
 Eng. Civil



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIS DOS SANTOS - POVOADO LAMEIRO - ESCORREGA ESCOLA DO POVOADO DO ESCORREGA ATA Nº 001-2025				PREGÃO ELETRONICO Nº 003-2025 RDO: 36						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 Chapim de concreto pré-moldado				MAO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra 1 Engenheiro 1 Tec. de Segurança AUX ADM mestre de obra Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MAO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 1 Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 22/04/2025				Data: 22/04/2025						


GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602557-0


 Franklin de J. C.
 Supervisor



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO – OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO
DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIS DOS SANTOS - POVOADO LAMEIRO
- ESCORREGA**

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
22/04/2025	Santaluz	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUI DOS SANTOS – POVOADO LAMEIRO - ESCORREGA



**FOTO 01 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).
AF_01/2024**



Camilla Ribeiro
GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

**FOTO 02 - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024**

Franklin de J. Costa



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
22/04/2025	Santaluz	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIS DOS SANTOS - POVOADO LAMEIRO - ESCORREGA



FOTO 03 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022



Camilla Ribeiro
GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

FOTO 04 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

Franklin J. F. F. F. F.
Franklin J. F. F. F.



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
22/04/2025	Santaluz	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DOS SANTOS - POVOADO LAMEIRO - ESCORREGA

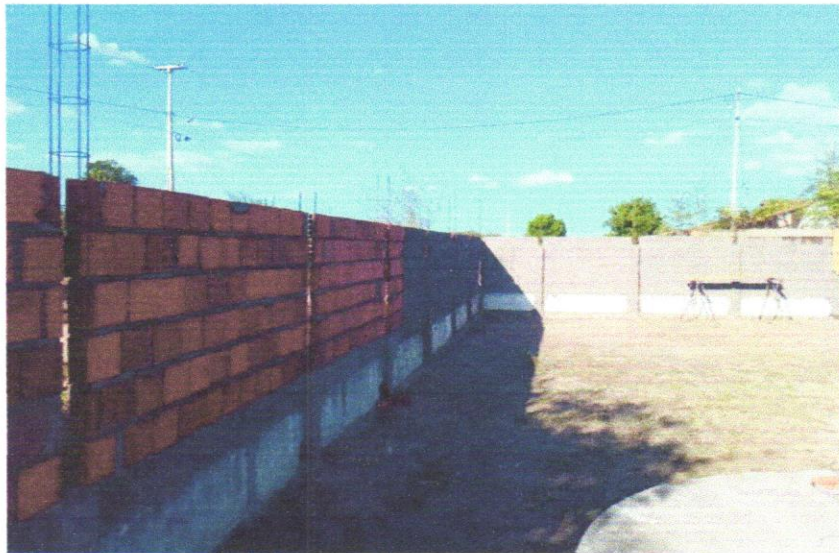


FOTO 05 - Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09



Camilla
GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

FOTO 06 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

Franklin de J. S. Senna
[Signature]



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
22/04/2025	Santaluz	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIS DOS SANTOS - POVOADO LAMEIRO - ESCORREGA



FOTO 07 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020



Camilla
GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

FOTO 08 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

Franklyn de J. Sena
Franklyn de J. Sena



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
22/04/2025	Santaluz	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIS DOS SANTOS – POVOADO LAMEIRO - ESCORREGA

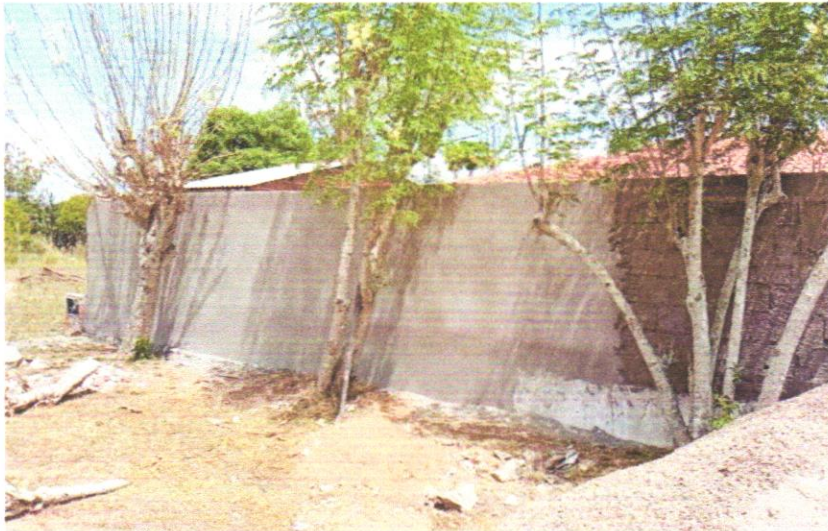
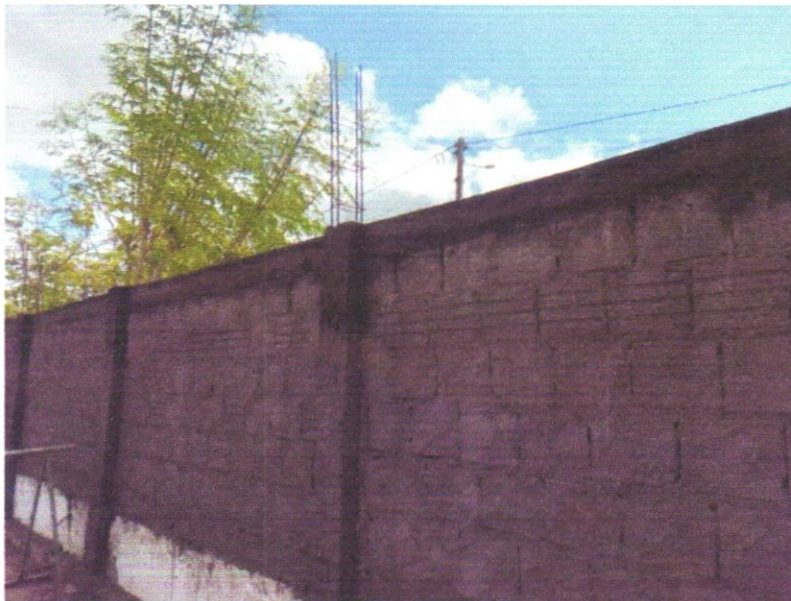


FOTO 09 - MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024



Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

FOTO 10 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Franklin de J. Sena
Franklin de J. Sena
Eng. Civil



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
22/04/2025	Santaluz	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIS DOS SANTOS - POVOADO LAMEIRO - ESCORREGA



FOTO 11 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023



Camilla Ribeiro
GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

FOTO 12 - DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Franklin de Souza
Eng. Civil
[Handwritten Signature]





ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 003/2025
(Processo Administrativo nº 009/2025)

ATA Nº 001/2025

O Município de Santaluz/BA, com sede na Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo, Cep: 48.880-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.807.870/0001-19, NESTE Ato representada pelo(a) Prefeito(a), Sr(a). **Arismário Barbosa Junior**, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob o nº 016.549.665-76 e portador do RG nº 1148395733 SSP/BA, acompanhado pelo(a) Secretário o Sr. , ou considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão, na forma Eletrônica, para Registro de Preços nº 003/2025, Processo Administrativo nº 009/2025, RESOLVE registrar os preços da empresa **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Santos Dumont, nº 1883, Andar 3, Sala 305, Centro, Lauro de Freitas - BA, CEP 42.702-400, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 23.694.541/0001-62, neste ato representado(a) por **IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA**, inscrito no CPF nº 039.200.175-60, conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações, no Decreto Municipal nº 68/2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO:

1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NA FORMA ESTABELECIDA NO TERMO DE REFERÊNCIA, E NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS, DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL-SINAPI E NA TABELA ORSE - ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE (BRASIL), especificado(s) na planilha descritiva do Termo de Referência (Anexo I) do edital de Pregão Eletrônico nº 003/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

LOTE 01			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	DESCONTO OFERTADO
1	SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NA FORMA ESTABELECIDA NO TERMO DE REFERÊNCIA, E NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS, DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL-SINAPI E NA TABELA ORSE - ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE (BRASIL).	R\$12.603.197,30	25%
DESCONTO FINAL OFERTADO			25%
VINTE E CINCO POR CENTO			





3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 14.133, de 2021.

3.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços.

3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, ao máximo cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

3.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

3.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

3.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

4. VALIDADE DA ATA:

4.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme o disposto no art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO:

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

CNPJ/MF Nº 13.807.870/0001-19

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.

Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

5.9.1. por razão de interesse público; ou

5.9.2. a pedido do fornecedor.

6. DAS PENALIDADES:

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

6.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer descumprimento do fornecedor, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

7. ÓRGÃOS PARTICIPANTES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Secretaria Municipal de Assistência Social

Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de saúde


Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Esporte e Juventude

8. CONDIÇÕES GERAIS:

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA
CNPJ/MF Nº 13.807.870/0001-19

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Santaluz/BA, 27 de fevereiro de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA
ARISMARIO BARBOSA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ivan Rodrigo
Ferreira de
Almeida

Assinado de forma
digital por Ivan Rodrigo
Ferreira de Almeida
Dados: 2025.02.27
14:12:35 -03'00'

EMPRESA: GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA CNPJ 23.694.541/0001-62
REPRESENTANTE LEGAL: IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA CPF 039.200.175-60

